

## Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. budowy drogi S6 i S11

22 listopada 2023 r.



# Droga ekspresowa S6 – odcinki w przygotowaniu

## Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6

Odcinek 1 **Kołbaskowo – Dołuje** - 13,6 km


Odcinek 2 **Dołuje - Police** - 11,9 km

Odcinek 3 **Police - Goleniów** - 23,4 km

Etap realizacji:

**PB w opracowaniu**

Planowana data odbioru PB: **II kw. 2024 r.**

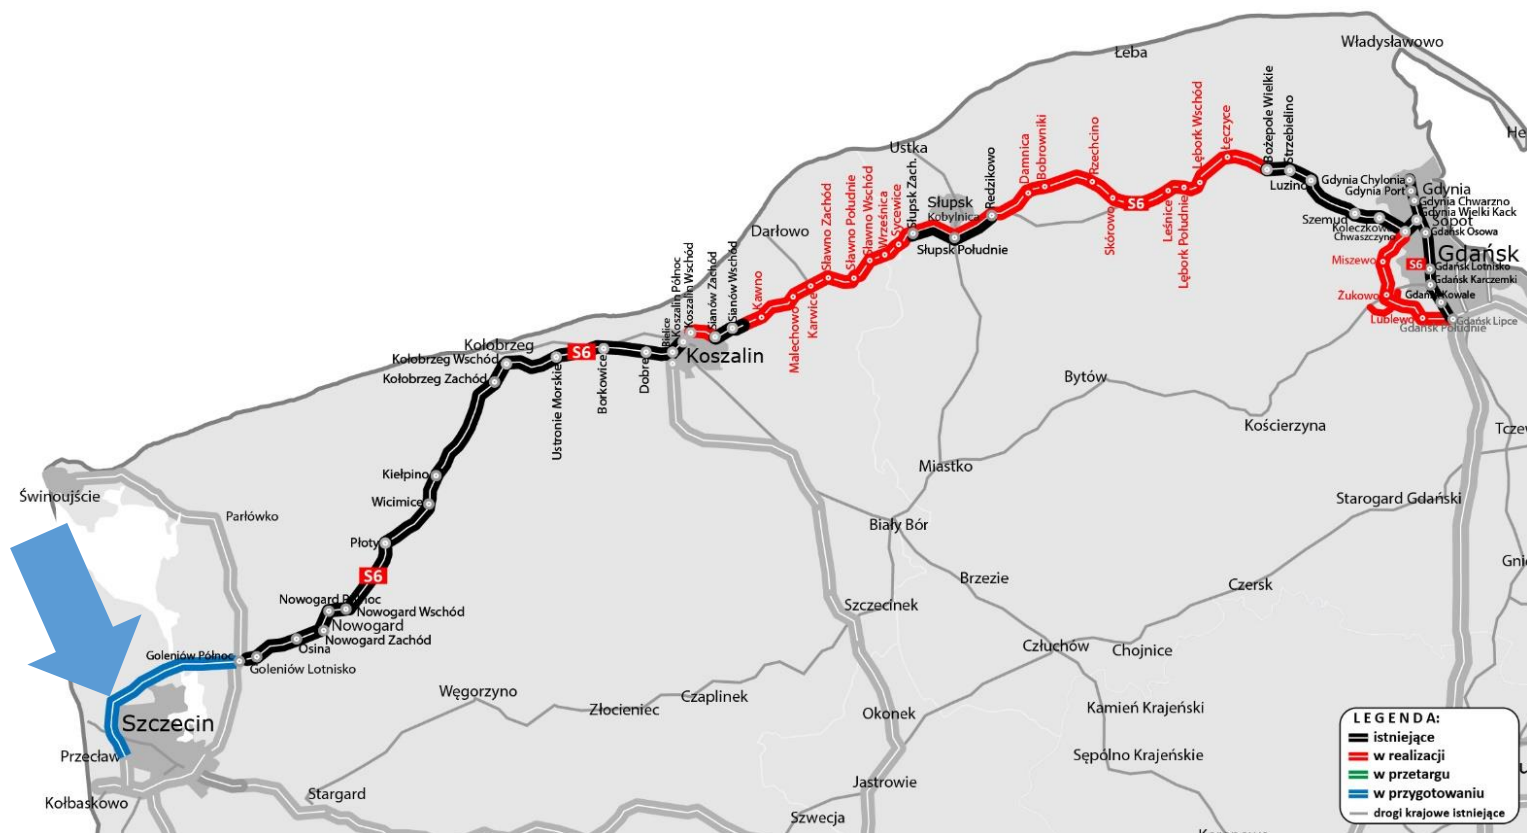

# Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

## Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 6+400 do km 14+300

Długość odcinka: **7,9 km**

System realizacji: **Tradycyjny**

Wykonawca: **Polbud-Pomorze Sp. z o.o.; Miejskie**

**Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o. o.;**

**Wibra Infrastruktura Sp. z o.o. sp. K.**

ZKK: **448 877 889,58 zł brutto**


Zaawansowanie rzeczowe: **81,7%**

Data podpisania umowy: **20.07.2021 r.**

Data rozpoczęcia robót: **15.08.2021 r.**

Data planowana zakończenia robót: **III kw. 2024 r.**

Odcinek Sianów Zachód- Sianów Wschód oddano  
do ruchu: **08.07.2023 r.**

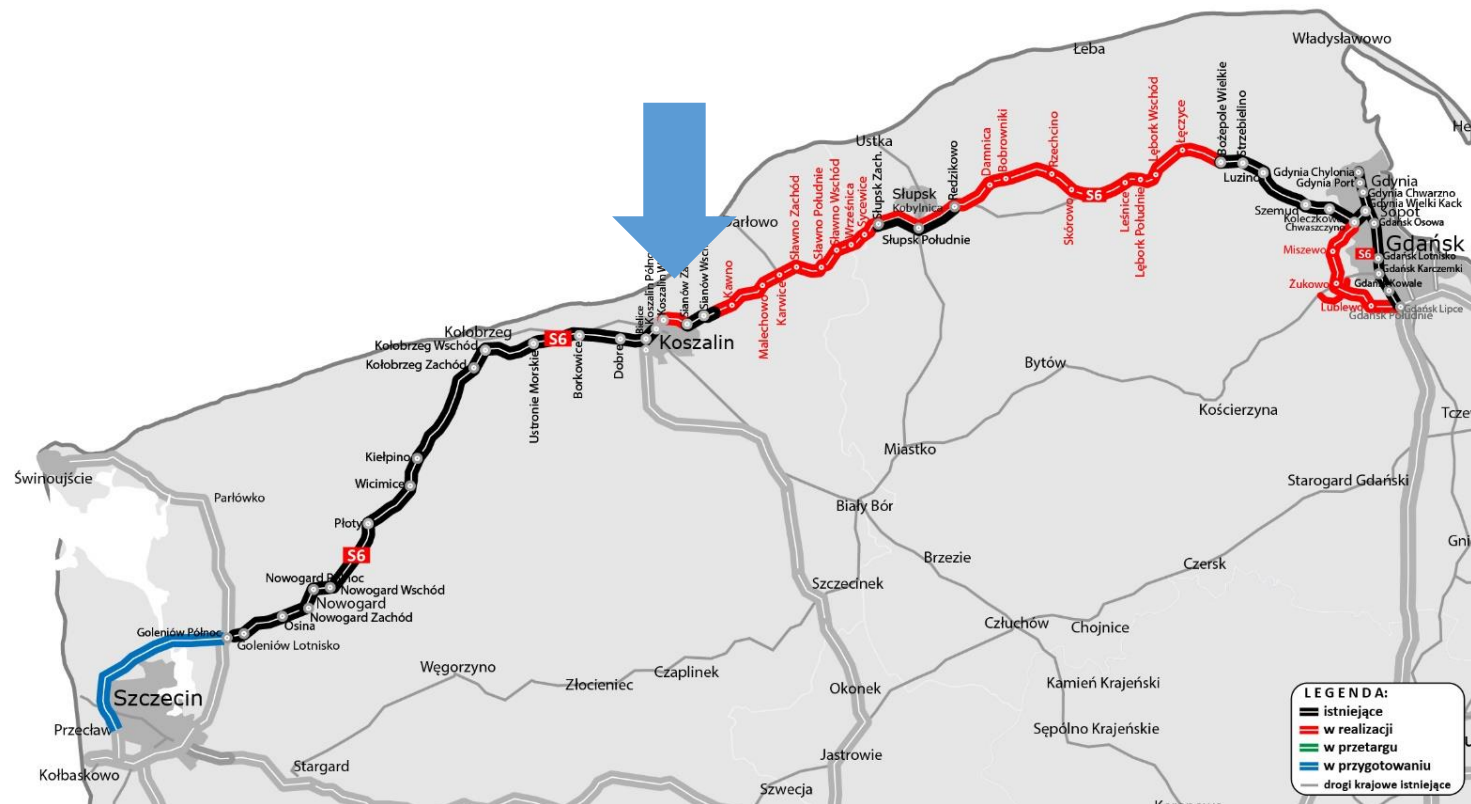

# Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa

/bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Bobrowice"/

Długość odcinka: **23,1 km**

System realizacji: **Projektuj & Buduj** (opracowanie PW i STWiORB)

Wykonawca: **Kobylarnia S.A, Mirbud S.A**

ZKK: **657 935 862,92 zł brutto**


Zaawansowanie rzeczowe: **10,82 %**,

Data podpisania umowy: **30.09.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: **23.08.2021 r.** (uzyskana przez GDDKIA)

Data rozpoczęcia robót: **01.08.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **IV kw. 2025 r.**

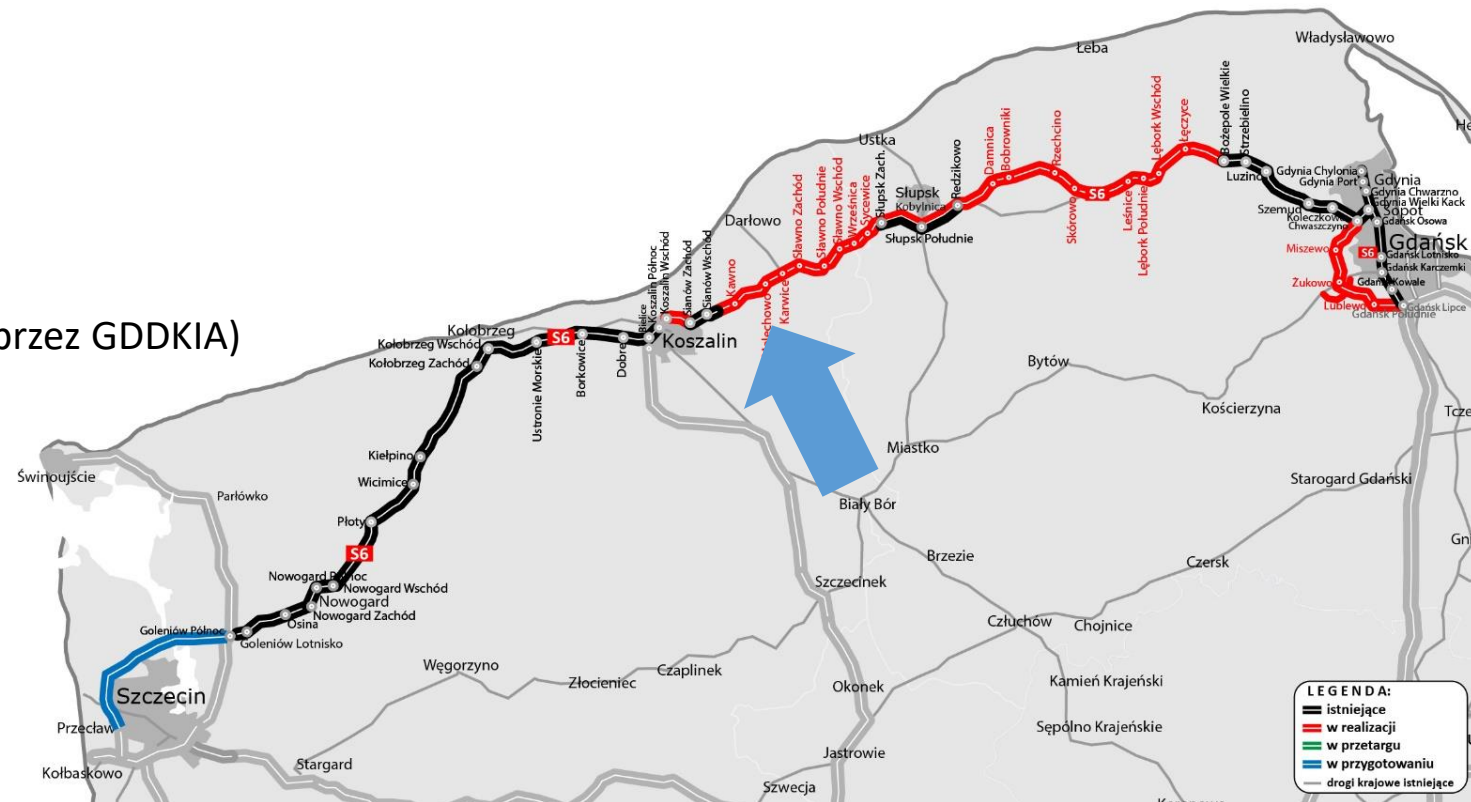

# Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

**Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6  
(początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - początek obwodnicy m.  
Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/**

Długość odcinka: **22,9 km**

System realizacji: **Projektuj & Buduj** (opracowanie PW i STWiORB)

Wykonawca: **Stecol Coropration**

ZKK: **701 635 369,87 zł brutto**


Zaawansowanie rzeczowe: **20,5 %**,

Data podpisania umowy: **17.11.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: **30.08.2021 r.** (uzyskana przez GDDKIA)

Data rozpoczęcia robót: **18.09.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **I kw. 2026 r.**

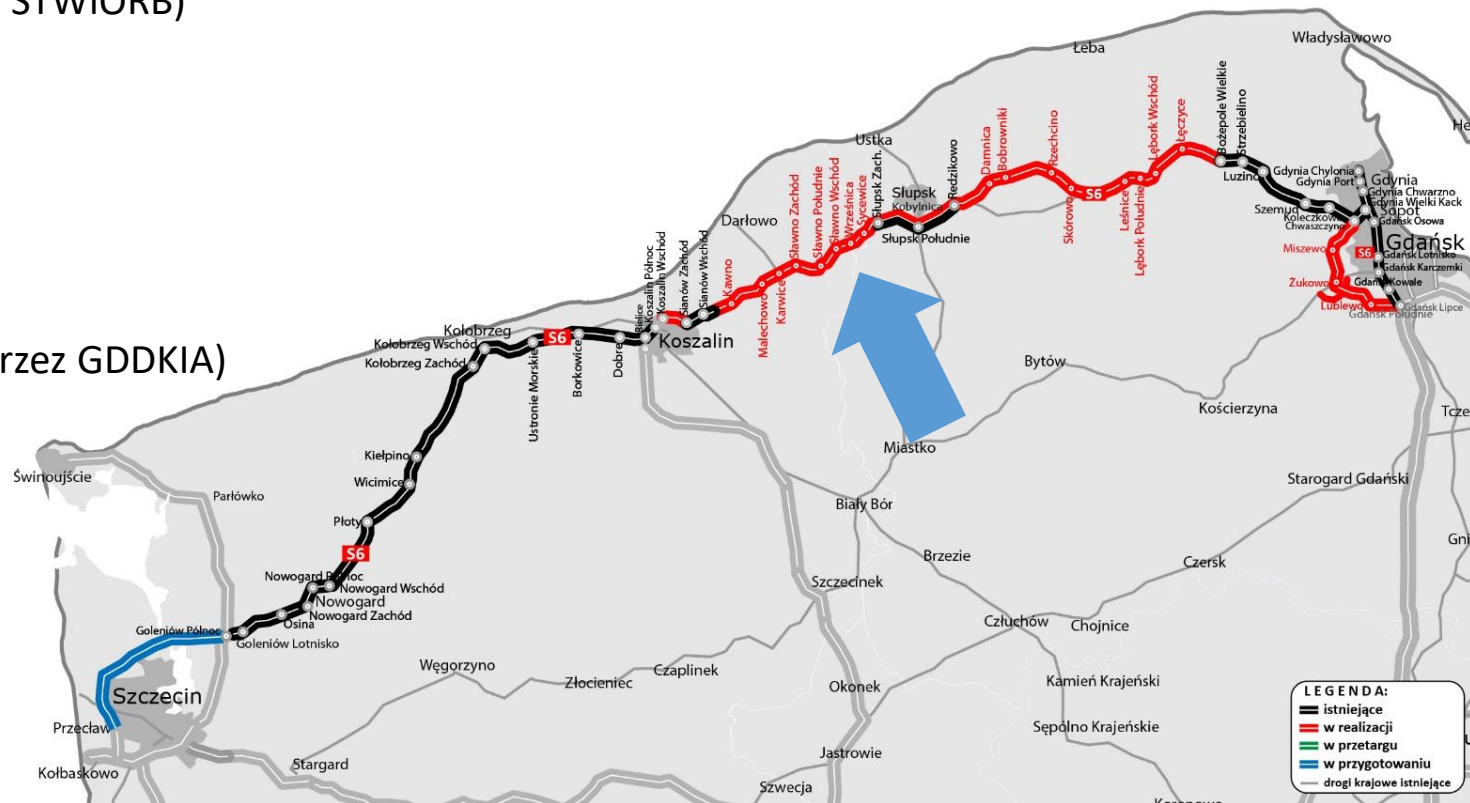

# Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

## Zadanie 1: II jezdnia w ciągu Obw. Słupska

Długość odcinka: **9,51 km**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Wykonawca: **Strabag Sp. z o.o.**

ZKK: **238 582 453,36 brutto**

Zaawansowanie rzeczowe: **20,83 %**


Data podpisania umowy: **28.05.2021 r.**

Wniosek o ZRID: **24.03.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: **03.03.2023 r.**

Data rozpoczęcia robót: **14.03.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **III kw. 2025 r.**

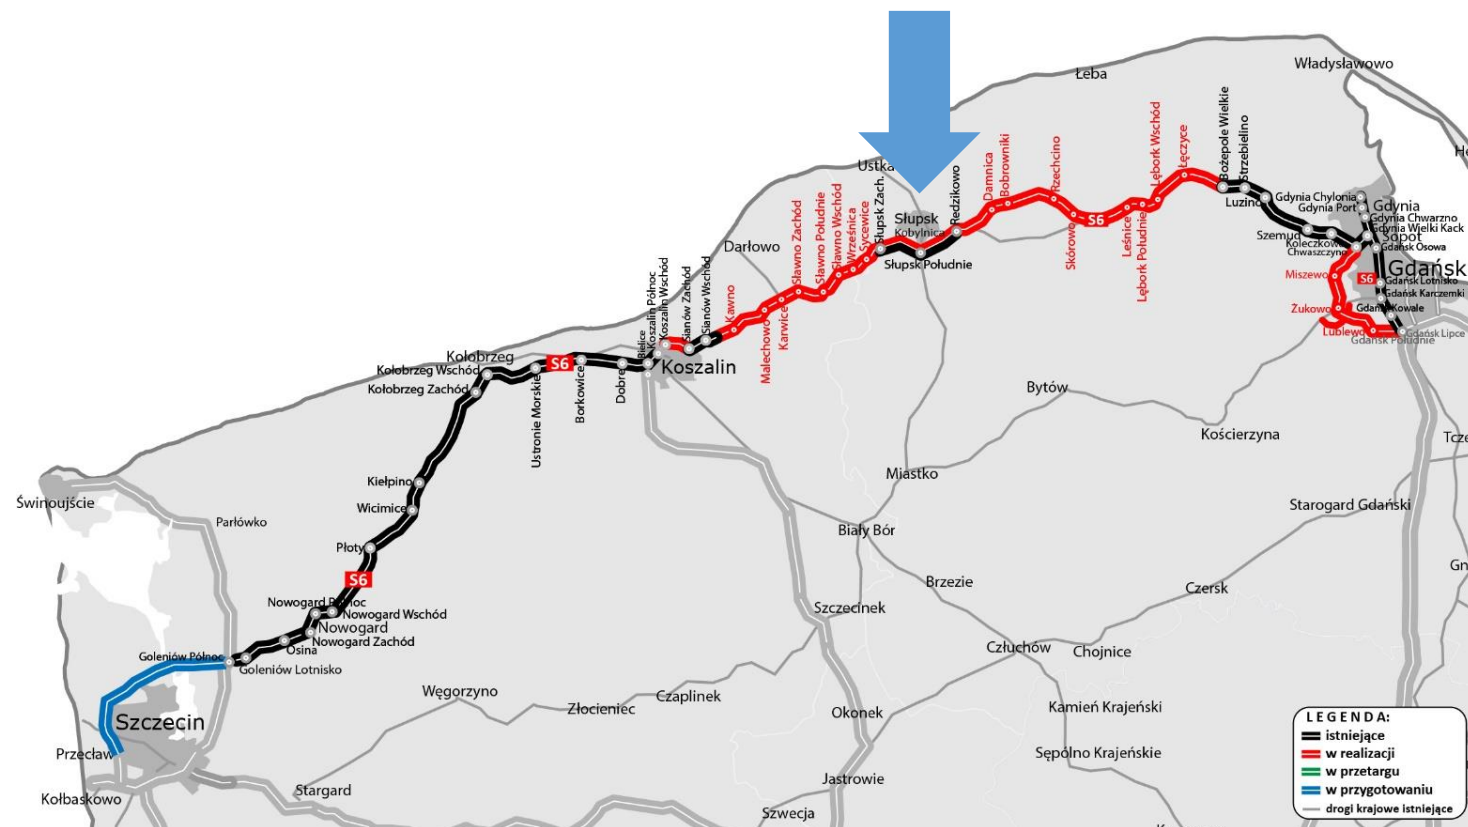

# Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

## Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem)

Długość odcinka: **16,1 km**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Wykonawca: **NDI SA, NDI Sopot S.A. Limited Liability Partnership "Todini Central Asia"**

ZKK: **548 743 636,72 brutto**

Zaawansowanie rzeczowe: **4,11 %**


Data podpisania umowy: **29.12.2021 r.**

Wniosek o ZRID: **21.10.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: **11.10.2023 r.**

Data rozpoczęcia robót: **30.10.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **IV kw. 2025 r.**

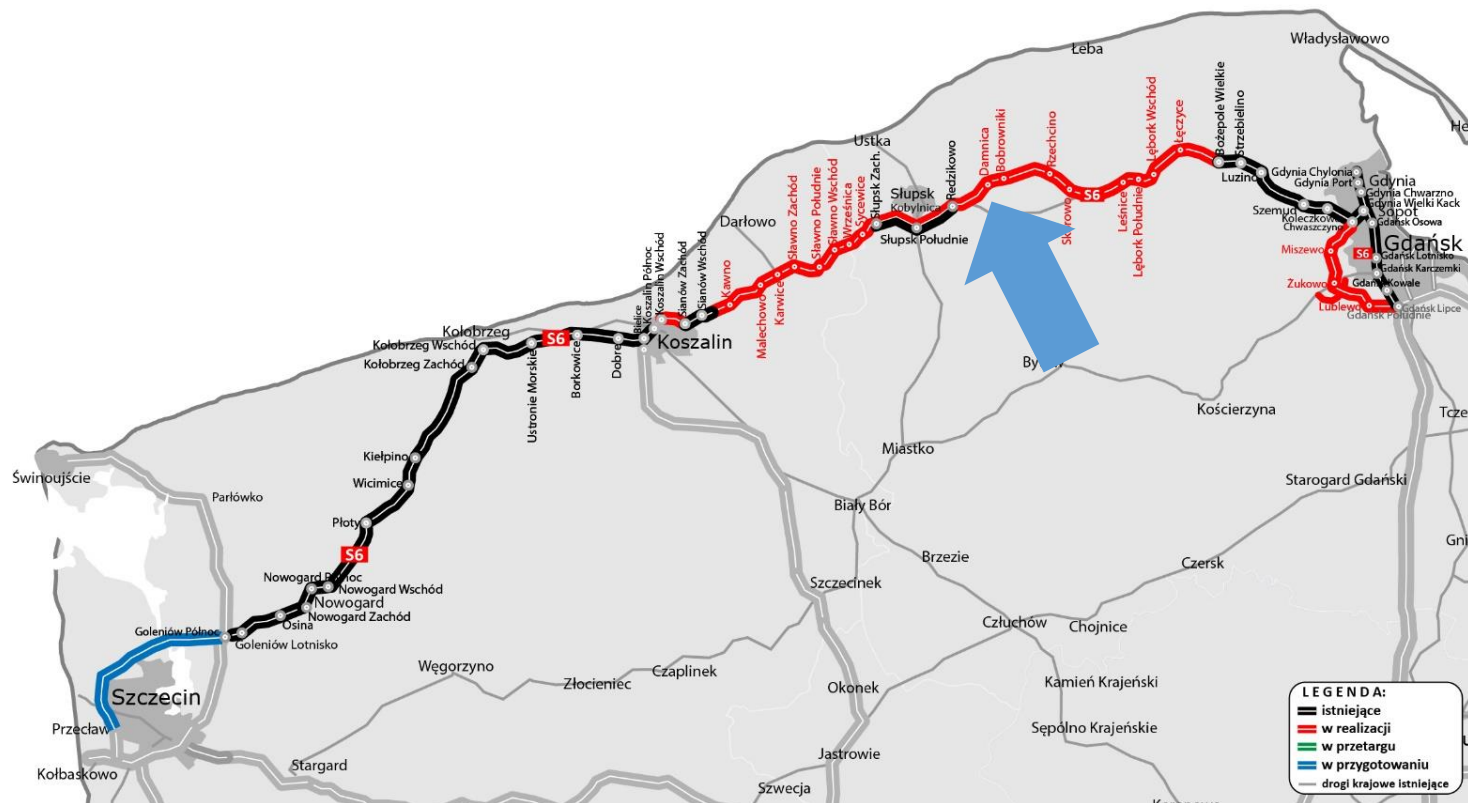

# Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

## Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)

Długość odcinka: **13,15 km**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Wykonawca: **Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA**

ZKK: **283 199 309,17 brutto**

Zaawansowanie rzeczowe: **8,36 %**


Data podpisania umowy: **29.06.2021 r.**

Wniosek o ZRID: **28.04.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: **23.06.2023 r.**

Data rozpoczęcia robót: **17.07.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **III kw. 2025 r.**

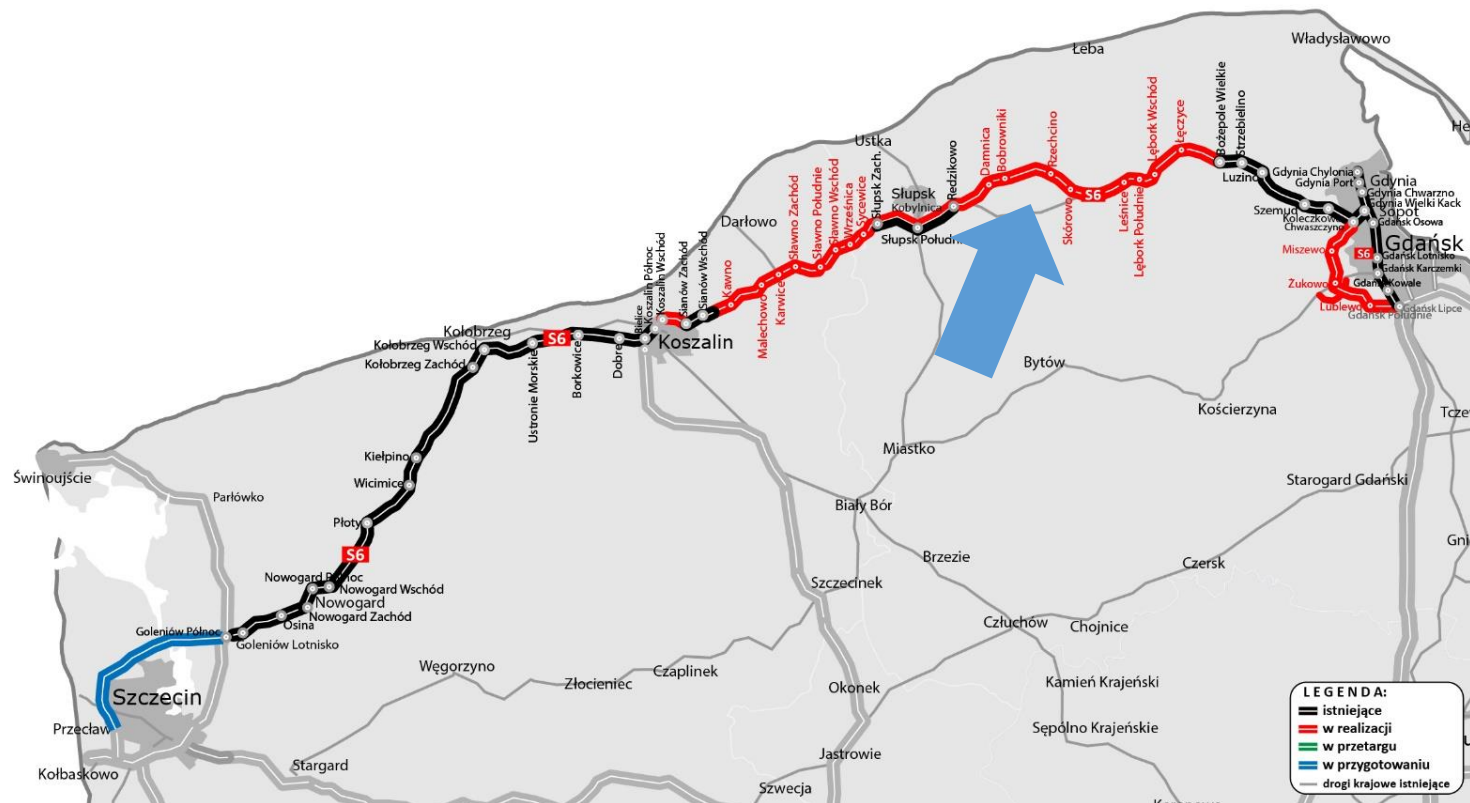



# Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

## Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)

Długość odcinka: **10,88 km**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.**

ZKK: **344 400 000,00 zł brutto**

Zaawansowanie rzeczowe: **11 %**


Data podpisania umowy: **15.06.2021 r.**

Wniosek o ZRID: **14.04.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: **25.07.2023 r.**

Data rozpoczęcia robót: **02.08.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **III kw. 2025 r.**

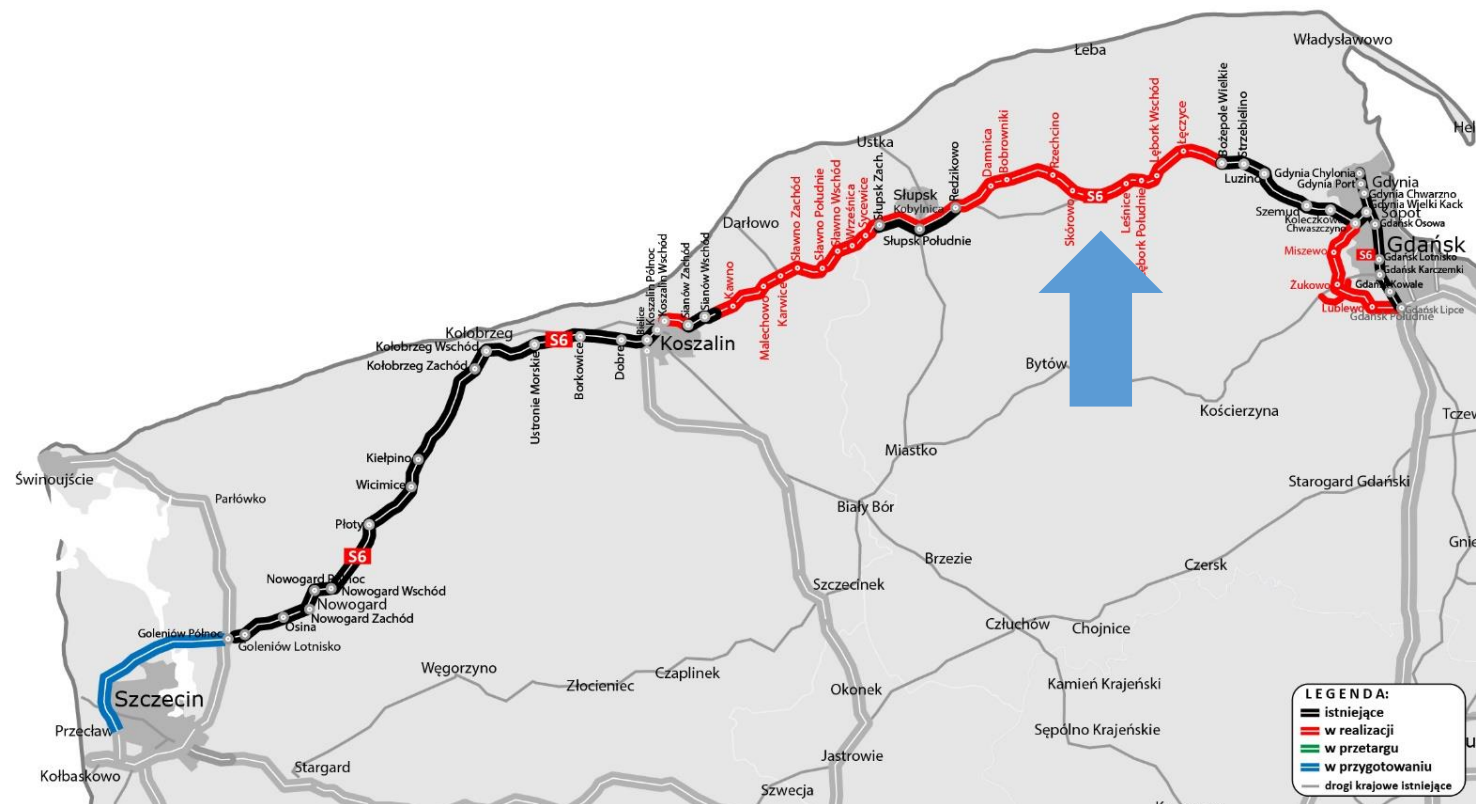

# Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

## Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)

Długość odcinka: **22 km**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Wykonawca: **Budimex SA**

ZKK: **718 669 944,83 zł brutto**

Zaawansowanie rzeczowe: **34,16 %**


Data podpisania umowy: **29.07.2021 r.**

Wniosek o ZRID: **22.04.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: **12.01.2023 r.**

Data rozpoczęcia robót: **16.03.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **I kw. 2026 r.**

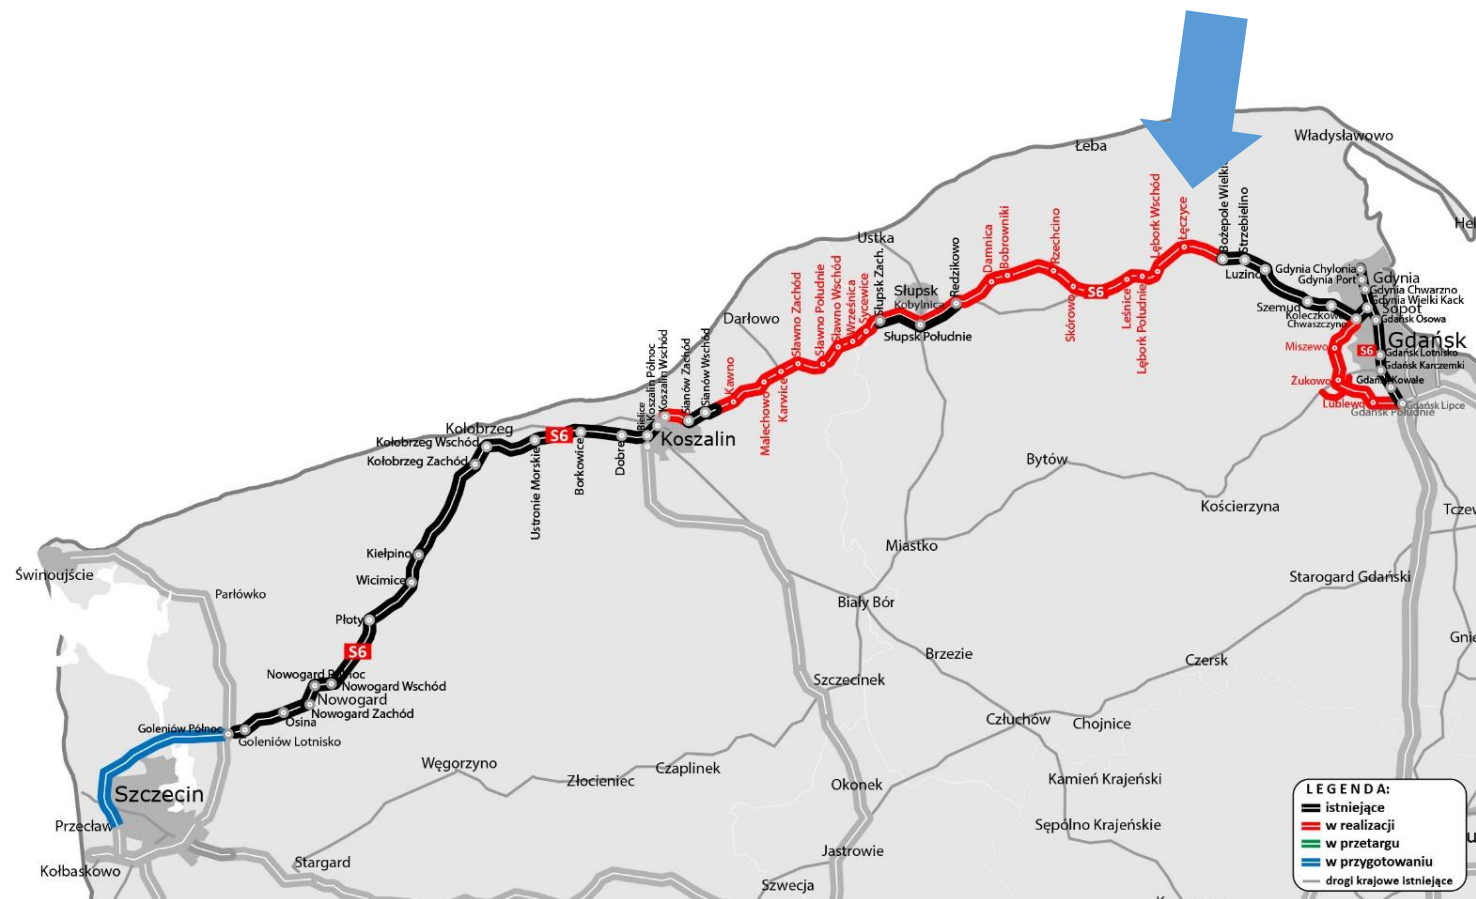

# Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

**Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)**

**Od września 2020 r. droga oznaczona jest jako S7**

Długość odcinka: **16,18 km**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Wykonawca: **Budimex S.A.**

ZKK: **715 169 700,63 zł brutto**

Zaawansowanie rzeczowe: **55,73 %**


Data podpisania umowy: **16.04.2021 r.**

Wniosek o ZRID: **28.12.2021 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: **03.10.2022 r.**

Data rozpoczęcia robót: **12.10.2022 r.**

Data planowana zakończenia robót: **II kw. 2025 r.**

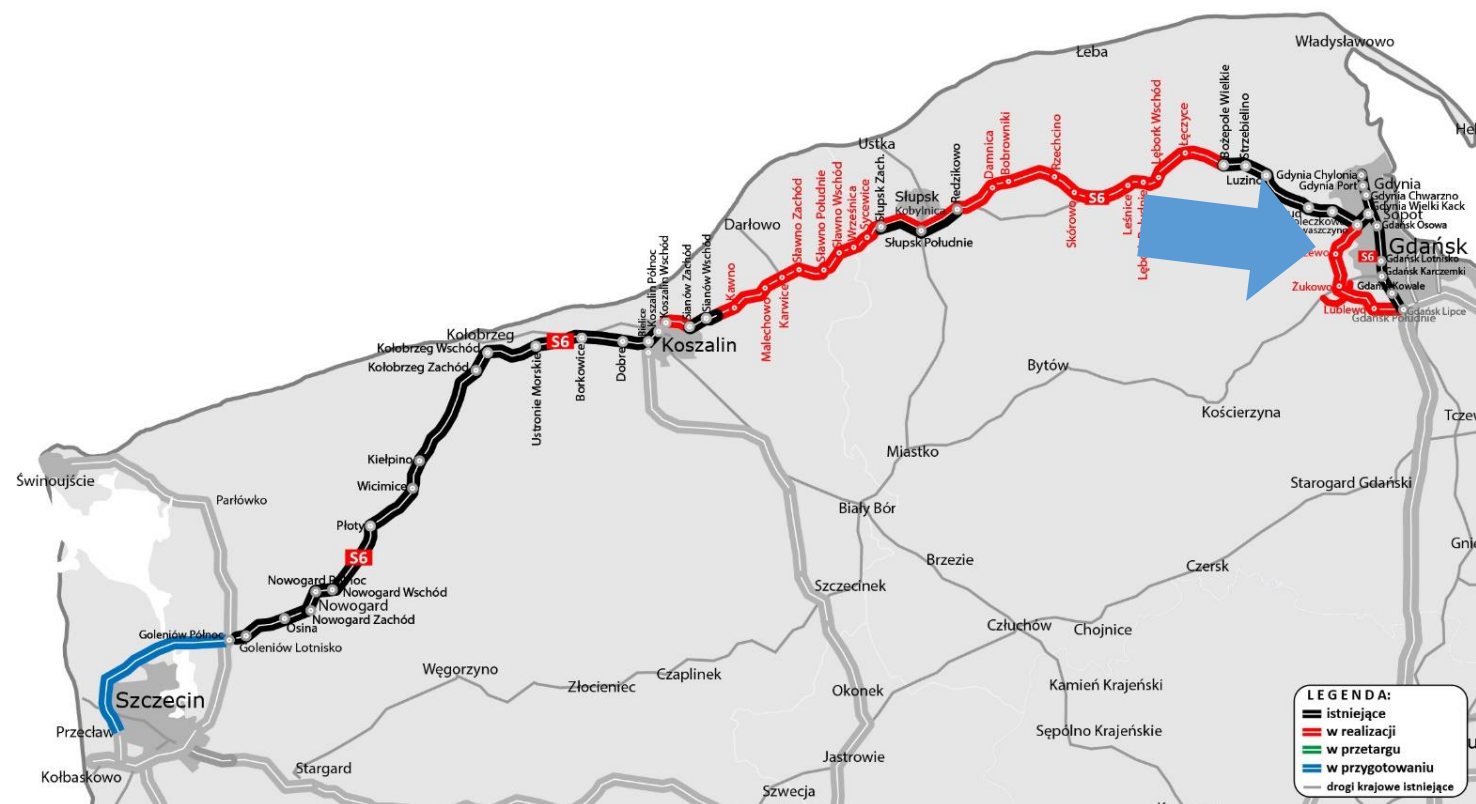

# Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

**Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)  
wraz z obwodnicą Żukowa**

**Od września 2020 r. droga oznaczona jest jako S7**

Długość odcinka: **22,35 km**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Wykonawca: **Mirbud SA; Kobylarnia SA**

ZKK: **776 999 999,91 zł brutto**

Zaawansowanie rzeczowe: **21,11 %**

Data podpisania umowy: **16.04.2021 r.**

Wniosek o ZRID: **16.02.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID:


**Odc. A - 28.03.2023 r.**

**Odc. B - 27.01.2023 r.**

**Odc. C - 06.12.2022 r.**

Data rozpoczęcia robót: **06.02.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **III kw. 2025 r.**

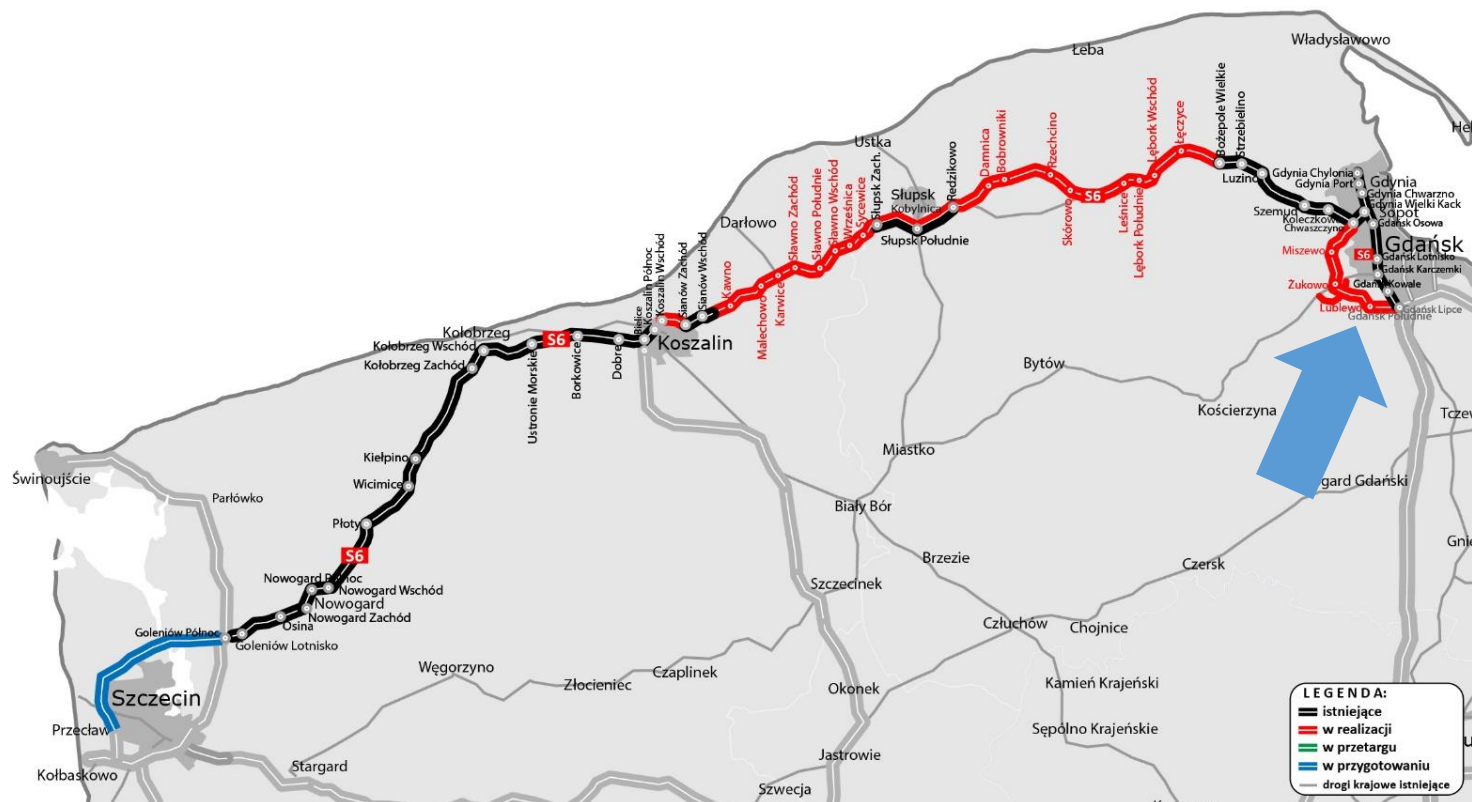

# Droga ekspresowa S11 – odcinki w realizacji

## Budowa drogi S11 na odcinku Bobolice – Szczecinek

Długość odcinka: **24,3 km**

System realizacji: **Projektuj & Buduj** (opracowanie PW i STWiORB)

Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.**


ZKK: **1 107 000 000,00 zł brutto**

Data podpisania umowy: **30.08.2023 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: **28.11.2022 r.** (uzyskana przez GDDKIA)

Data przekazania Placu Budowy: **22.09.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **IV kw. 2026 r.**

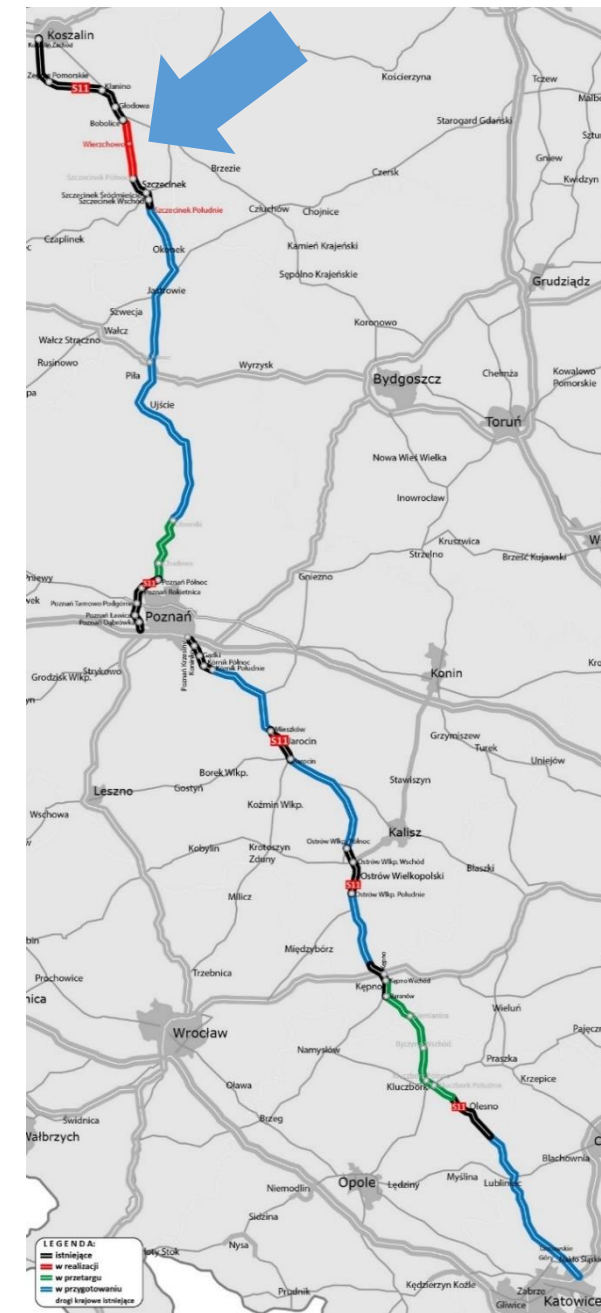

# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

## Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Szczecinek – Piła

Długość: **59,3 km**


Etap realizacji: **Przygotowanie – w opracowaniu KP**

System realizacji: **P&B**

Wykonawca dokumentacji - KP: **Aecom Polska Sp. z o.o.**

Data podpisania umowy na KP: **30.01.2018 r.**

Data uzyskania DŚU: **31.08.2023 r.** (brak ostateczności)

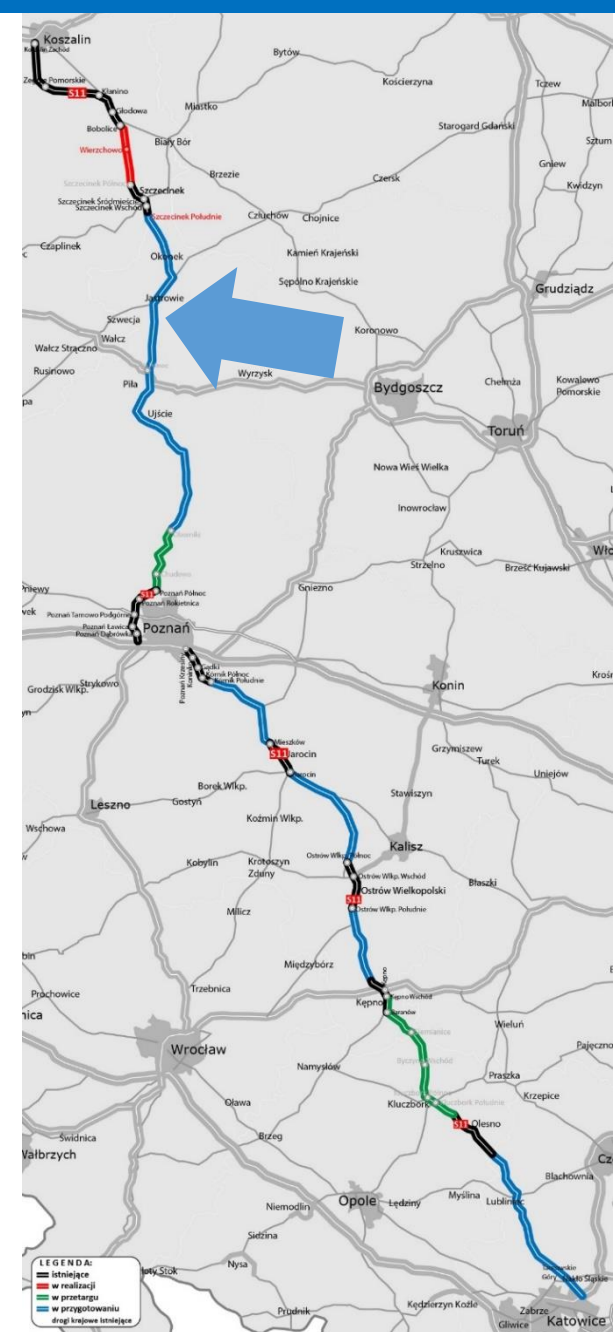

# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

**Budowa obwodnicy Piły w ciągu S10/S11**

Długość: **9,0 km**

**Budowa obwodnicy Ujścia w ciągu S11**

Długość: **11,3 km**

Etap realizacji: **Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ**


System realizacji: **P&B**

Wykonawca dokumentacji - STEŚ: **Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o.**

Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R: **03.04.2020 r.**

Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: **12.09.2023 r.**

Planowana data uzyskania DŚU: **IV kw. 2024 r.**

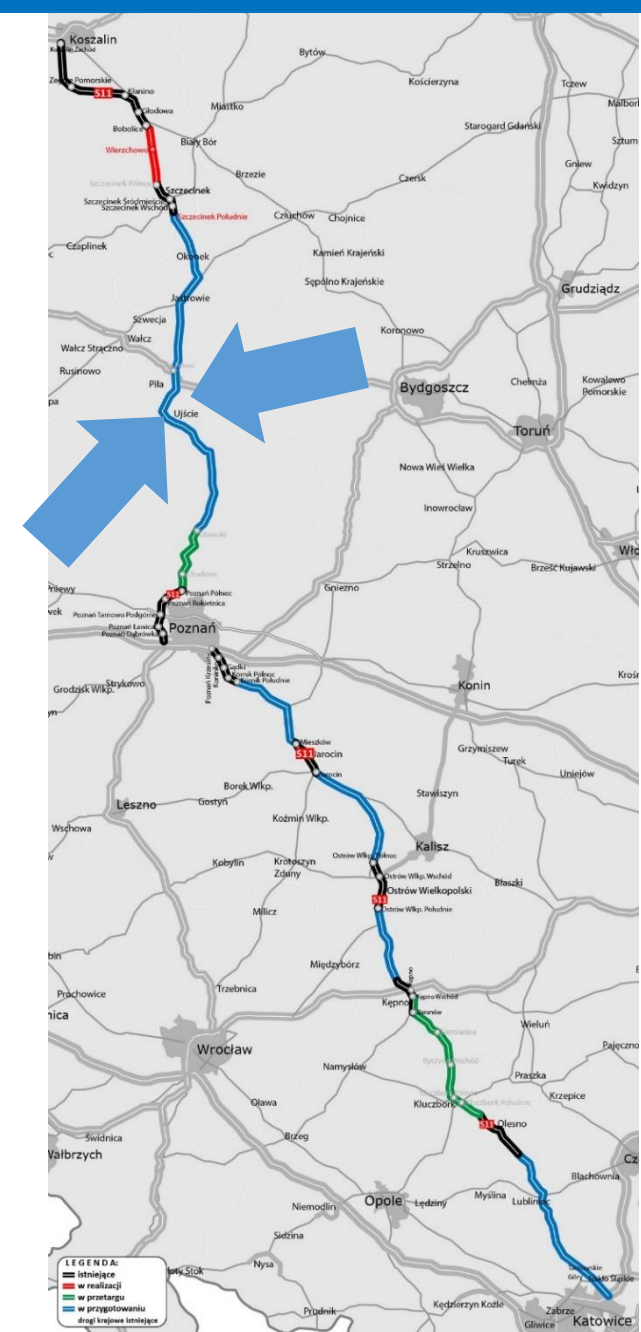

# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

## Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Ujście – Oborniki

Długość: **43,1 km**


Etap realizacji: **Przygotowanie – opracowano STEŚ**

System realizacji: **P&B**

Wykonawca dokumentacji - STEŚ: **Trakt Sp. z o.o.**

Data złożenia wniosku o DŚU: **29.10.2021 r.**

Planowana data uzyskania DŚU: **II kw. 2024 r.**

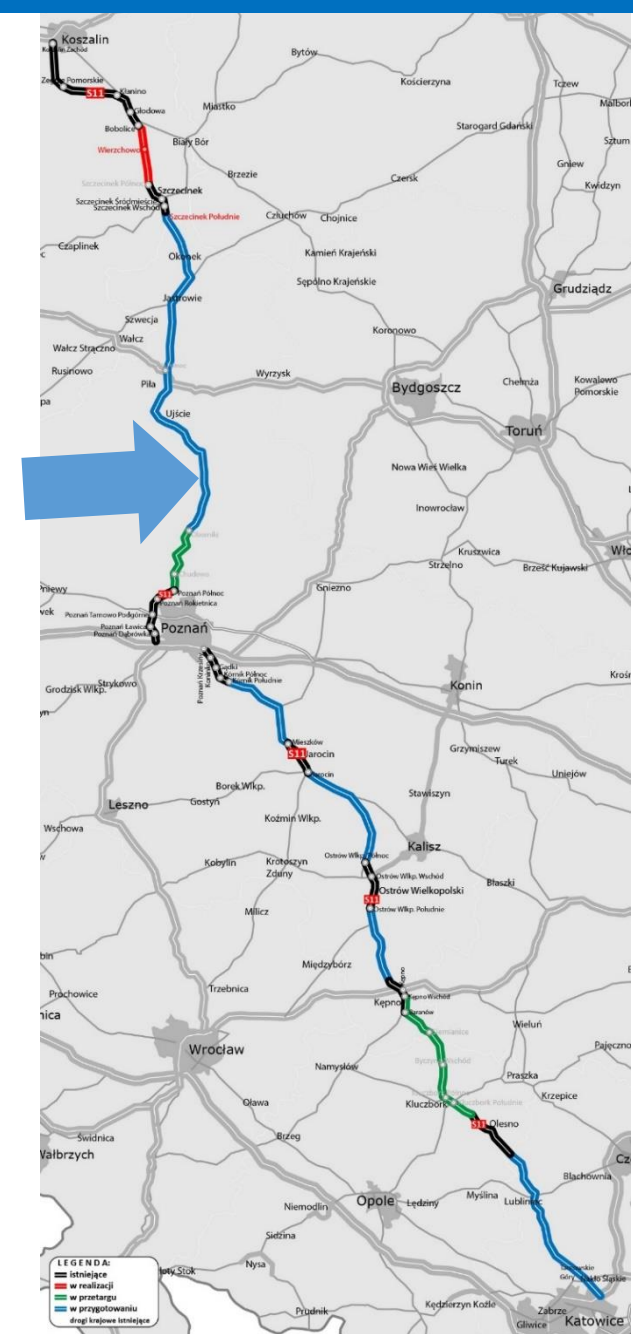



# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przetargu

**Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik**


Długość: **26,2 km**

Etap realizacji: **Przetarg na realizację**

System realizacji: **P&B**

Data wszczęcia postępowania: **10.10.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **II kw. 2028 r.**

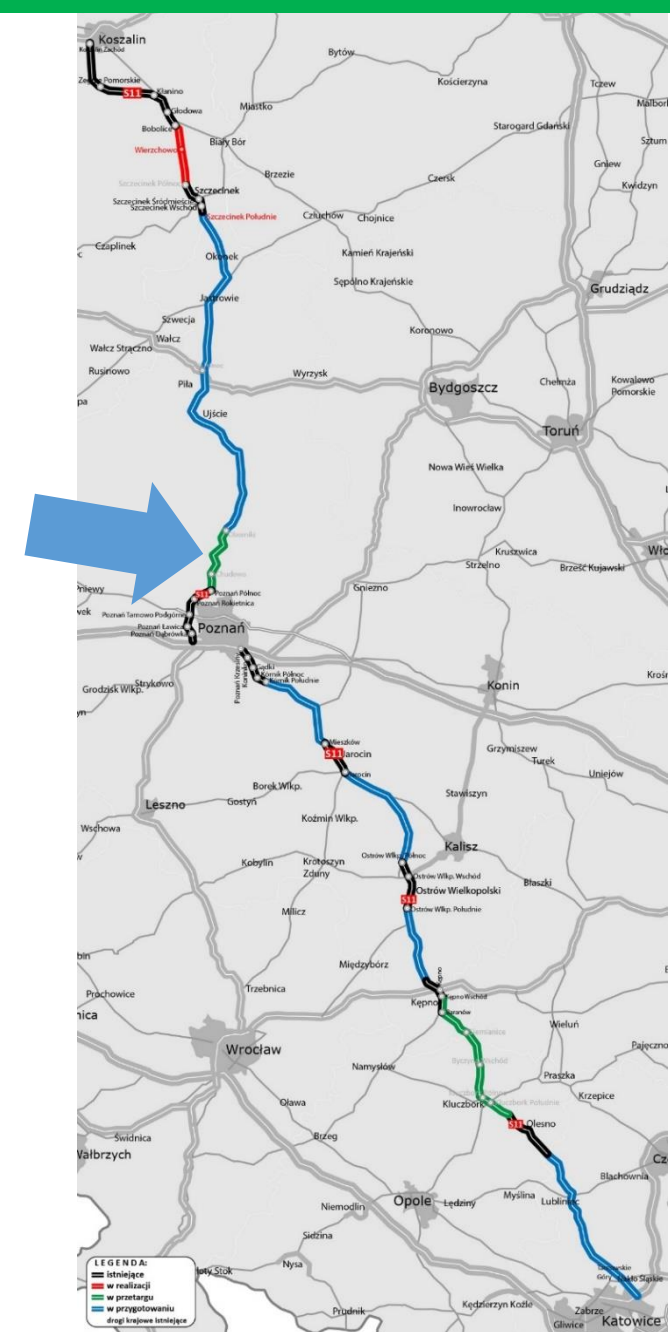

# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

**Budowa drogi S11 na odcinku Kórnik - Jarocin**

Długość: **43,73 km**

Etap realizacji: **Przygotowanie – w opracowaniu KP**


System realizacji: **P&B**

Wykonawca dokumentacji - STEŚ: **Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o.**

Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R: **14.05.2020 r.**

Data złożenia wniosku o DŚU: **19.12.2022 r.**

Planowana data uzyskania DŚU: **I kw. 2024 r.**

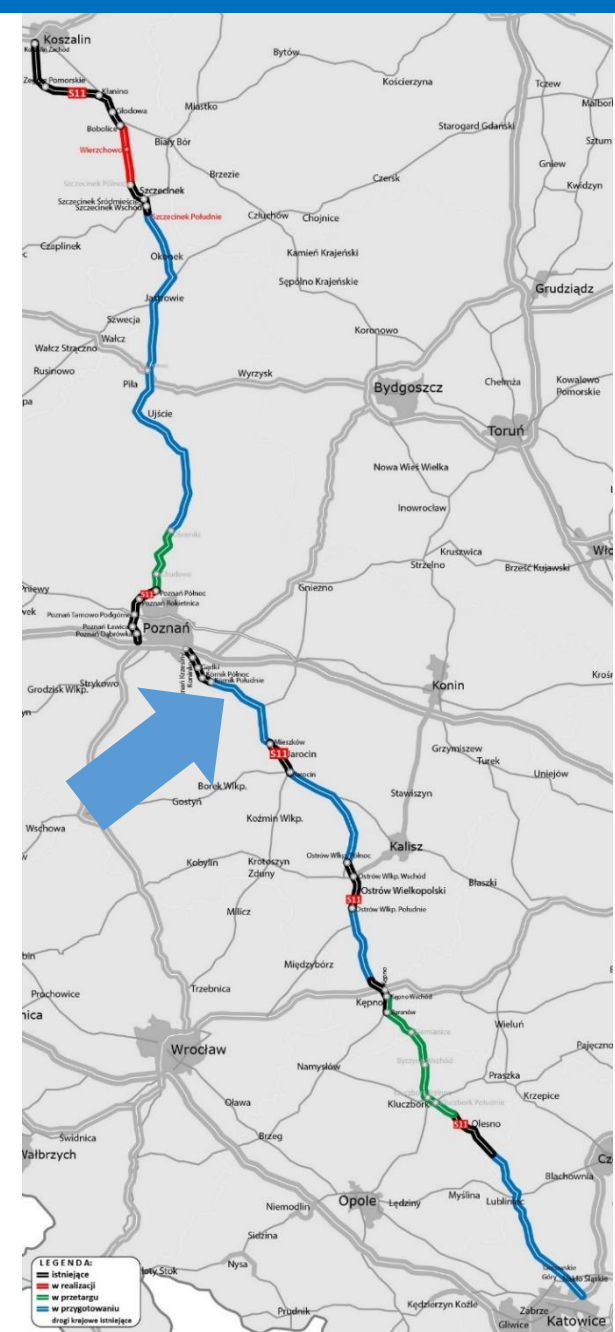

# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

**Budowa drogi S11 na odcinku Jarocin - Ostrów Wlkp.**

**Długość: 57,5 km**

**Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP**


**System realizacji: P&B**

**Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o.**

**Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R: 14.05.2020 r.**

**Data złożenia wniosku o DŚU: 31.03.2023 r.**

**Planowana data uzyskania DŚU: II/III kw. 2024 r.**

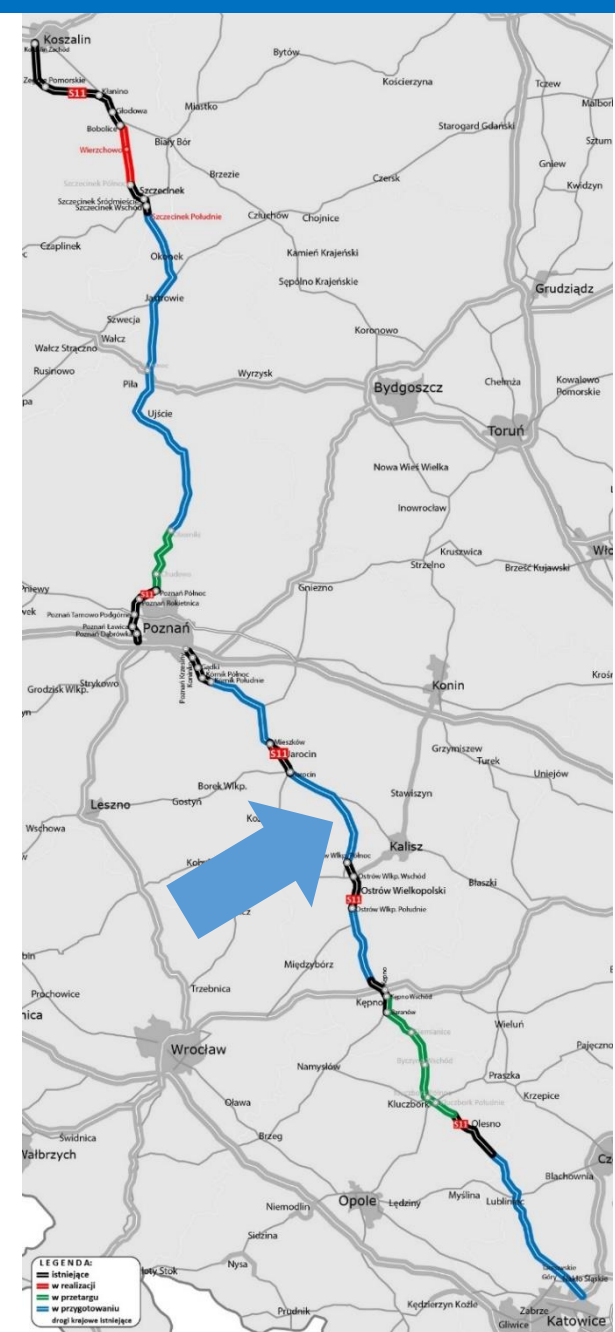

# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

**Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kępno**

**Długość: 31,2 km**

**Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP**


**System realizacji: P&B**

**Wykonawca dokumentacji - KP: Trakt Sp. z o.o.**

**Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R: 30.01.2018 r.**

**Data wydania DŚU: 31.01.2023 r. (brak ostateczności)**

**Planowana data odbioru KP: IV kw. 2024 r.**

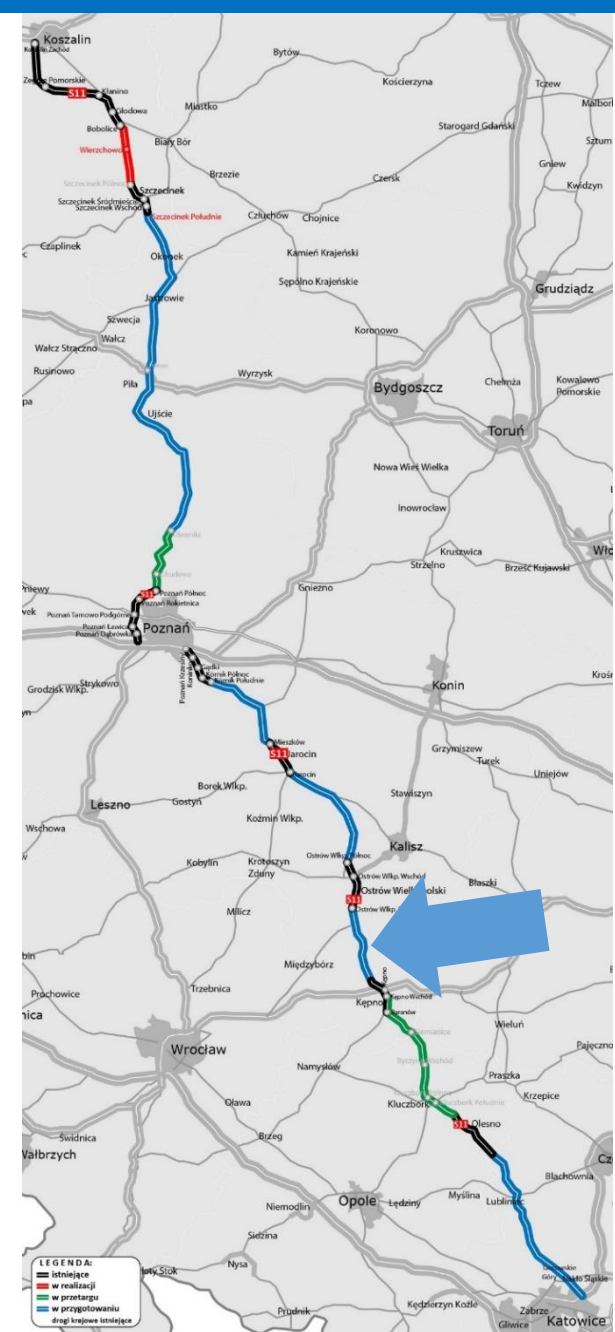

# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przetargu

**Budowa drogi ekspresowej S11 - Dobudowa drugiej jezdni na obwodnicy m. Kępno**


Długość: **4,2 km**

Etap realizacji: **Przetarg na realizację**

System realizacji: **P&B**

Data wszczęcia postępowania: **15.09.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **IV kw. 2027 r.**

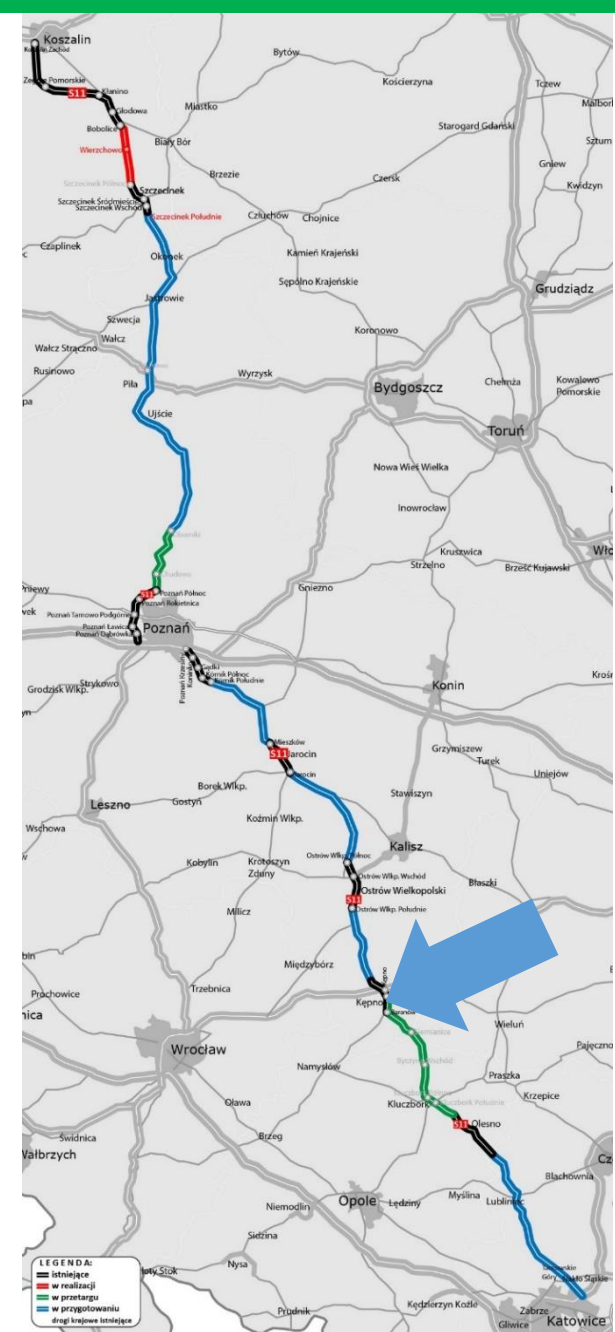

# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przetargu

**Budowa drogi ekspresowej S11 - I odc. Kępno - Siemianice**


**Długość: 12,5 km**

**Etap realizacji: Przetarg na realizację**

**System realizacji: P&B**

**Data wszczęcia postępowania: 31.08.2023 r.**

**Data planowana zakończenia robót: IV kw. 2027 r.**

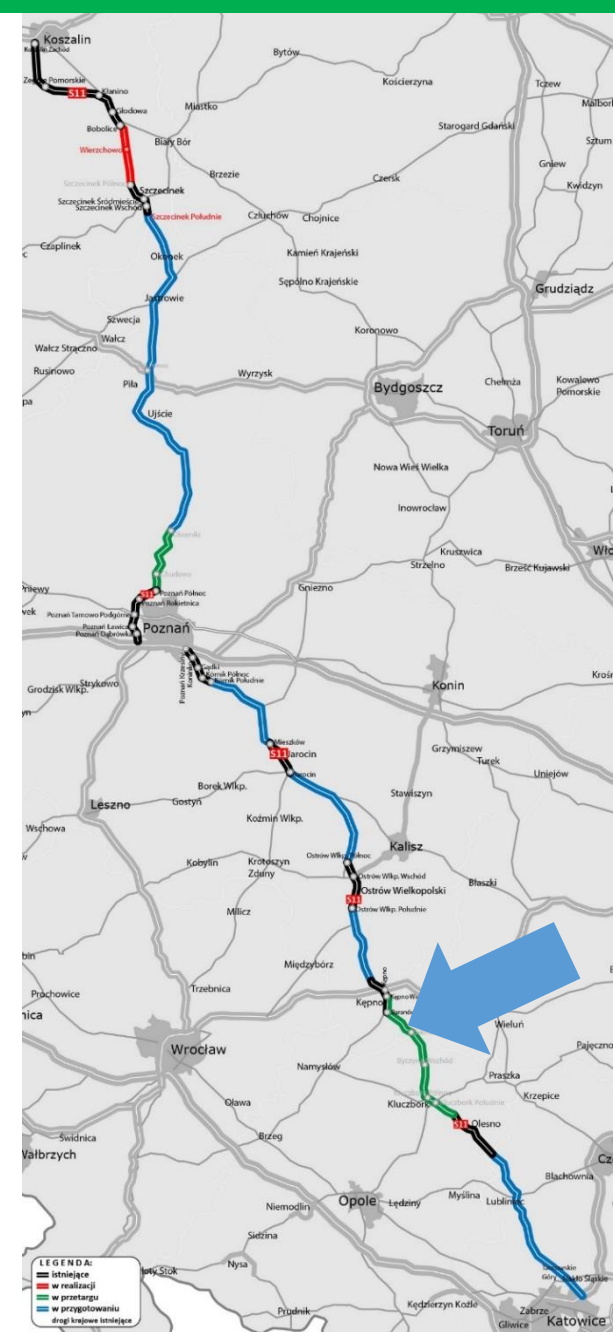

# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przetargu

## Budowa drogi ekspresowej S11 - II odc. Siemianice - Gotartówce


Długość: 22,8 km

Etap realizacji: **Przetarg na realizację**

System realizacji: **P&B**

Data wszczęcia postępowania: **31.08.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **IV kw. 2027 r.**

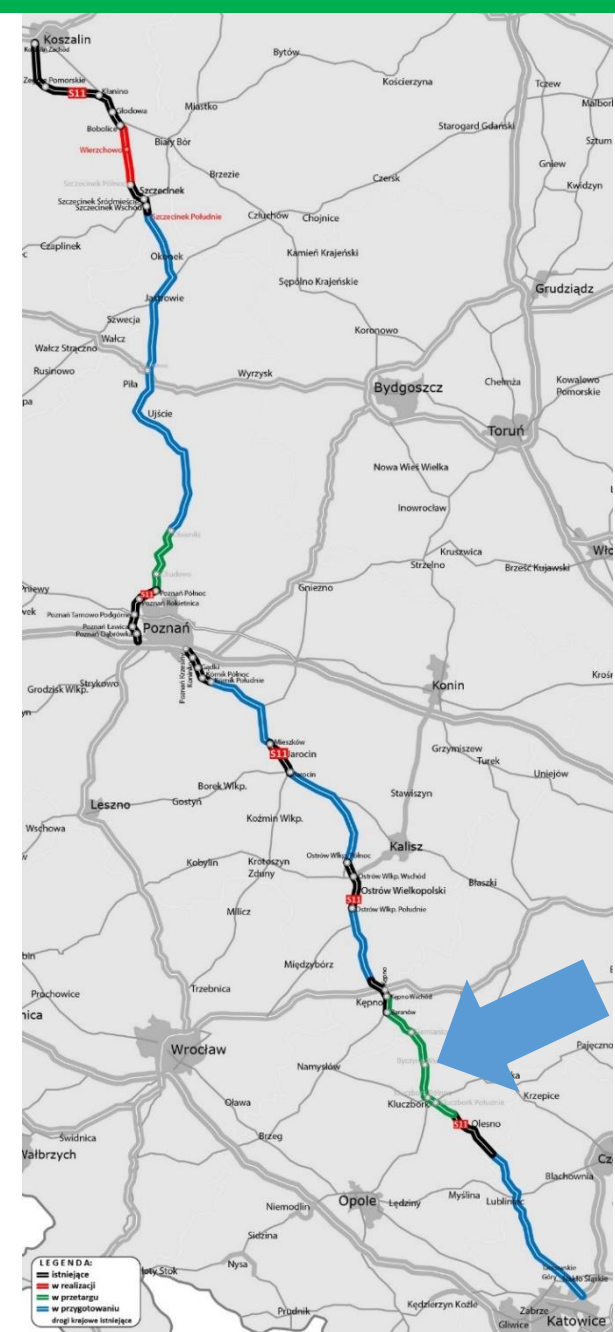

# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przetargu

## Budowa drogi ekspresowej S11 - III odc. Gotartów - początek obwodnicy Olesna


Długość: **10,5 km**

Etap realizacji: **Przetarg na realizację**

System realizacji: **P&B**

Data wszczęcia postępowania: **31.08.2023 r.**

Data planowana zakończenia robót: **IV kw. 2027 r.**

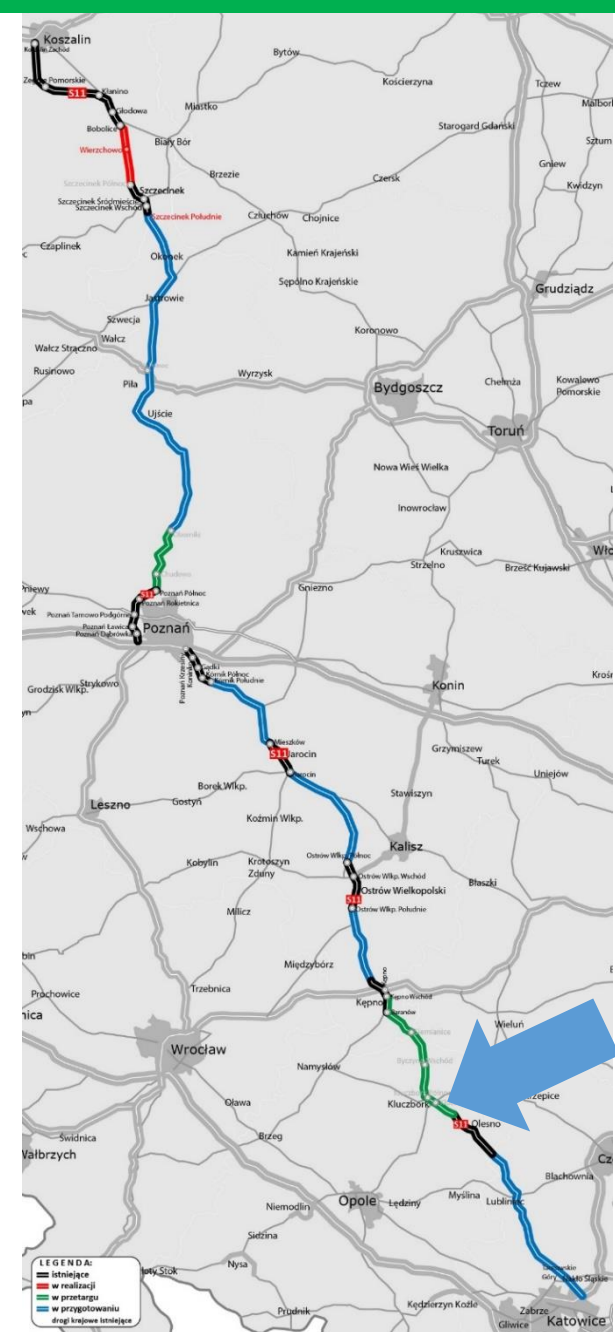



# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

**Budowa drogi S11 Kępno-A1 na odcinku gr. woj. opolskiego - obw. Tarnowskich Gór  
(z wyłączeniem obw. Tarnowskich Gór)**

Długość: **29,7 km**

Etap realizacji: **Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ**


System realizacji: **P&B**

Wykonawca dokumentacji - STEŚ: **Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe**

Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R: **09.10.2018 r.**

Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: **30.06.2023 r.**

Planowana data uzyskania DŚU: **II/III kw. 2024 r.**

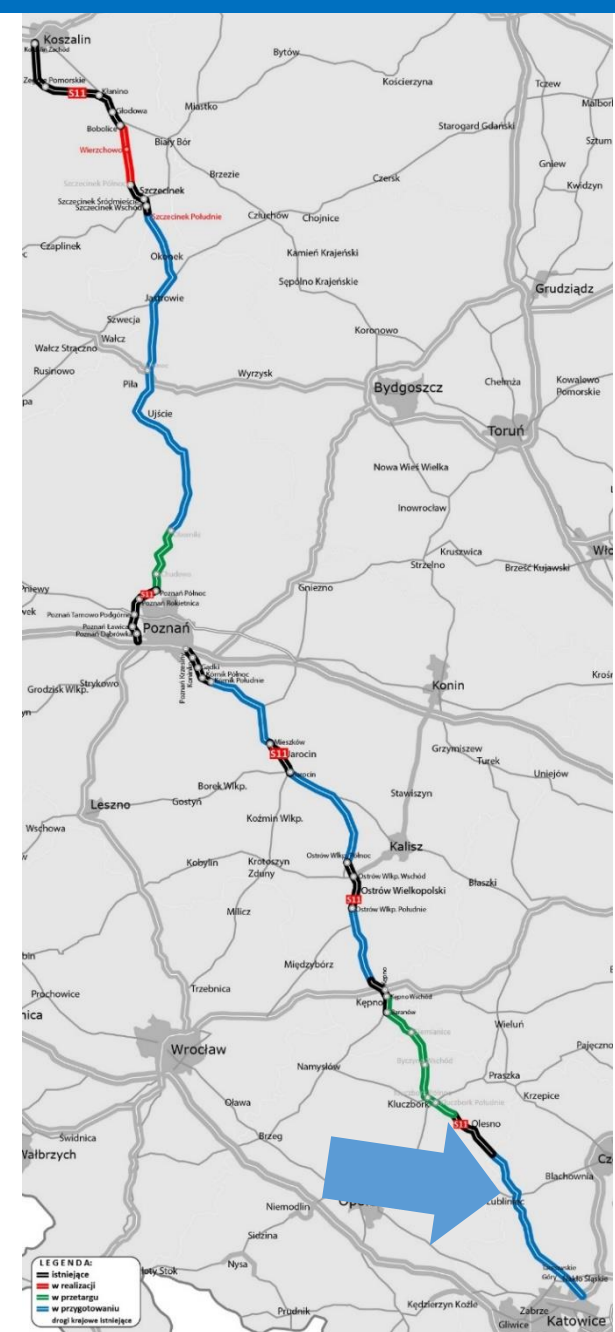

# Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

## Budowa drogi S11 Kępno - A1 na odcinku obwodnica Tarnowskich Gór

Długość: **36 km**

Etap realizacji: **Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ**


System realizacji: **P&B**

Wykonawca dokumentacji - STEŚ: **Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe**

Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R: **09.10.2018 r.**

Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: **25.09.2023 r.**

Planowana data uzyskania DŚU: **IV kw. 2024 r.**

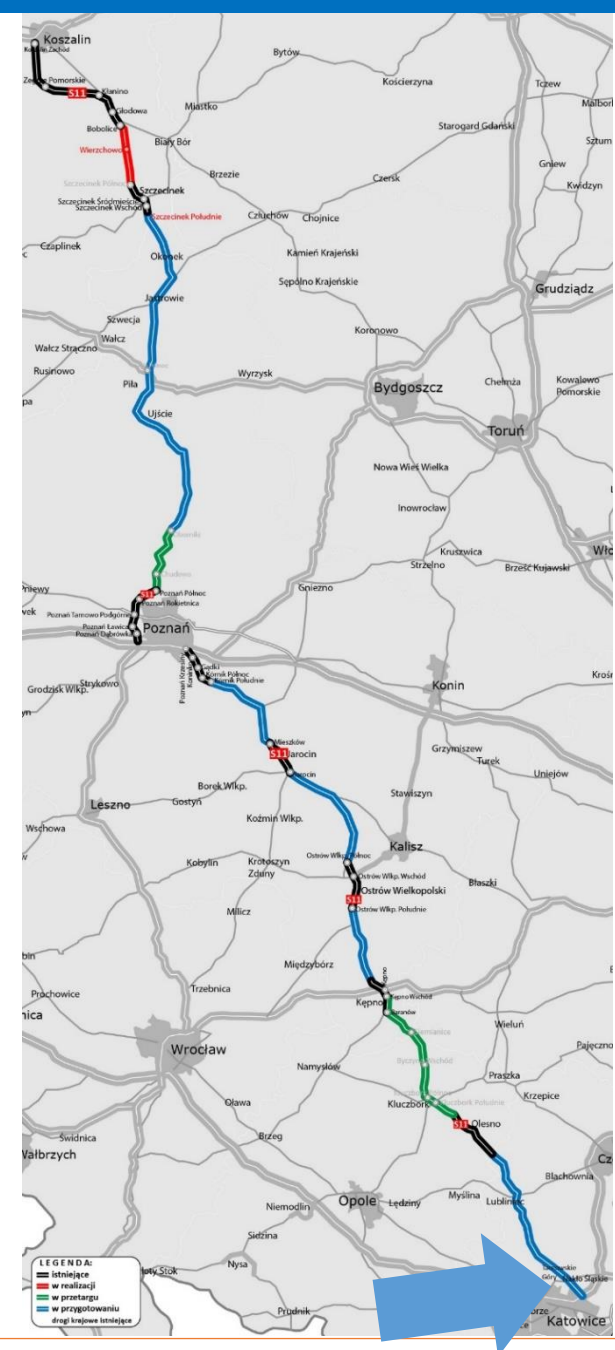



# **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

ul. Wronia 53  
00-874 Warszawa  
tel. 22 375 88 88  
e-mail: [kancelaria@gddkia.gov.pl](mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl)

[www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)

[www.facebook.com](http://www.facebook.com)

[www.twitter.com/gddkia](http://www.twitter.com/gddkia)
