

Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. budowy drogi S6 i S11



14 października 2021 r.



Droga ekspresowa S6 – odcinki w przygotowaniu


Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6

Odcinek 1 Kołbaskowo – Dołuje 13,6 km

Odcinek 2 Dołuje - Police 11,9 km

Odcinek 3 Police - Goleniów 23,4 km

Etap realizacji: Przygotowanie – przetarg na PB

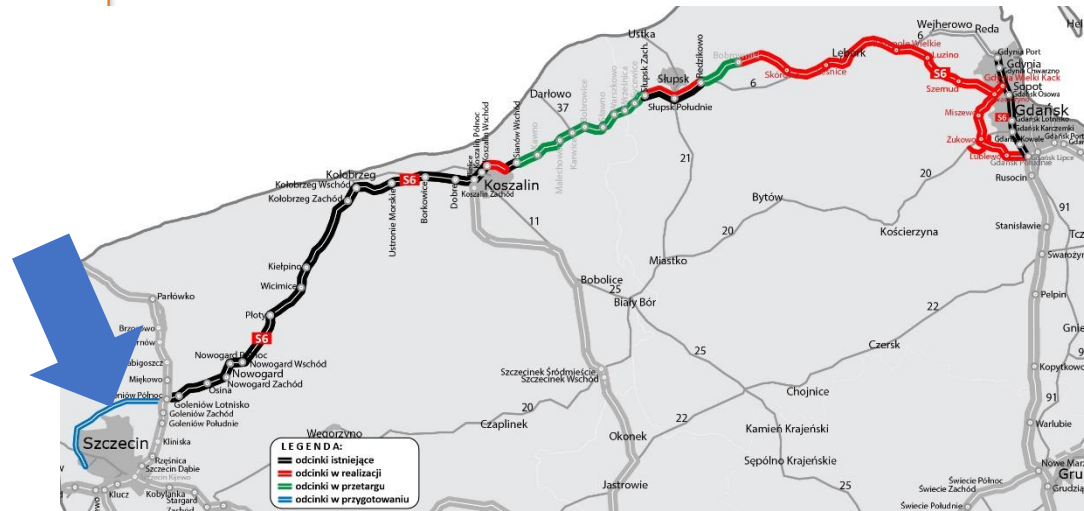

Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 6+400 do km 14+300

System realizacji: **Tradycyjny**

Długość odcinka: **7,9 km**

Wykonawca: **Polbud-Pomorze Sp. z o.o.;**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp.
z o. o.; Wibra Infrastruktura Sp. z o.o. sp. K.**

ZKK: **364 941 373,64 zł netto**


(448 877 889,58 zł brutto)

Data podpisania umowy: **20.07.2021 r.**

Data rozpoczęcia robót: **15.08.2021 r.**

Data planowana zakończenia robót:

20.08.2023 r.

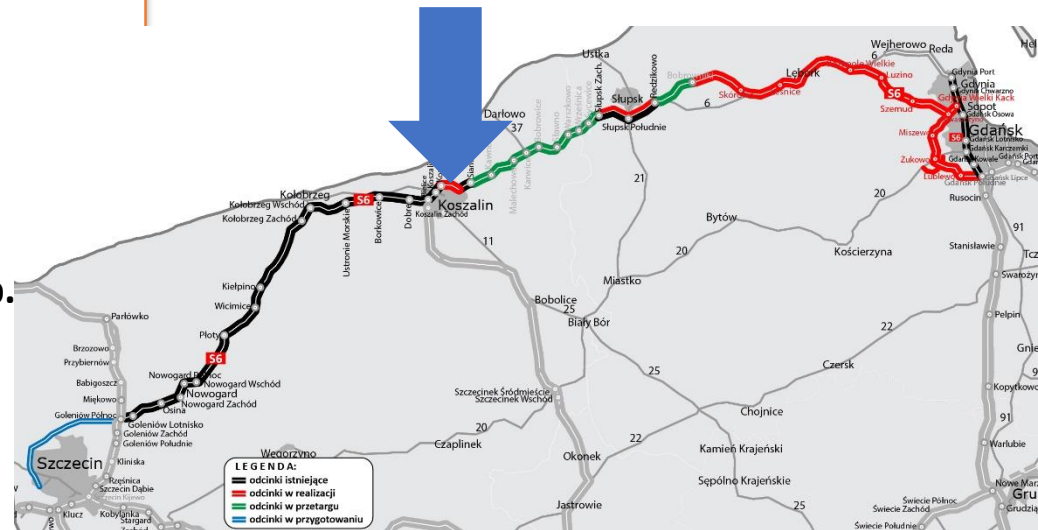

Droga ekspresowa S6 – odcinki w przetargu

Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Bobrowice"/
Długość 23,2 km


Etap realizacji: Przetarg na realizację

System realizacji: P&B

Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: **01.09.2021 r.**

Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : **29.03.2022 r.**

Data planowana zakończenia robót:
30.06.2025 r.

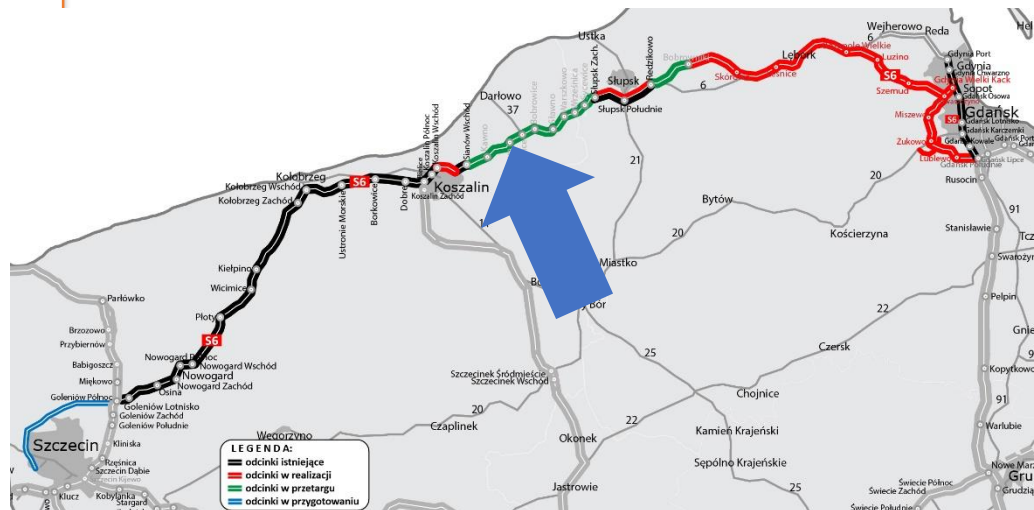

Droga ekspresowa S6 – odcinki w przetargu

Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/
Długość: 22,9 km


Etap realizacji: Przetarg na realizację

System realizacji: P&B

Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: **01.09.2021 r.**

Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : **31.03.2022 r.**

Data planowana zakończenia robót: **30.06.2025 r.**

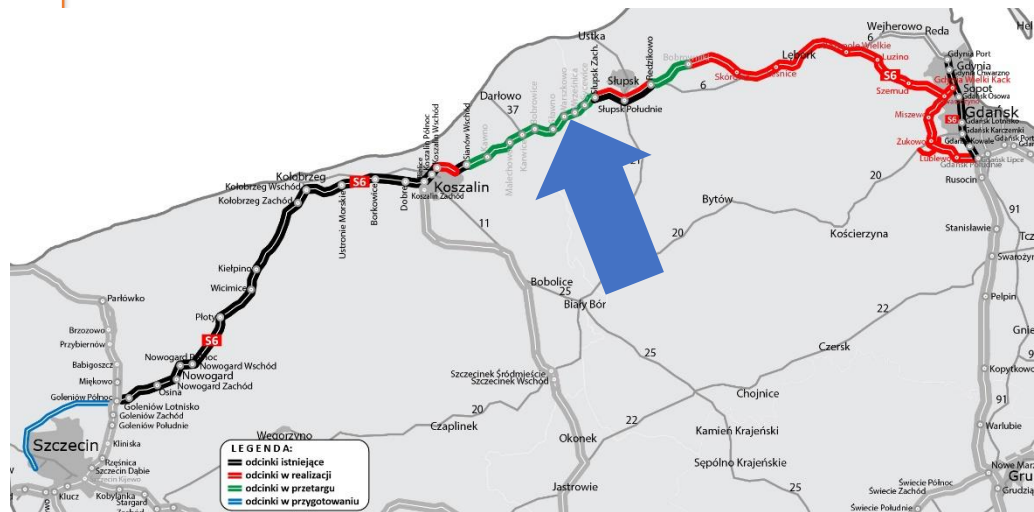

Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

Zadanie 1: II jezdnia w ciągu Obw. Słupska

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Długość odcinka: **9,51 km**

Wykonawca: **Strabag Sp. z o.o.**

ZKK: **238 582 453,36 brutto**

Data podpisania umowy: **28.05.2021**

Wniosek o ZRID (planowany): **28.03.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID (planowany):

10.10.2022 r.

Data planowana zakończenia robót:

29.05.2025



Droga ekspresowa S6 – odcinki w przetargu

Koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem)

Długość: 16,1 km


Etap realizacji: Przetarg na realizację

System realizacji: P&B

Data wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia na realizację: **11.12.2020 r.**

Data planowana podpisania umowy z
wykonawcą : **10.11.2021 r.**

Data planowana zakończenia robót:
10.10.2025 r.

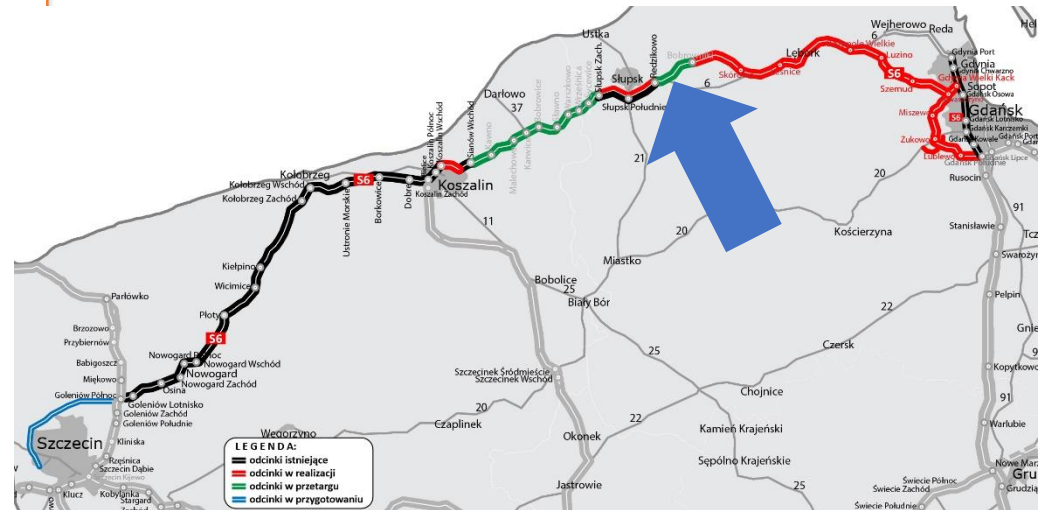

Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Długość odcinka: **13,15 km**

Wykonawca: **Aldesa Construcciones Polska**

Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA

ZKK: **283 199 309,17 brutto**

Data podpisania umowy: **29.06.2021 r.**


Wniosek o ZRID (planowany): **29.04.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID (planowany):

10.10.2022 r.

Data planowana zakończenia robót:

29.05.2025 r.

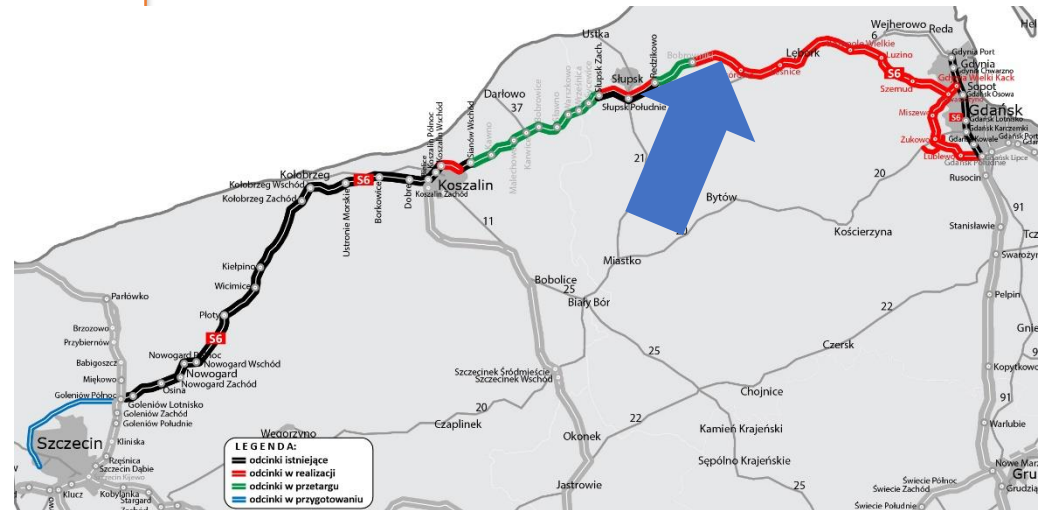

Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

**Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) –
w. Leśnice (z węzłem)**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Długość odcinka: **10,88 km**

Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Usług**

Technicznych Intercor Sp. z o.o.

ZKK: **344 400 000,00 zł brutto**

Data podpisania umowy: **15.06.2021 r.**

Wniosek o ZRID (planowany): **15.04.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID (planowany):

27.10.2022 r.

Data planowana zakończenia robót:

15.05.2025 r.



Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

**Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) –
w. Bożepole Wielkie (bez węzła)**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Długość odcinka: **22 km**

Wykonawca: **Budimex SA**


ZKK: **718 669 944,83 zł brutto**

Data podpisania umowy: **29.07.2021 r.**

Wniosek o ZRID (planowany): **29.05.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID (planowany):
10.12.2022 r.

Data planowana zakończenia robót:
16.06.2025 r.

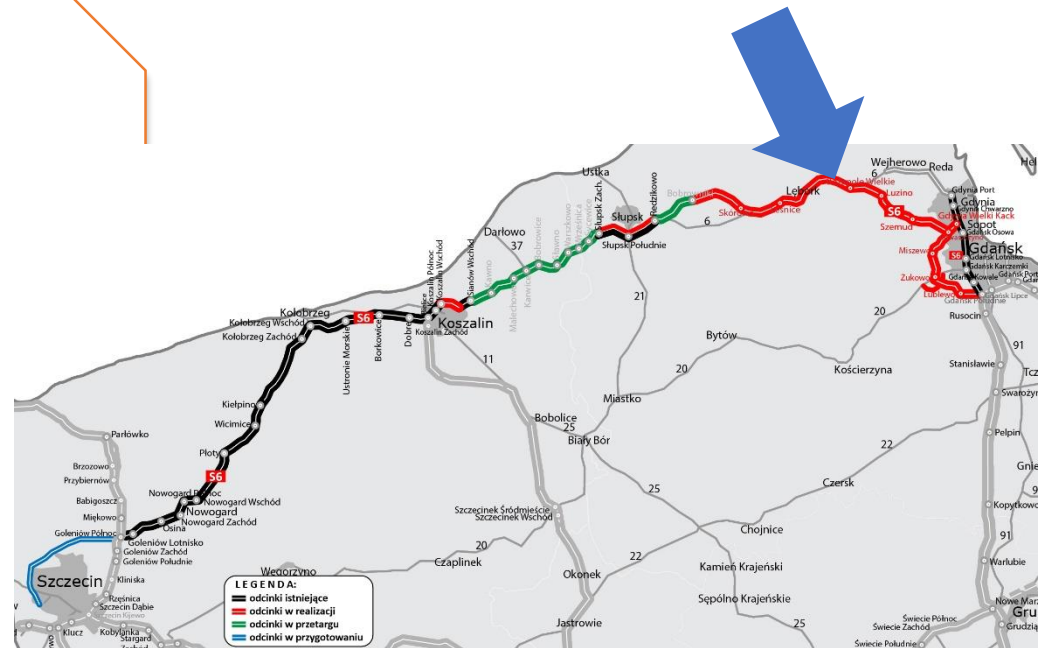

Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

**Zadanie 1: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) –
w. Luzino (z węzłem)**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Długość odcinka: **10,4 km**

Wykonawca: **Porr S.A.**

ZKK: **352 155,52299 zł brutto**

Zaawansowanie rzeczowe: **45,72 %**,

Data podpisania umowy: **11.06.2018 r.**

Wniosek o ZRID: **11.04.2019 r.**


Termin wydania decyzji ZRID:1: **10.01.2020 r.;**

2: **26.03.2020 r.**

Data rozpoczęcia robót: **10.01.2020 r.**

Data planowana zakończenia robót:

31.08.2022 r.

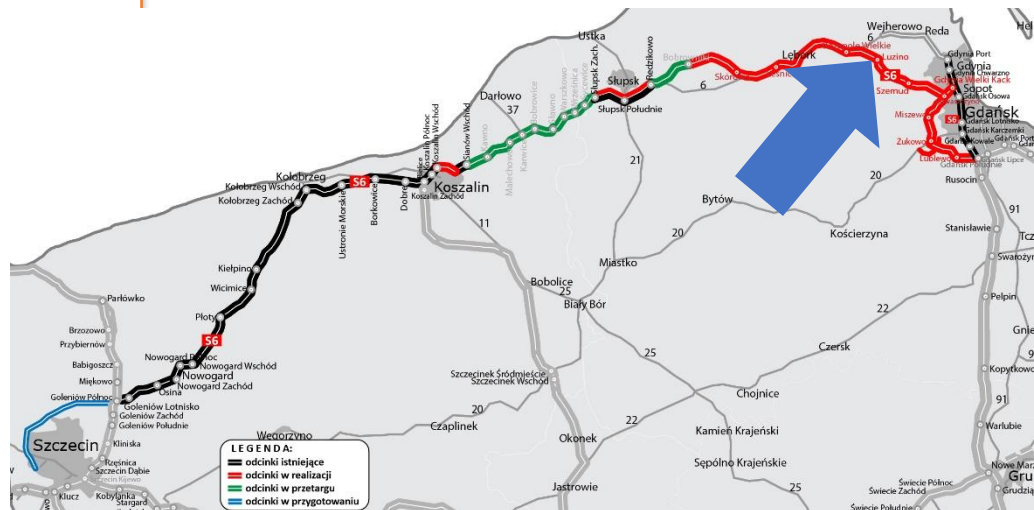

Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

**Zadanie 2: w. Luzino (bez węzła) –
w. Szemud (z węzłem)**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Długość odcinka: **10,3 km**

Wykonawca: **Budimex SA**

ZKK: **343 027,86718 zł brutto**

Zaawansowanie rzeczowe: **84,90 %**,

Data podpisania umowy: **11.06.2018 r.**


Wniosek o ZRID: **11.04.2019 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: **21.10.2019 r.**

Data rozpoczęcia robót: **21.10.2019 r.**

Data planowana zakończenia robót:

23.05.2022 r.

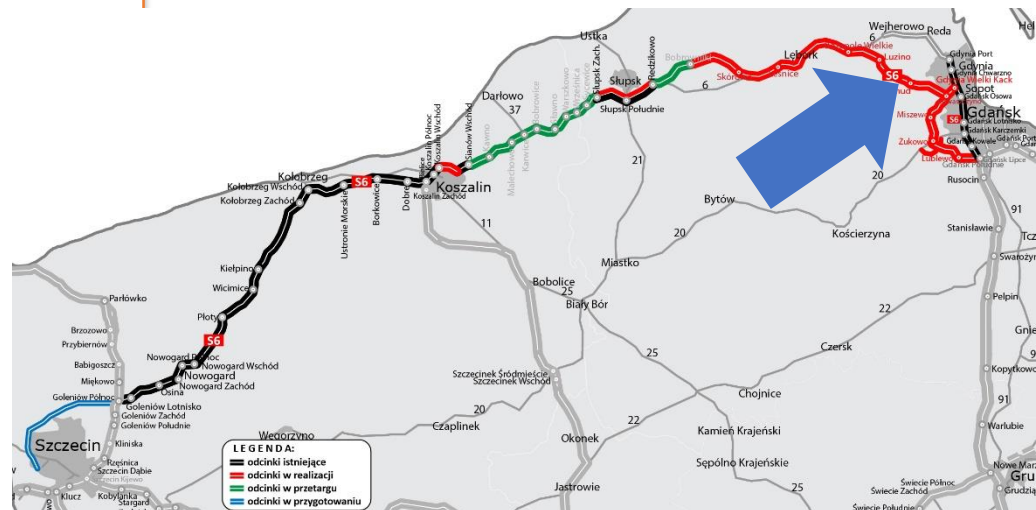

Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

**Zadanie 3: w. Szemud (bez węzła) –
w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Długość odcinka: **20,2 km**

Wykonawca: **Polaqua Sp. z o.o.**

ZKK: **817 110 153,92 zł brutto**

Zaawansowanie rzeczowe: **56,18 %**

Data podpisania umowy: **26.03.2018 r.**

Wniosek o ZRID: **26.01.2019 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: 1: **24.09.2019 r.;**


2: **10.10.2019 r.**

Data rozpoczęcia robót: 1: **24.09.2019 r.;**

2: **10.10.2019 r.**

Data planowana zakończenia robót:

24.06.2022 r.

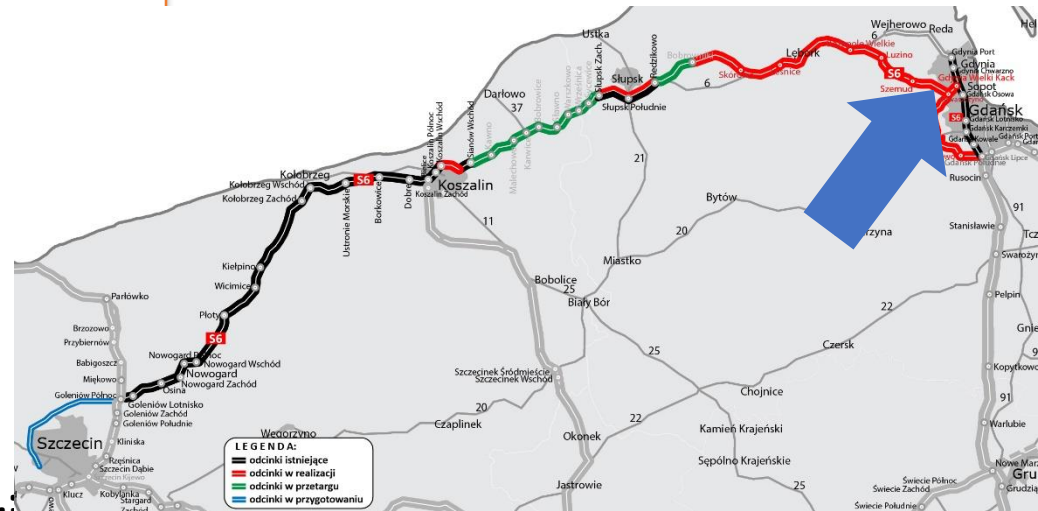

Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

**Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) –
węzeł Żukowo (bez węzła)**

System realizacji: **Projektuj & Buduj**

Długość odcinka: **16,3 km**

Wykonawca: **Budimex S.A.**

ZKK: **715 169 700,63 zł brutto**

Data podpisania umowy: **16.04.2021 r.**


Wniosek o ZRID (planowany): **16.02.2022 r.**

Termin wydania decyzji ZRID (planowany):

30.08.2022 r.

Data planowana zakończenia robót:


16.03.2025 r.

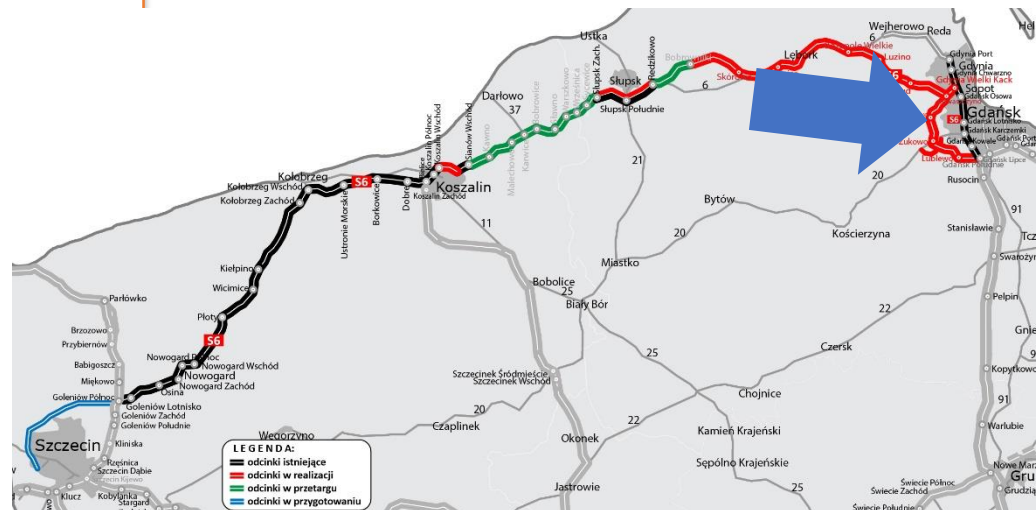

Droga ekspresowa S6 – odcinki w realizacji

**Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) –
węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)
wraz z obwodnicą Żukowa**
System realizacji: **Projektuj & Buduj**
Długość odcinka: **22,85 km**
Wykonawca: **Mirbud SA; Kobyłarnia SA**
ZKK: **776 999 999,91 zł brutto**

Data podpisania umowy: **16.04.2021 r.**
Wniosek o ZRID (planowany): **16.02.2022 r.**
Termin wydania decyzji ZRID (planowany):
30.08.2022 r.
Data planowana zakończenia robót:
17.03.2025 r.

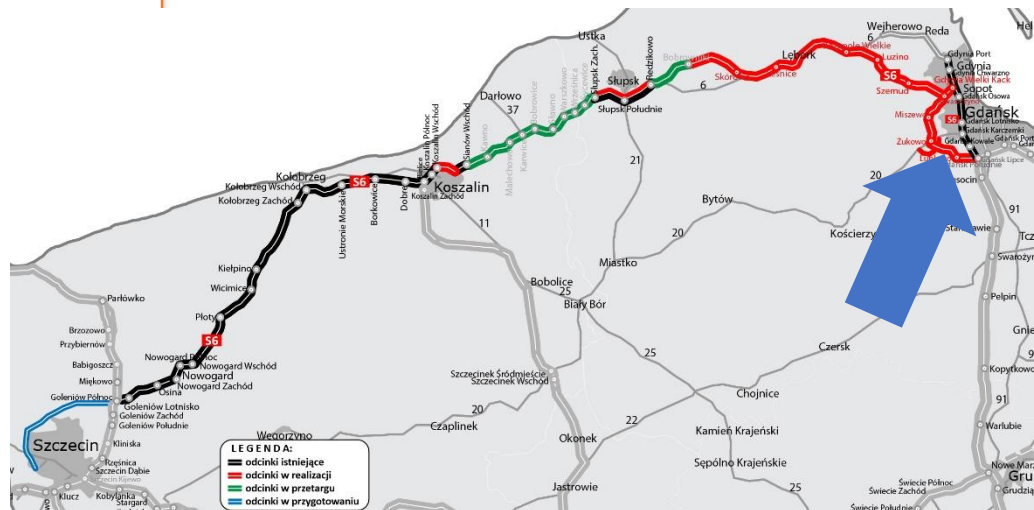

Droga ekspresowa S11 – odcinki w realizacji

S11 Odc. 1 węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)

System realizacji: **Projektuj i Buduj**

Długość odcinka: **16,9 km**

Wykonawca: **Budimex SA;**

ZKK: **471 398 000,00 zł netto**

(579 819 540,00 zł brutto)

Zaawansowanie rzeczowe: **18,79 %**


Data podpisania umowy: **04.03.2020 r.**

Wniosek o ZRID: **22.12.2020 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: **30.06.2021 r.**

Data planowana zakończenia robót:

04.09.2023 r.

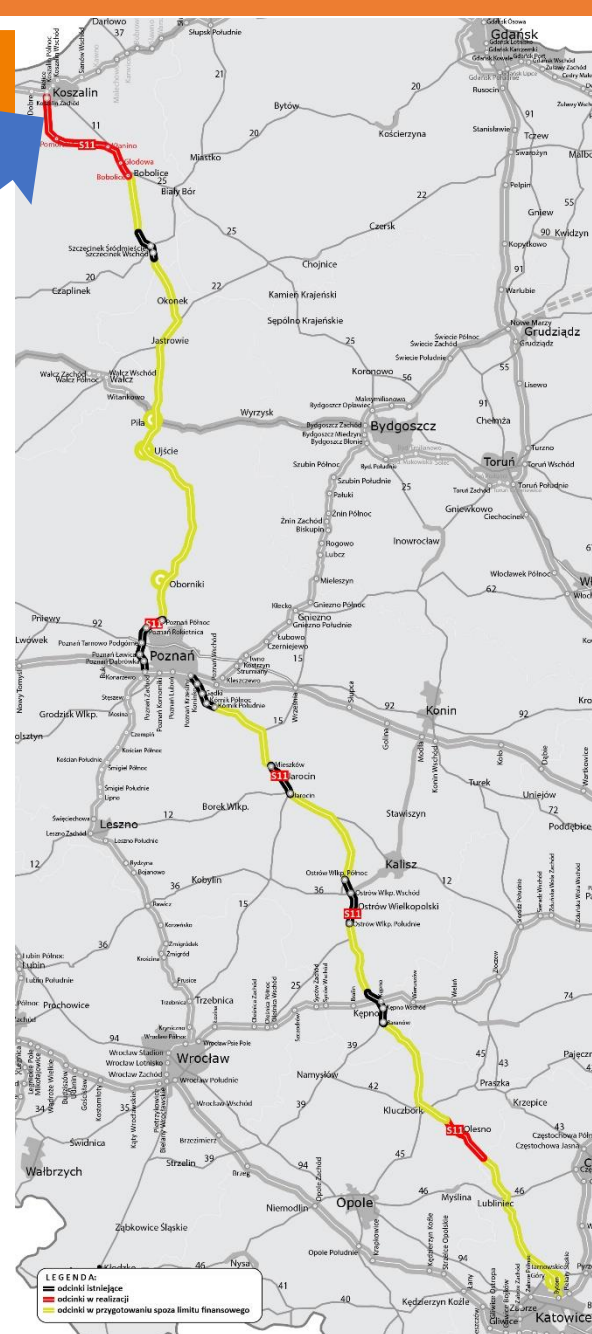

Droga ekspresowa S11 – odcinki w realizacji

S11 odc. 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)

System realizacji: **Projektuj i Buduj**

Długość odcinka: **19,3 km**

Wykonawca: **Mostostal Warszawa SA**

ZKK: **388 862 641,66 zł netto**

(478 301 049,24 zł brutto)

Zaawansowanie rzeczowe: **12,72 %**


Data podpisania umowy: **07.02.2020 r.**

Wniosek o ZRID: **04.12.2020 r.**

Data wydania decyzji ZRID: **23.06.2021 r.**

Data planowania zakończenia robót:

07.08.2023 r.

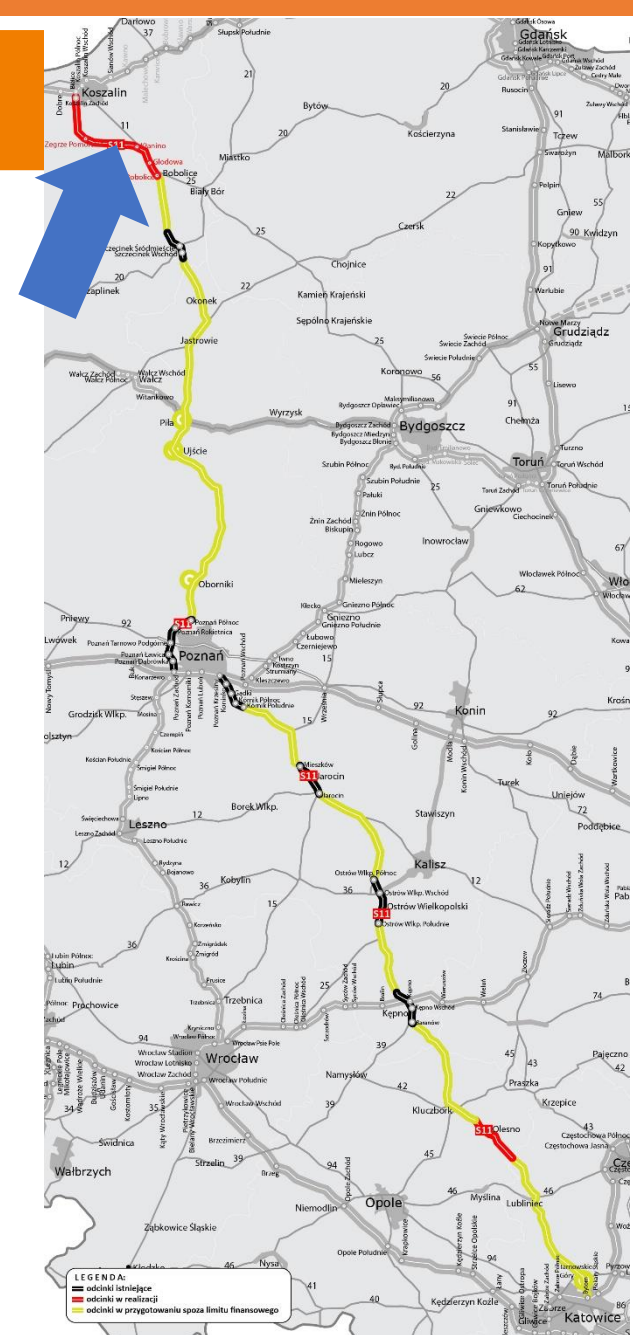

Droga ekspresowa S11 – odcinki w realizacji

S11 odc. 3 węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem)

System realizacji: **Projektuj i Buduj**

Długość odcinka: **11,6 km**

Wykonawca:

Mirbud SA,

Kobylarnia SA

ZKK: **365 853 658,54 zł netto**

(450 000 000,00 zł brutto)

Zaawansowanie rzeczowe: **10,10 %**


Data podpisania umowy: **04.03.2020 r.**

Wniosek o ZRID: **22.12.2020 r.**

Data wydania decyzji ZRID: **21.06.2021 r.**

Data planowana zakończenia robót:

04.09.2023 r.

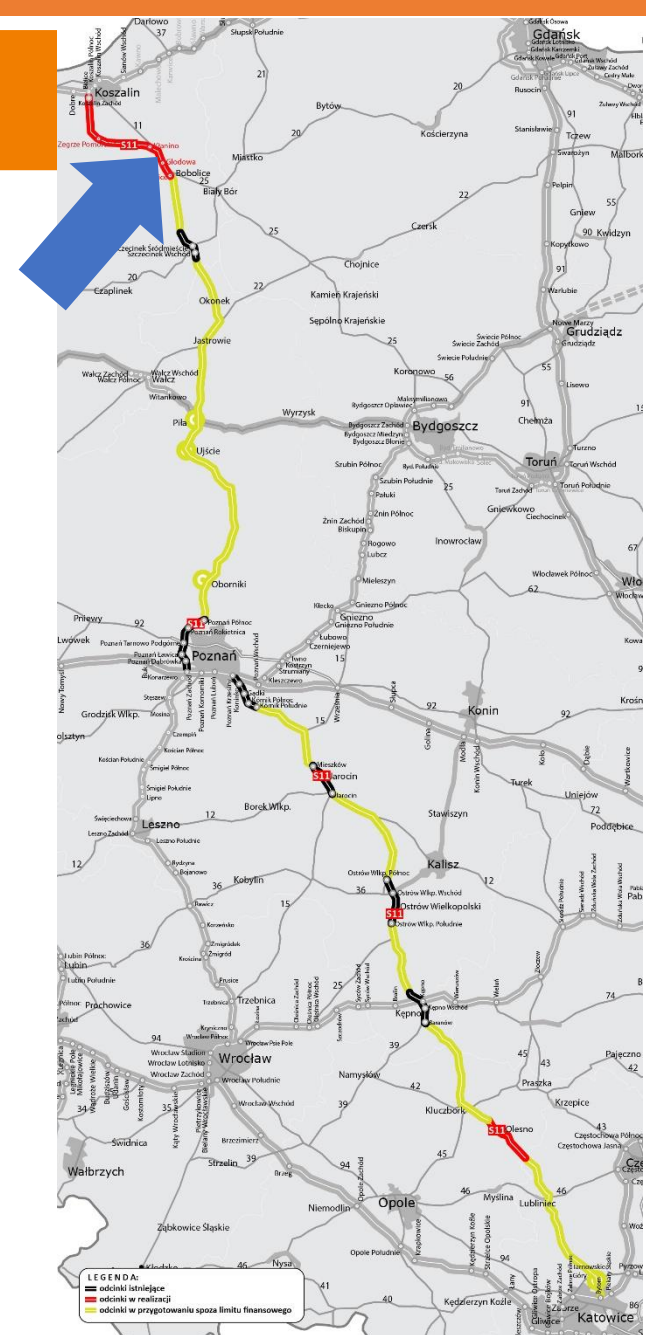

Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

Budowa drogi S11 na odcinku Bobolice – Szczecinek

Długość 24,4 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu PB


Wykonawca dokumentacji - PB: Transprojekt
Gdański Sp. z o.o.

Planowana data złożenia wniosku o ZRID:
29.10.2021 r.

Planowana data uzyskania ZRID: **29.04.2022 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia na realizację:

16.05.2022 r.

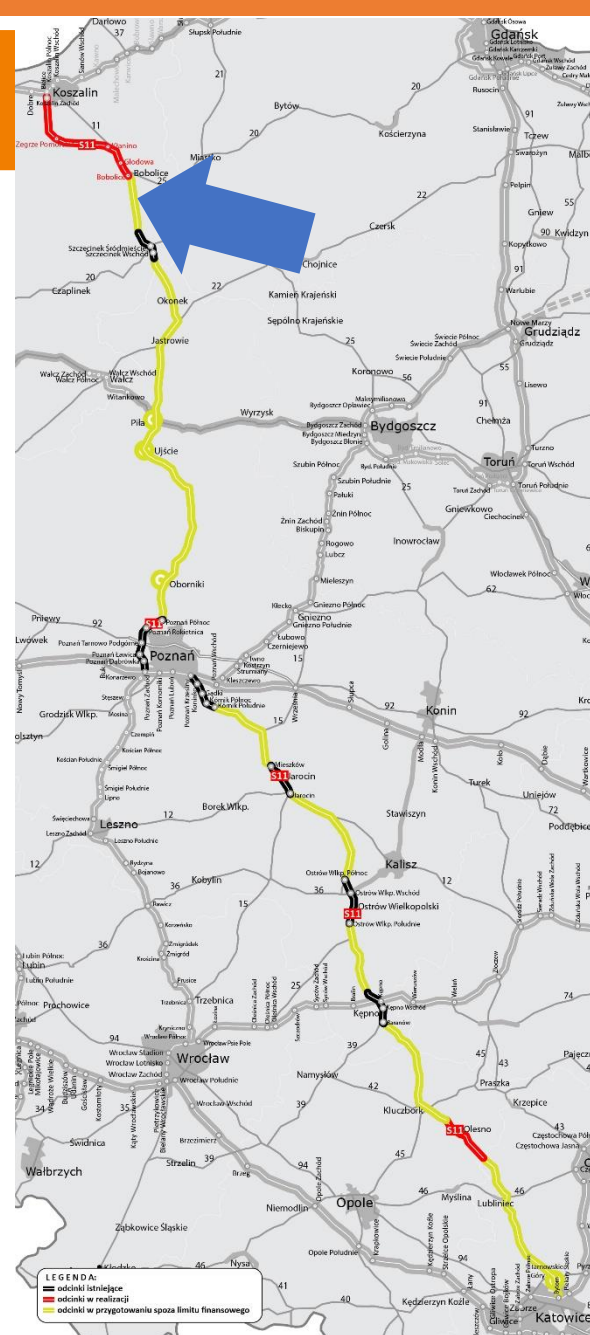

Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Szczecinek – Piła

Długość 59,3 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu KP

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - KP:

Aecom Polska Sp. z o.o.

Data podpisania umowy na KP: **30.01.2018 r.**


Data złożenia wniosku o wydanie DŚU:

03.03.2021 r. (*procedura w RDOŚ*)

Planowana data uzyskania DŚU: **04.02.2022 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia na realizację:

02.07.2023 r.

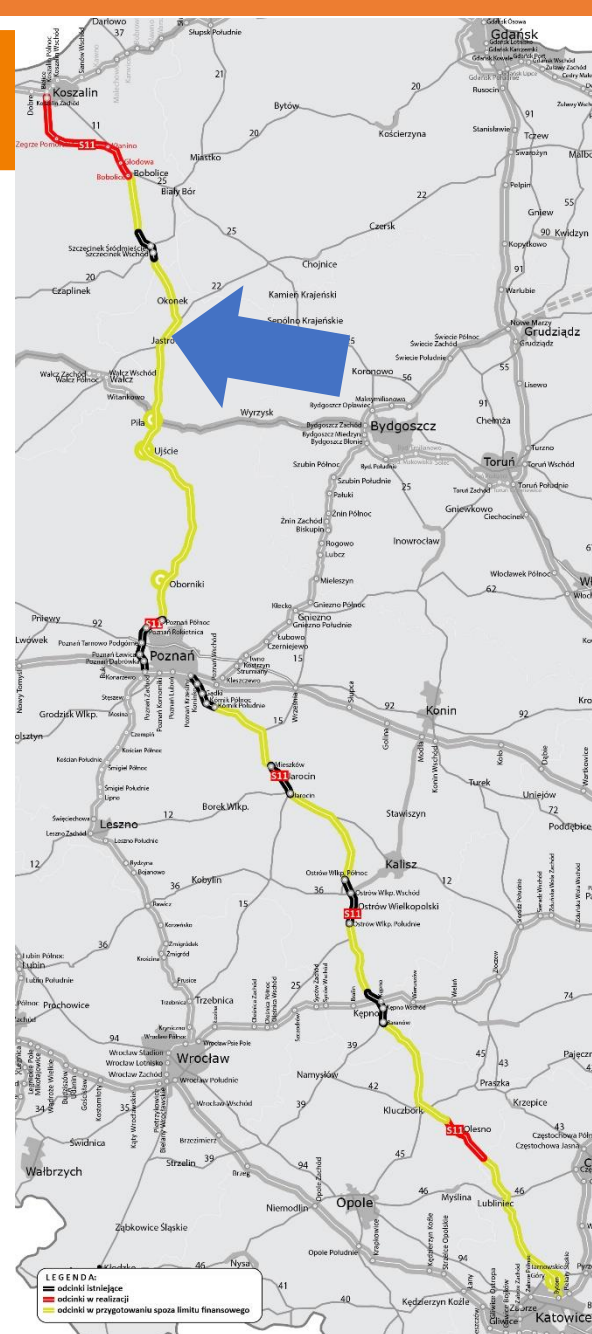

Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

Budowa obwodnicy Piły w ciągu S10/S11

Długość 9,2 km

Budowa obwodnicy Ujścia w ciągu S11

Długość 10,8 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu STEŚ

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - STEŚ:

Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: **08.06.2018 r.**

Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R: **03.04.2020 r.**


Data złożenia wniosku o DŚU: **08.06.2018 r.**

Data zawieszenia postępowania o wydanie DSU z
uwagi na aktualizację dokumentacji będącej wynikiem
wezwania RDOŚ: **25.09.2019 r.**

Planowana data odwieszenia postępowania w sprawie
DŚU/ planowana data złożenia nowego wniosku o
DSU: **15 maja 2022 r.**

Planowana data uzyskania DŚU: **30.11.2022 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia na realizację: **01.11.2023 r.**

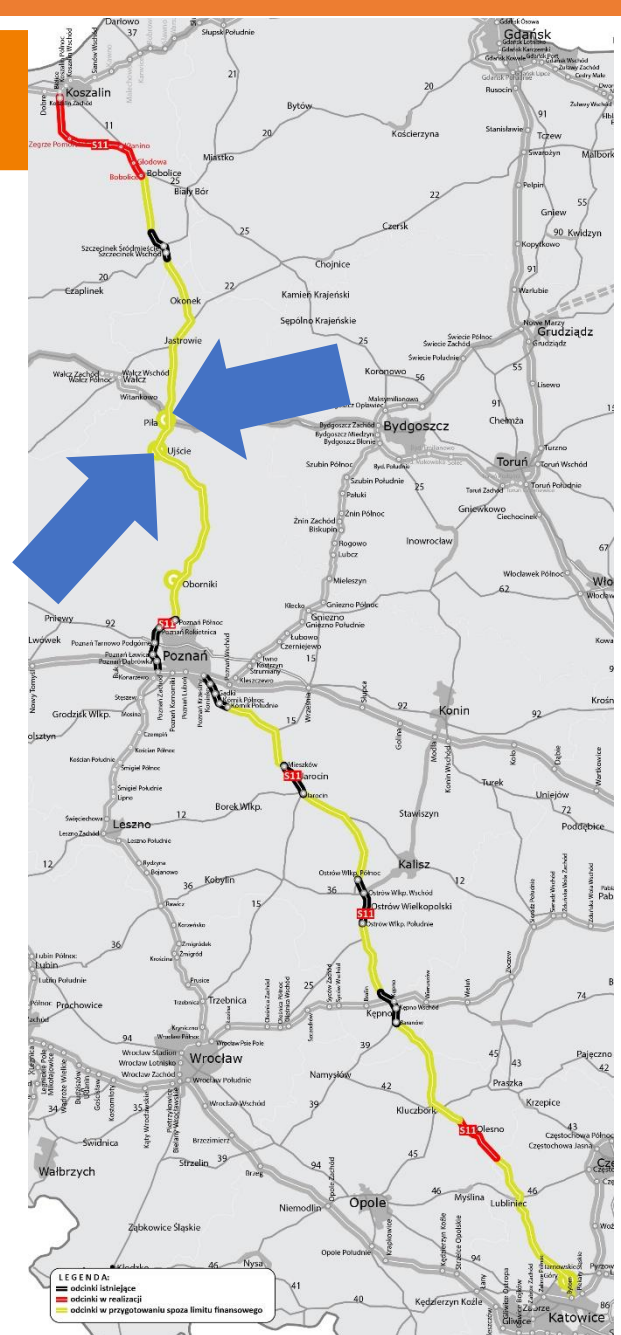

Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

Budowa drogi ekspresowej S11

na odcinku Ujście – Oborniki

Długość 43,3 km

Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano
STEŚ

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Trakt

Sp. z o.o.


Planowana data złożenia wniosku o DŚU:

29.10.2021 r.

Planowana data uzyskania DŚU: **31.07.2022 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia na realizację:

01.12.2023 r.

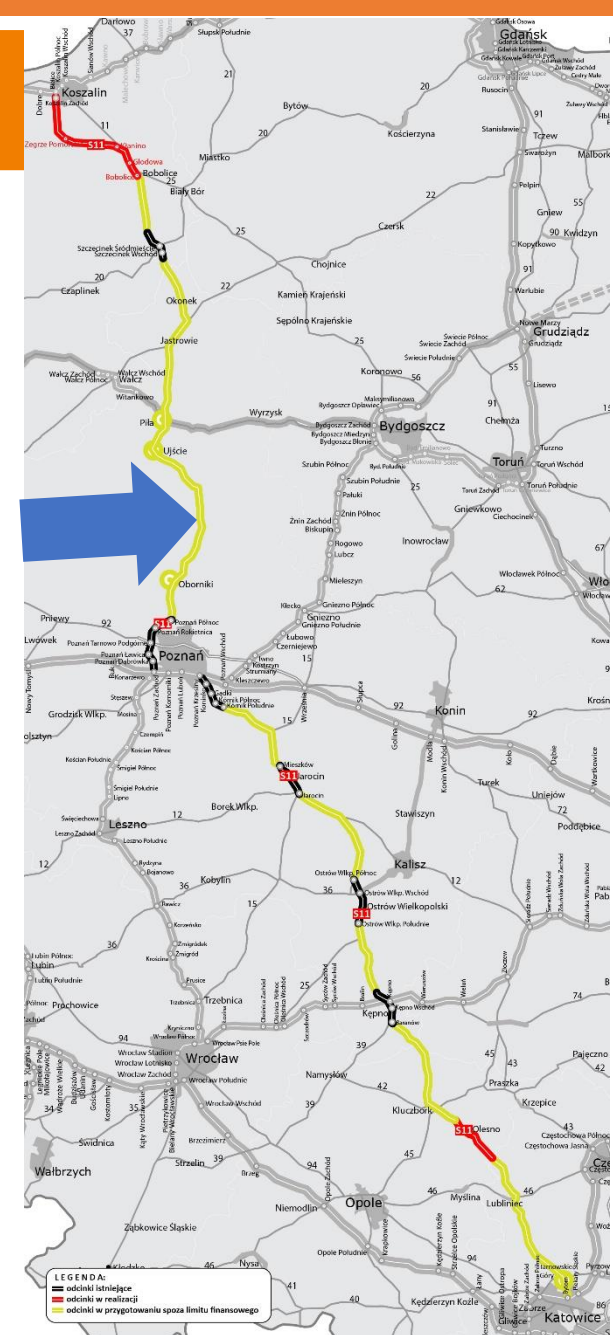

Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

Budowa drogi ekspresowej S11

na odcinku Oborniki – Poznań

Długość 22,3 km

Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - KP:

Aecom Polska Sp. z o.o.

Data podpisania umowy na KP: **30.01.2018 r.**

Data złożenia wniosku o wydanie DŚU:


22.12.2020 r.

Planowana data uzyskania DŚU: **15.12.2021 r.**

(ryzyko zmiany o ok. 6 m-cy z uwagi na nowe wymagania RDOŚ)

Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację:

02.01.2023 r.

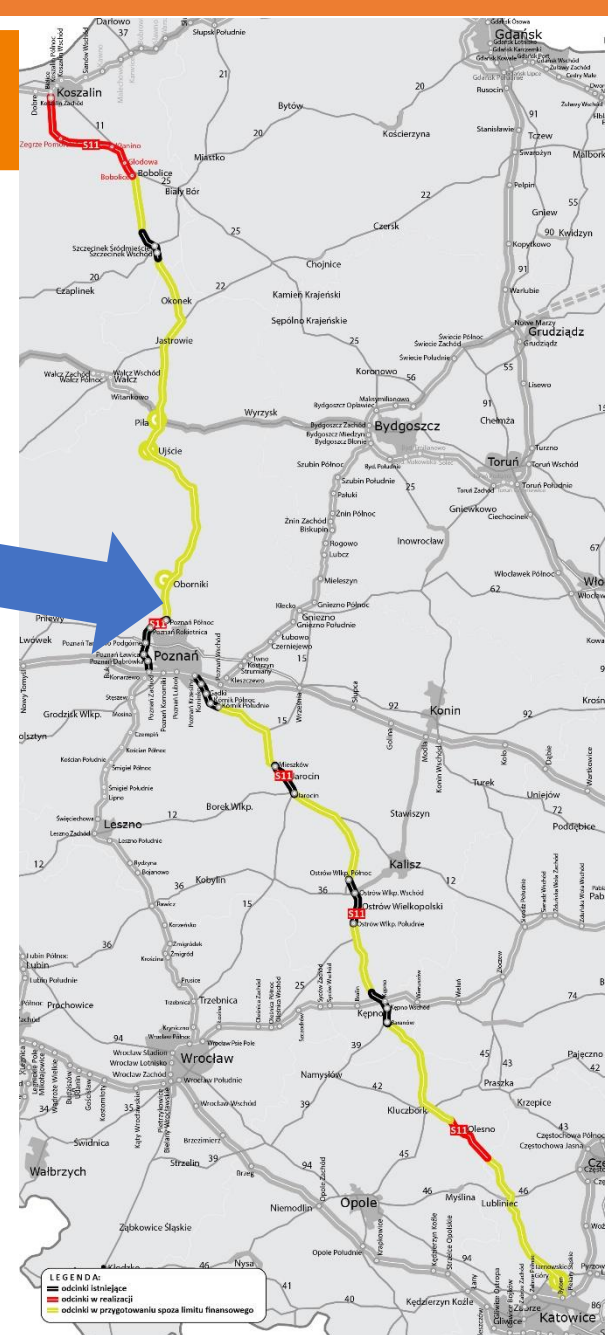

Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

Budowa drogi S11 na odcinku Kórnik - Jarocin

Długość 36 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu STEŚ

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - STEŚ:

Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R:

14.05.2020 r.


Planowana data złożenia wniosku o DŚU:

15.04.2022 r.

Planowana data uzyskania DŚU: **14.12.2022 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia na realizację:

30.04.2024 r.

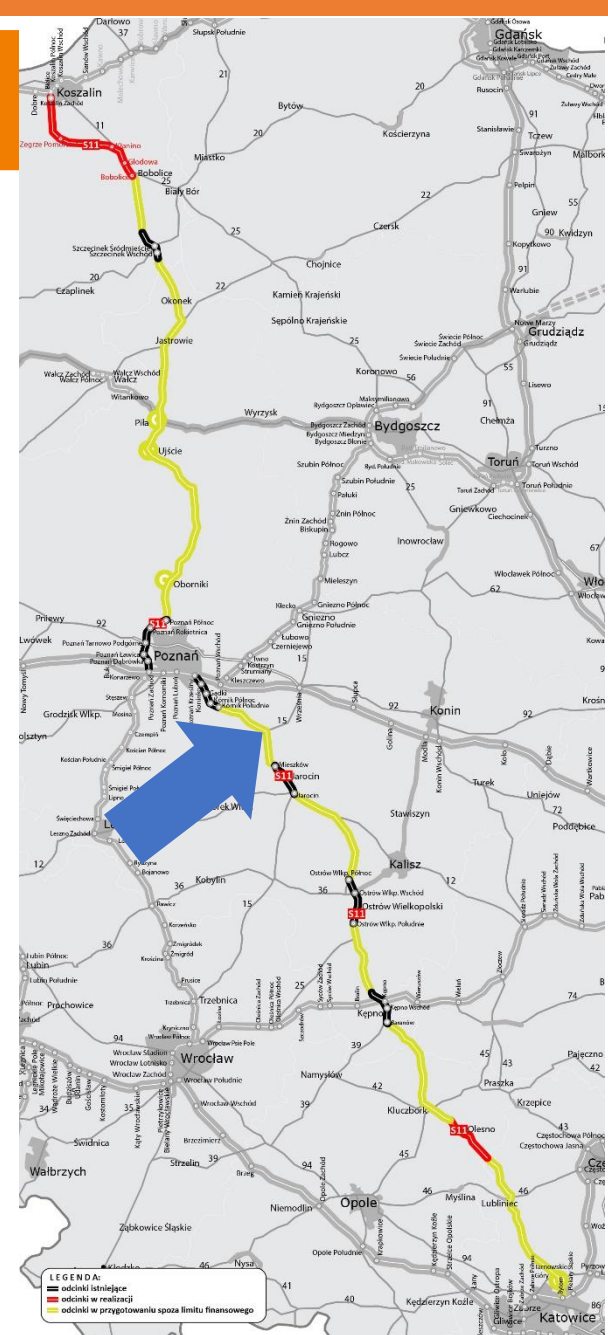

Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

Budowa drogi S11 na odcinku Jarocin - Ostrów Wlkp.

Długość 49 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu STEŚ

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - STEŚ:

Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R:

14.05.2020 r.


Planowana data złożenia wniosku o DŚU:

30.06.2022 r.

Planowana data uzyskania DŚU: **14.12.2022 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia na realizację:

30.04.2024 r.

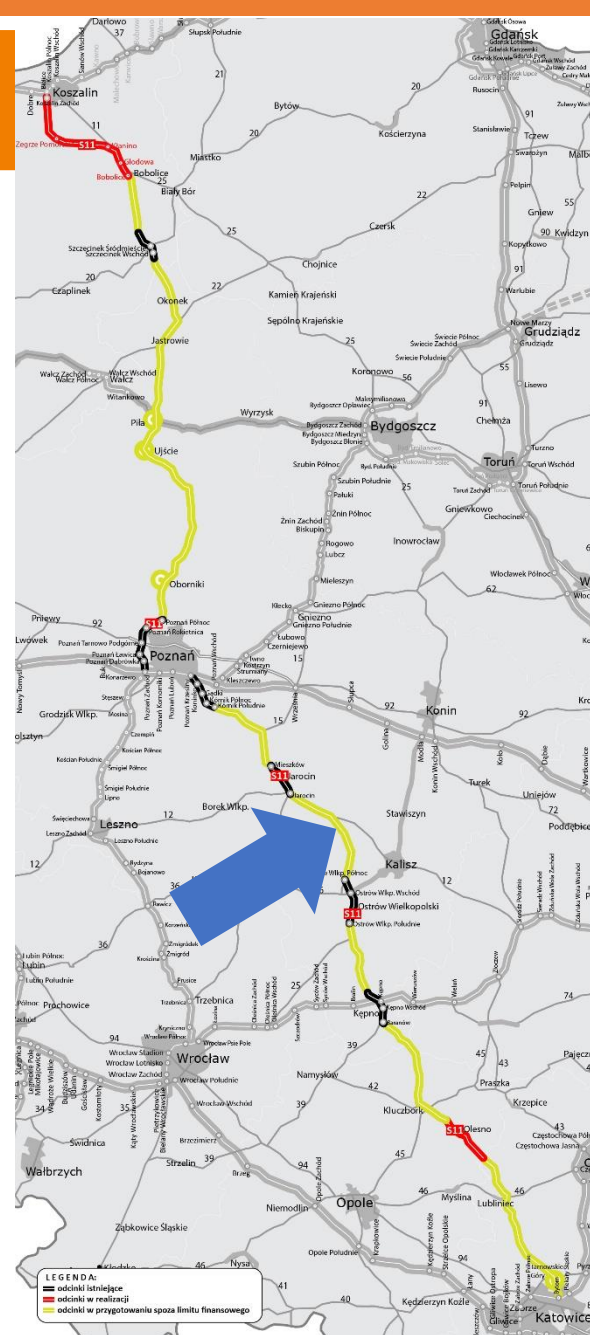

Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kępno

Długość 34,4 km

Etap realizacji: Przygotowanie – w
opracowaniu KP

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - KP: Trakt Sp. z o.o.

Data złożenia wniosku o wydanie DŚU:


31.05.2021 r.

Planowana data uzyskania DŚU: **28.02.2022 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania o

udzielenie zamówienia na realizację:

15.06.2023 r.

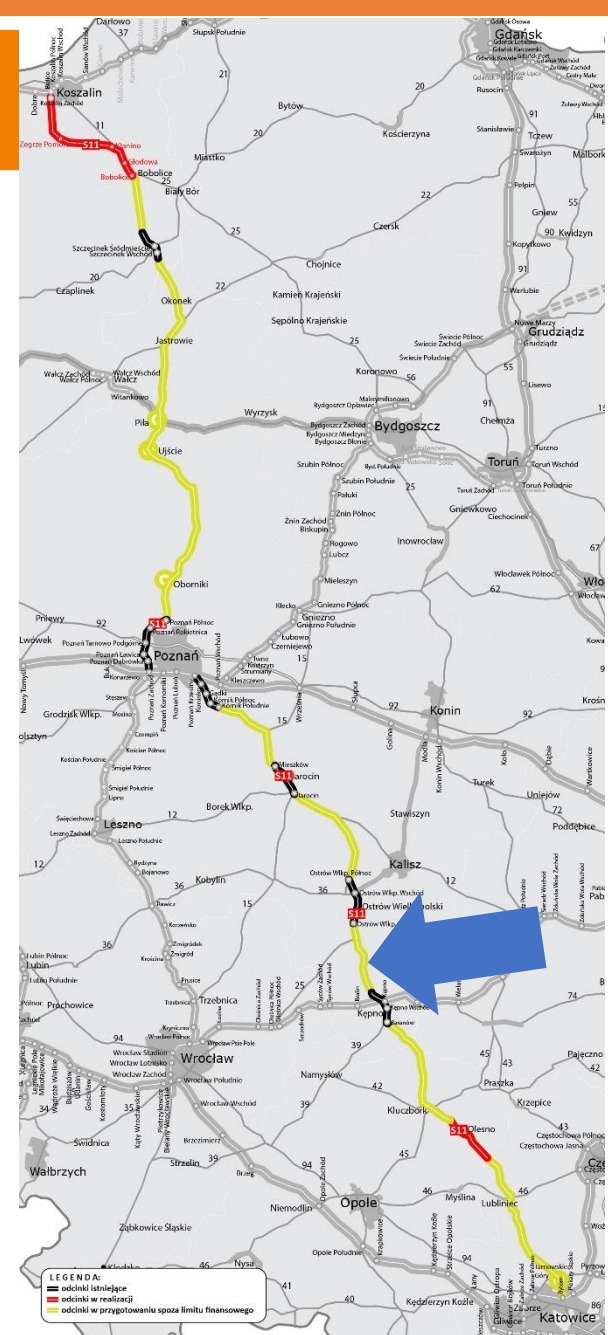

Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

Budowa drogi S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)

Długość 45,8 km

Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R

System realizacji: P&B


Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Trakt Sp. z o.o.

Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R:
01.03.2018 r. (obecnie procedowana jest KP)

Data wydania DŚU: **20.08.2021 r.**

Data przekazania odwołania od DŚU do GDOŚ:
17.09.2021 r. (oczekujemy na wydanie ostatecznej decyzji przez GDOŚ)

Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację:
30.07.2022 r.

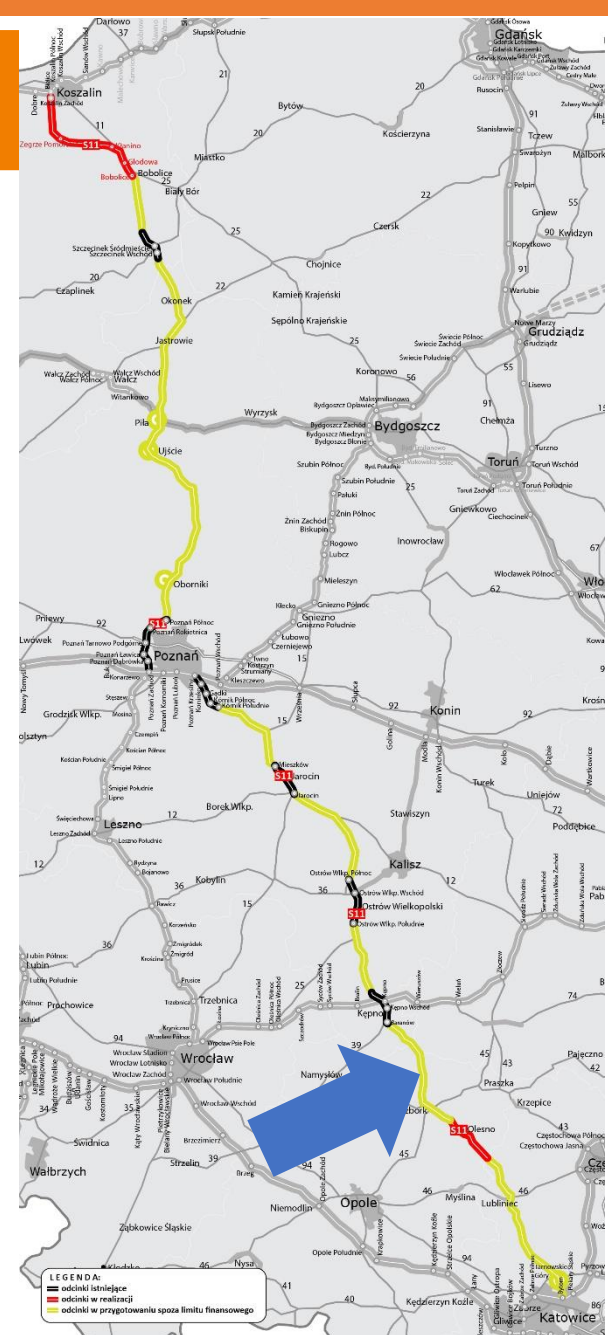

Droga ekspresowa S11 – odcinki w realizacji

**Zaprojektowanie i budowa
obwodnicy Olesna w ciągu S11**
System realizacji: **Projektuj i Buduj**
Długość odcinka: **24,8 km**

Wykonawca: **Mirbud S.A. / Kobylarnia S.A.**
ZKK: **542 839 319,96 zł netto**
(667 692 363,55 zł brutto)


Zaawansowanie rzeczowe: **22,0 %**

Data podpisania umowy: **20.05.2019 r.**

Wniosek o ZRID: **20.03.2020 r.**

Termin wydania decyzji ZRID: **18.12.2020 r.**

Planowana data zakończenia robót:
05.05.2023 r.

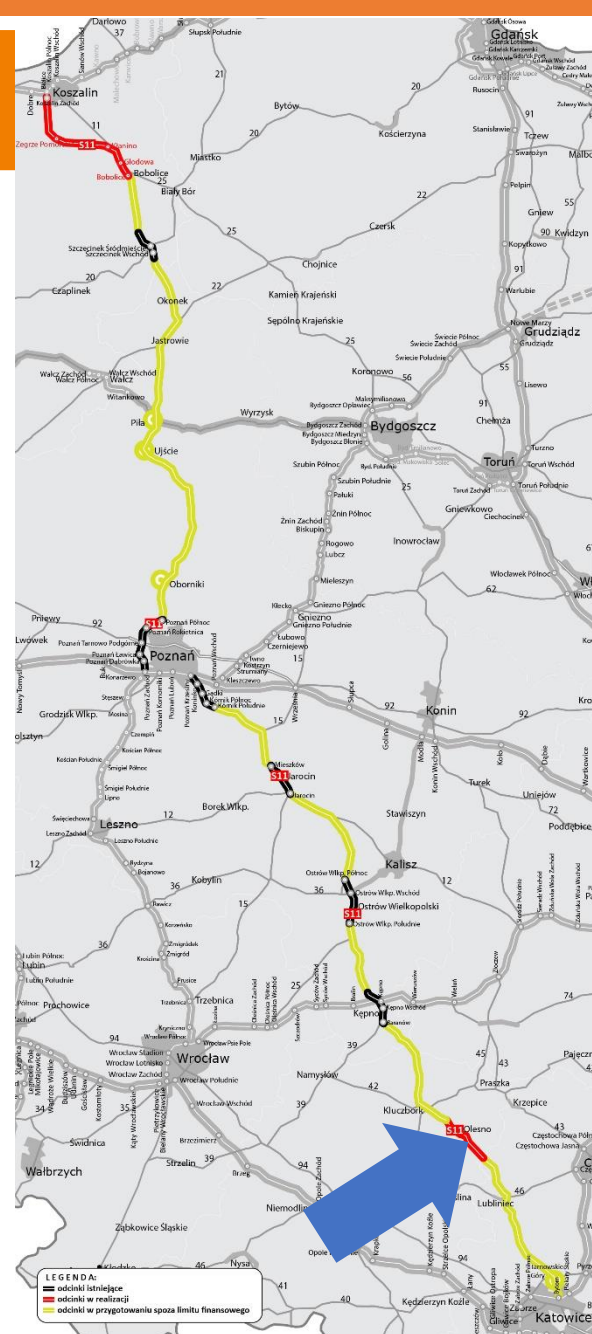

Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

**Budowa drogi S11 Kępno-A1 na odcinku
gr. woj. opolskiego - obw. Tarnowskich Gór
(z wyłączeniem obw. Tarnowskich Gór)**

Długość 28 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu STEŚ

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - STEŚ:


Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-
Konsultingowe

Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R:
09.10.2018 r.

Planowana data złożenia wniosku o wydanie
DŚU: **30.06.2022 r.**

Planowana data uzyskania DŚU: **31.05.2023 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia na realizację:
31.03.2025 r.

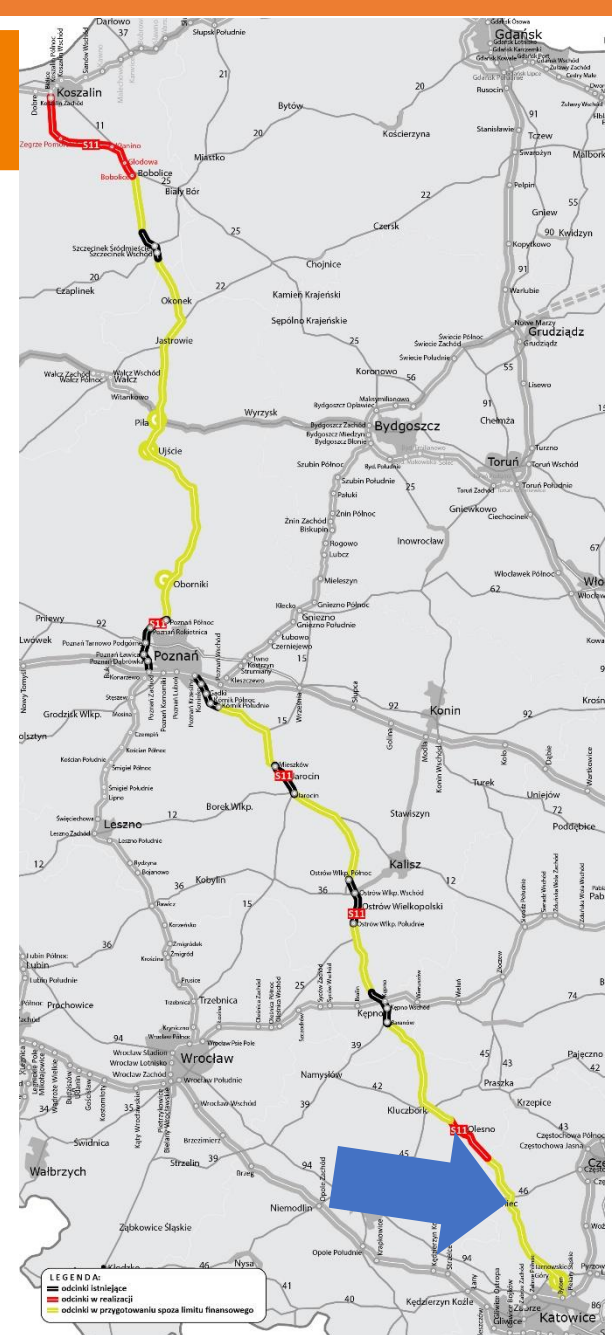

Droga ekspresowa S11 – odcinki w przygotowaniu

Budowa drogi S11 Kępno - A1

na odcinku obwodnica Tarnowskich Gór

Długość 37 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu STEŚ

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - STEŚ:

Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-
Konsultingowe

Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R:

09.10.2018 r.

Planowana data złożenia wniosku o wydanie


DŚU: **30.06.2022 r.**

Planowana data uzyskania DŚU: **31.05.2023 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia na realizację:

31.03.2025 r.

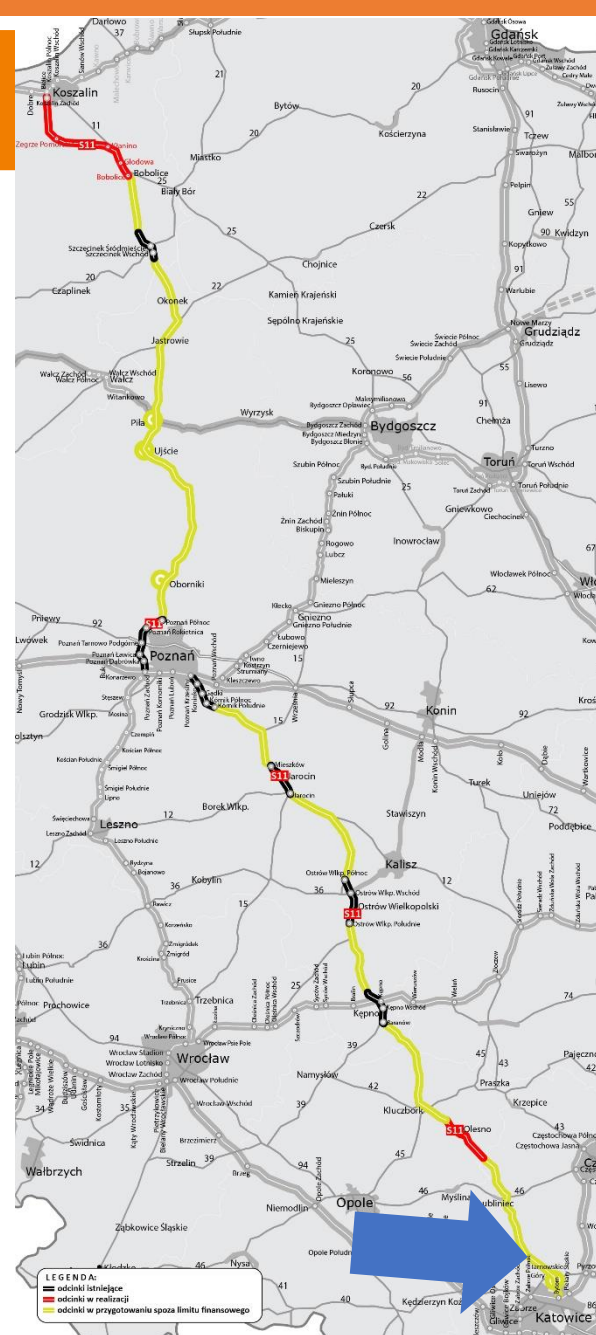



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
tel. 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

www.gddkia.gov.pl

www.facebook.com

www.twitter.com/gddkia



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
