


# **Podsumowanie realizacji 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka**

## 7. oś priorytetowa PO IG *Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji*

### **Cel główny:**

poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców



## ASPEKT FINANSOWY 7. OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

**Alokacja na oś: 940 758 085 EUR (3 940 515 816 PLN)**

### KONTRAKTACJA

Podpisano **39** umów o dofinansowanie.

Stan kontraktacji wynosi **3 820 367 646,06 PLN** (wkład publiczny), czyli **97 %** alokacji.

### CERTYFIKACJA

W poświadczeniach i deklaracjach wydatków od IP do IZ ujęto wydatki w wysokości **3 219 019 554 PLN** (stan na 19.02.2016 r.), co stanowi **82 %** alokacji.

**35 projektów zostało zakończonych** i obecnie trwa weryfikacja wniosków o płatność końcową.



## PROJEKTY NIEZAKOŃCZONE

### **Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)**

Wartość całkowita: **299,97 mln PLN**      Kwota dofinansowania: **236,20 mln PLN**  
w tym wydatki rozliczone: **224,41 mln PLN** oraz w trakcie weryfikacji **6,27 mln PLN**

Oszczędności: **5,51 mln PLN**

Wydatki do poniesienia: **32,59 mln PLN**

Termin zakończenia: **2016 r.**

### **pl.ID**

Wartość całkowita: **294,02 mln PLN**      Kwota dofinansowania: **236,47 mln PLN**  
w tym wydatki rozliczone: **162,20 mln PLN** oraz w trakcie weryfikacji **58,90 mln PLN**

Oszczędności: **15,37 mln PLN**

Wydatki do poniesienia: **trwa szacowanie ostatecznego budżetu**

Termin zakończenia: **2019 r.**




## PROJEKTY NIEZAKOŃCZONE

### **Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)**

Wartość całkowita: **712,64 mln PLN**      Kwota dofinansowania: **671,73 mln PLN**  
W tym wydatki rozliczone: **467,02 mln PLN** oraz w trakcie weryfikacji: **12,18 mln PLN**  
Oszczędności: **192,52 mln PLN**      Wydatki do poniesienia: **245,6 mln PLN**  
Termin zakończenia: **2020 r.** (planowane fazowanie projektu, II faza w ramach POPC)


### **Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej**

Wartość całkowita: **23,96 mln PLN**      Kwota dofinansowania: **5,37 mln PLN**  
w tym wydatki rozliczone: **4,89 mln PLN** oraz w trakcie weryfikacji **dofinansowanie z POIG rozliczone**  
Oszczędności: **475 587,42 PLN**      Wydatki do poniesienia: **18,58 mln PLN**  
Termin zakończenia: **2017 r.**

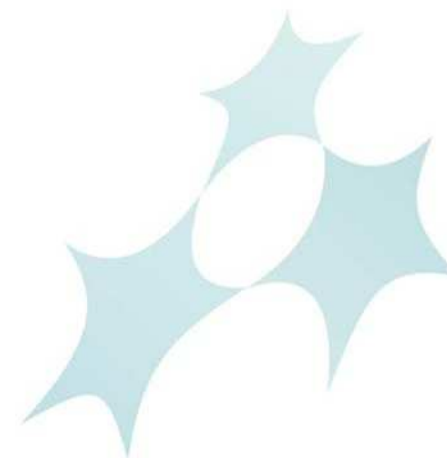


## Doświadczenia z perspektywy 2007-2013 – zdiagnozowane problemy

- brak kompleksowego i strategicznego podejścia do rozwoju elektronicznej administracji, co stwarzało ryzyko budowy silosowych, nie współpracujących ze sobą systemów, realizujących wąskie, wyspecjalizowane potrzeby poszczególnych instytucji i dublowania podejmowanych działań w ramach różnych projektów;
- niewystarczająca koordynacja między trzema źródłami finansowania projektów e-administracji, tj. POIG, POKL oraz regionalnych programów operacyjnych,
- brak szczegółowej analizy projektów pod względem komplementarności z innymi projektami informatycznymi wdrażanymi lub zrealizowanymi na poziomie centralnym i regionalnym;
- brak właściwej koordynacji realizacji projektów (w oparciu o jasno zdefiniowane etapy – kamienie milowe), co częściowo przyczyniło się do opóźnień we wdrażaniu poszczególnych usług;
- problemy z zapewnieniem finansowania utrzymania udostępnionych usług, skutkujące wstrzymywaniem realizacji projektu lub niewykorzystywaniem jego efektów;

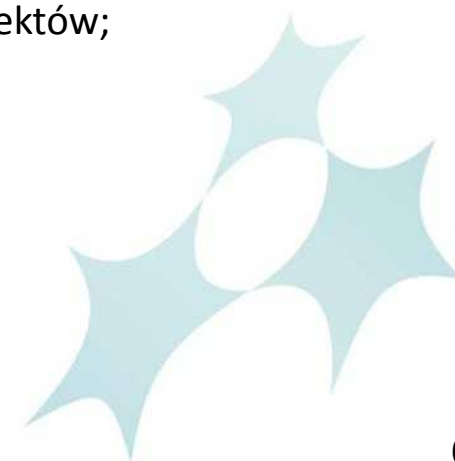


## Doświadczenia z perspektywy 2007-2013 – zdiagnozowane problemy

- opóźnienia w pracach legislacyjnych powodujące opóźnienia w realizacji projektów oraz brak możliwości wykorzystywania wdrożonych rozwiązań w praktyce;
- długotrwałe procedury zamówień publicznych;
- ograniczona zdolność instytucjonalna beneficjentów, przejawiająca się m.in.: długotrwałymi pracami przygotowawczymi na etapie dokumentacji projektowej, niewłaściwą identyfikacją potrzeb interesariuszy i właściciela procesu, powodującą budowę rozwiązań niefunkcjonalnych, problemami kadrowymi (fluktuacja, trudność w pozyskaniu i/lub finansowaniu odpowiednich kadr);
- kumulacja efektów rzeczowych oraz płatności w końcowych okresach realizacji projektów;
- niedostateczne wsparcie procesu prawidłowej realizacji projektów poprzez kontrole ex-ante zamówień udzielanych w ramach projektów.

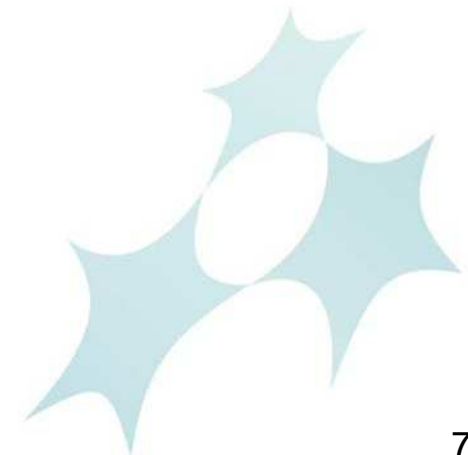

## Doświadczenia z perspektywy 2007-2013 – wdrożone rozwiązania

- koncentracja interwencji w zakresie krajowych e-usług publicznych w jednym krajowym programie - kompleksowe i strategiczne podejście do rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
- oparcie planu inwestycji na PZIP, co pozwoliło na odpowiednio wczesne zdefiniowanie projektów o priorytetowym charakterze;
- wzmocnienie roli KRMC w zakresie koordynacji oraz regularnego nadzoru nad realizacją projektów, planowane włączenie KRMC w ocenę strategiczną projektów informatycznych;
- objęcie projektów skoordynowanym wsparciem doradczym już na etapie przygotowania;
- planowane uruchomienie LSI monitoringowego oraz bazy wiedzy, która będzie udostępniona dla RPO;

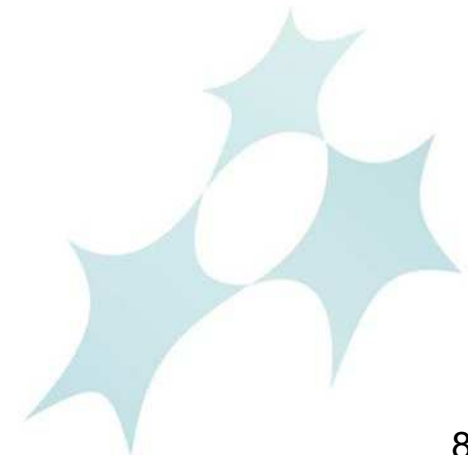



## Doświadczenia z perspektywy 2007-2013 – wdrożone rozwiązania

- zapewnienie mechanizmów współpracy w wyborze projektów między systemem realizacji POPC a instytucjami zarządzającymi RPO (powołanie przy Ministrze Cyfryzacji Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych);
- zapewnienie odpowiednich kryteriów wyboru projektów, odnoszących się m.in. do dokonania ex-ante analizy niezbędnych zmian prawnych oraz wykazania przez beneficjenta powiązań między wdrażanymi rozwiązaniami IT a usprawnieniem realizowanych procesów administracyjnych;
- zorientowanie na użytkowników i usługi o dużym stopniu dojrzałości;
- realizacja projektów o mniejszej wartości (poniżej 50 mln euro);
- zwiększony nacisk przy ocenie projektów na jakość dokonanej analizy kosztów i wymiernych korzyści płynących z wdrażanego rozwiązania,



## Doświadczenia z perspektywy 2007-2013 – wdrożone rozwiązania

- ograniczony czas realizacji projektów, a tym samym szybsze dostarczanie produktów i w konsekwencji spodziewanych efektów/korzyści;
- wprowadzenie zaleceń dotyczących realizacji projektów w podziale na etapy z wyznaczeniem kamieni milowych, które pozwolą na stopniową realizację projektu;
- wprowadzenie obowiązku szacowania kosztów funkcjonowania i utrzymania systemów, w tym również utrzymania zespołów utrzymujących systemy, już na etapie przygotowania projektu;
- racjonalizacja wydatków m.in. poprzez minimalizację środków przeznaczonych na budowę infrastruktury;
- duży nacisk na badanie komplementarności i interoperacyjności z innymi produktami/systemami,
- duży nacisk na digitalizację i zapewnienie otwartości danych/zasobów publicznych.





**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Ministerstwo  
Cyfryzacji

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



# **DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**

**EWA GRANIEWSKA**

Dyrektor

Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich

Ministerstwo Cyfryzacji

tel. +48 22 245 54 50

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa
