


































































Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
1			<b>Projekt wdrożenia platformy internetowej do składania wniosków on-line w urzędzie</b>	<b>484,95 dn</b>	<b>śro, 15.07.20</b>	<b>wto, 24.05.22</b>	
2			<b>Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia (zakres projektu: stworzenie i wdrożenie platformy internetowej do składania wniosków on-line)</b>	<b>64 dn</b>	<b>śro, 15.07.20</b>	<b>pon, 12.10.20</b>	
3			<b>Analiza biznesowa (przygotowanie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных, w tym wymiarowanie i ustalenie wymagań wydajnościowych)</b>	<b>15 dn</b>	<b>śro, 15.07.20</b>	<b>wto, 04.08.20</b>	
4			<b>Warsztaty</b>	<b>15 dn</b>	<b>śro, 15.07.20</b>	<b>wto, 04.08.20</b>	
5			<b>I warsztat z przedstawicielami użytkowników końcowych i urzędnikami obsługującymi wnioski</b>	<b>5 dn</b>	<b>śro, 15.07.20</b>	<b>wto, 21.07.20</b>	
6			I warsztat z przedstawicielami użytkowników końcowych i urzędnikami obsługującymi wnioski	3 dn	śro, 15.07.20	pią, 17.07.20	
7			Utworzenie pierwszej wersji dokumentu analizy biznesowej po warsztatach (v0.1)	2 dn	pon, 20.07.20	wto, 21.07.20	6
8			<b>II warsztat z przedstawicielami użytkowników końcowych i urzędnikami obsługującymi wnioski</b>	<b>5 dn</b>	<b>śro, 22.07.20</b>	<b>wto, 28.07.20</b>	
9			II warsztat z przedstawicielami użytkowników końcowych i urzędnikami obsługującymi wnioski	3 dn	śro, 22.07.20	pią, 24.07.20	7
10			Utworzenie drugiej wersji dokumentu analizy biznesowej po warsztatach (v0.2)	2 dn	pon, 27.07.20	wto, 28.07.20	9



















Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
11			<b>III warsztat z przedstawicielami użytkowników końcowych i urzędnikami obsługującymi wnioski</b>	5 dn	śro, 29.07.20	wto, 04.08.20	
12			III warsztat z przedstawicielami użytkowników końcowych i urzędnikami obsługującymi wnioski	3 dn	śro, 29.07.20	pią, 31.07.20	10
13			Utworzenie trzeciej wersji dokumentu analizy biznesowej po warsztatach (v0.3)	2 dn	pon, 03.08.20	wto, 04.08.20	12
14			Weryfikacja wyniku warsztatów z zakresem projektu zawartym w dokumentach SW i WoD	1 dzień	śro, 05.08.20	śro, 05.08.20	13
15			Utworzenie finalnej wersji dokumentu analizy biznesowej (v1.0)	2 dn	czw, 06.08.20	pią, 07.08.20	14
16			KM: Akceptacja dokumentu analizy biznesowej przez właściciela biznesowego projektu	3 dn	pon, 10.08.20	śro, 12.08.20	15
17			<b>Przygotowanie dokumentacji przetargowej</b>	42 dn	czw, 13.08.20	pią, 09.10.20	
18			Przeniesienie wyżej wypracowanych wymagań funkcjonalnych i нефункциональных na dokument OPZ	10 dn	czw, 13.08.20	śro, 26.08.20	16
19			Przeniesienie wyżej wypracowanych wymagań funkcjonalnych i нефункциональных na dokument SIWZ	10 dn	czw, 27.08.20	śro, 09.09.20	18
20			<b>I iteracja uwag do dokumentów OPZ i SIWZ od właściciela biznesowego i zakładu zamówień publicznych</b>	10 dn	czw, 10.09.20	śro, 23.09.20	
21			I iteracja uwag do dokumentów OPZ i SIWZ od właściciela biznesowego i zakładu zamówień publicznych	5 dn	czw, 10.09.20	śro, 16.09.20	19
22			Naniesienie poprawek na dokumenty OPZ i SIWZ (I iteracja)	5 dn	czw, 17.09.20	śro, 23.09.20	21

















Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20




















Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			


















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
23			<b>II iteracja uwag do dokumentów OPZ i SIWZ od właściciela biznesowego i zakładu zamówień publicznych</b>	<b>10 dn</b>	<b>czw, 24.09.20</b>	<b>śro, 07.10.20</b>	
24			II iteracja uwag do dokumentów OPZ i SIWZ od właściciela biznesowego i zakładu zamówień publicznych	5 dn	czw, 24.09.20	śro, 30.09.20	22
25			Naniesienie poprawek na dokumenty OPZ i SIWZ (II iteracja)	5 dn	czw, 01.10.20	śro, 07.10.20	24
26			KM: Akceptacja dokumentów OPZ i SIWZ przez właściciela biznesowego	2 dn	czw, 08.10.20	pią, 09.10.20	25
27			Przekazanie dokumentacji przetargowej do zakładu zamówień publicznych	1 dzień	pon, 12.10.20	pon, 12.10.20	26
28			<b>Przeprowadzenie zamówienia (postępowania)</b>	<b>63 dn</b>	<b>wto, 13.10.20</b>	<b>czw, 07.01.21</b>	
29			Ogłoszenie przetagów na stronie BIP urzędu	2 dn	wto, 13.10.20	śro, 14.10.20	27
30			<b>Bufor na ew. odwołania w KIO i zmiany w dokumentacji po zapytaniach od potencjalnych wykonawców</b>	<b>20 dn</b>	<b>czw, 15.10.20</b>	<b>śro, 11.11.20</b>	<b>29</b>
31			Wyłonienie wykonawcy	40 dn	czw, 12.11.20	śro, 06.01.21	30
32			KM: Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą	1 dzień	czw, 07.01.21	czw, 07.01.21	31
33			<b>Odbiór dokumentacji dot. przeprowadzenia testów</b>	<b>48 dn</b>	<b>pią, 08.01.21</b>	<b>wto, 16.03.21</b>	
34			<b>Wykonanie dokumentu planu przeprowadzenia testów</b>	<b>18 dn</b>	<b>pią, 08.01.21</b>	<b>wto, 02.02.21</b>	
35			<b>I iteracja uwag</b>	<b>8 dn</b>	<b>pią, 08.01.21</b>	<b>wto, 19.01.21</b>	
36			Wykonanie pierwszej wersji dokumentu planu przeprowadzenia testów	5 dn	pią, 08.01.21	czw, 14.01.21	32

Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20




















Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			


















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
37			Zapoznanie się i zgłoszenie uwag do dokumentu planu przeprowadzenia testów	3 dn	pią, 15.01.21	wto, 19.01.21	36
38			<b>II iteracja uwag</b>	<b>5 dn</b>	<b>śro, 20.01.21</b>	<b>wto, 26.01.21</b>	
39			Wykonanie kolejnej wersji dokumentu planu przeprowadzenia testów	3 dn	śro, 20.01.21	pią, 22.01.21	37
40			Zapoznanie się i zgłoszenie ostatecznych uwag do dokumentu planu przeprowadzenia testów	2 dn	pon, 25.01.21	wto, 26.01.21	39
41			Stworzenie finalnej wersji dokumentu planu przeprowadzenia testów	1 dzień	śro, 27.01.21	śro, 27.01.21	40
42			Ostateczna weryfikacja dokumentu planu przeprowadzenia testów	3 dn	czw, 28.01.21	pon, 01.02.21	41
43			KM: Formalny odbiór dokumentu planu przeprowadzenia testów	1 dzień	wto, 02.02.21	wto, 02.02.21	42
44			<b>Wykonanie dokumentu scenariuszy testowych</b>	<b>30 dn</b>	<b>śro, 03.02.21</b>	<b>wto, 16.03.21</b>	
45			<b>Wykonanie scenariuszy testowych do testów jednostkowych / funkcjonalnych</b>	<b>16 dn</b>	<b>śro, 03.02.21</b>	<b>śro, 24.02.21</b>	
46			<b>I iteracja</b>	<b>8 dn</b>	<b>śro, 03.02.21</b>	<b>pią, 12.02.21</b>	
47			Wykonanie pierwszej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów jednostkowych	5 dn	śro, 03.02.21	wto, 09.02.21	43

Projekt: Projekt1 Data: pię, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
48			Weryfikacja dokumentu scenariuszy testowych do testów jednostkowych z dokumentem analizy biznesowej (pokrycie testami wszystkich procesów opisanych w dokumencie analizy biznesowej)	1 dzień	śro, 10.02.21	śro, 10.02.21	47
49			Weryfikacja dokumentu scenariuszy testowych do testów jednostkowych	2 dn	czw, 11.02.21	pią, 12.02.21	48
50			<b>II iteracja</b>	<b>4 dn</b>	<b>pon, 15.02.21</b>	<b>czw, 18.02.21</b>	
51			Wykonanie kolejnej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów jednostkowych	3 dn	pon, 15.02.21	śro, 17.02.21	49
52			Weryfikacja dokumentu scenariuszy testowych do testów jednostkowych	1 dzień	czw, 18.02.21	czw, 18.02.21	51
53			Wykonanie ostatecznej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów jednostkowych	1 dzień	pią, 19.02.21	pią, 19.02.21	52
54			Weryfikacja ostatecznej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów jednostkowych	2 dn	pon, 22.02.21	wto, 23.02.21	53
55			KM: akceptacja ostatecznej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów jednostkowych / funkcjonalnych	1 dzień	śro, 24.02.21	śro, 24.02.21	54
56			<b>Wykonanie scenariuszy testowych do testów integracyjnych</b>	<b>18 dn</b>	<b>śro, 03.02.21</b>	<b>pią, 26.02.21</b>	
57			<b>I iteracja</b>	<b>10 dn</b>	<b>śro, 03.02.21</b>	<b>wto, 16.02.21</b>	
58			Wykonanie pierwszej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów integracyjnych	5 dn	śro, 03.02.21	wto, 09.02.21	47RR

















Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
59			Weryfikacja proponowanego zakresu testów integracyjnych	2 dn	śro, 10.02.21	czw, 11.02.21	58
60			Zgłoszenie uwag do dokumentu scenariuszy testowych do przeprowadzenia testów integracyjnych	3 dn	pią, 12.02.21	wto, 16.02.21	59
61			<b>II iteracja</b>	<b>5 dn</b>	<b>śro, 17.02.21</b>	<b>wto, 23.02.21</b>	
62			Wykonanie kolejnej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów integracyjnych	3 dn	śro, 17.02.21	pią, 19.02.21	60
63			Zgłoszenie kolejnych uwag do dokumentu scenariuszy testowych do przeprowadzenia testów integracyjnych	2 dn	pon, 22.02.21	wto, 23.02.21	62
64			Wykonanie ostatecznej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów integracyjnych	1 dzień	śro, 24.02.21	śro, 24.02.21	63
65			Weryfikacja ostatecznej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów integracyjnych	1 dzień	czw, 25.02.21	czw, 25.02.21	64
66			KM: akceptacja ostatecznej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów integracyjnych	1 dzień	pią, 26.02.21	pią, 26.02.21	65
67			<b>Wykonanie scenariuszy testowych do testów wydajnościowych, bezpieczeństwa / automatycznych wraz z wykonaniem skryptów</b>	<b>8 dn</b>	<b>pon, 01.03.21</b>	<b>śro, 10.03.21</b>	
68			<b>I iteracja</b>	<b>5 dn</b>	<b>pon, 01.03.21</b>	<b>pią, 05.03.21</b>	
















Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
69			Przygotowanie pierwszej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów wydajnościowych, bezpieczeństwa wraz ze skryptami	3 dn	pon, 01.03.21	śro, 03.03.21	66
70			Zgłoszenie uwag do pierwszej wersji dokumentu i weryfikacja skryptów	2 dn	czw, 04.03.21	pią, 05.03.21	69
71			<b>II iteracja</b>	<b>3 dn</b>	<b>pon, 08.03.21</b>	<b>śro, 10.03.21</b>	
72			Przygotowanie kolejnej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów wydajnościowych, bezpieczeństwa wraz ze skryptami	2 dn	pon, 08.03.21	wto, 09.03.21	70
73			Zgłoszenie uwag do kolejnej wersji dokumentu i ponowna weryfikacja skryptów	1 dzień	śro, 10.03.21	śro, 10.03.21	72
74			Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów wydajnościowych, bezpieczeństwa wraz ze skryptami	1 dzień	czw, 11.03.21	czw, 11.03.21	73
75			Weryfikacja ostatecznej wersji dokumentu scenariuszy testowych do testów wydajnościowych, bezpieczeństwa wraz ze skryptami	1 dzień	pią, 12.03.21	pią, 12.03.21	74
76			Przekazanie skryptów do repozytorium gitlab	0,5 dn	pon, 15.03.21	pon, 15.03.21	75
77			Weryfikacja przekazania skryptów do repozytorium gitlab	0,5 dn	pon, 15.03.21	pon, 15.03.21	76
78			KM: akceptacja scenariuszy testowych do testów wydajnościowych, bezpieczeństwa wraz z odbiorem skryptów	1 dzień	wto, 16.03.21	wto, 16.03.21	77

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
79			<b>Odbiór dokumentacji technicznej</b>	<b>154 dn</b>	<b>czw, 13.08.20</b>	<b>wto, 16.03.21</b>	
80			<b>Odbiór analizy wykonalności platformy</b>	<b>20 dn</b>	<b>czw, 13.08.20</b>	<b>śro, 09.09.20</b>	
81			<b>I iteracja</b>	<b>7 dn</b>	<b>czw, 13.08.20</b>	<b>pią, 21.08.20</b>	
82			Stworzenie pierwszej wersji dokumentu analizy wykonalności	5 dn	czw, 13.08.20	śro, 19.08.20	16
83			Weryfikacja pierwszej wersji dokumentu analizy wykonalności	2 dn	czw, 20.08.20	pią, 21.08.20	82
84			<b>II iteracja</b>	<b>3 dn</b>	<b>pon, 24.08.20</b>	<b>śro, 26.08.20</b>	
85			Stworzenie kolejnej wersji dokumentu analizy wykonalności	2 dn	pon, 24.08.20	wto, 25.08.20	83
86			Weryfikacja kolejnej wersji dokumentu analizy wykonalności	1 dzień	śro, 26.08.20	śro, 26.08.20	85
87			<b>III iteracja</b>	<b>2 dn</b>	<b>czw, 27.08.20</b>	<b>pią, 28.08.20</b>	
88			Stworzenie finalnej wersji dokumentu analizy wykonalności	1 dzień	czw, 27.08.20	czw, 27.08.20	86
89			Weryfikacja finalnej wersji dokumentu analizy wykonalności	1 dzień	pią, 28.08.20	pią, 28.08.20	88
90			Warsztat wewnętrzny w celu zebrania ostatecznych uwag do dokumentu analizy wykonalności od szerszego grona	1 dzień	pon, 07.09.20	pon, 07.09.20	89ZR+5 dn
91			Aktualizacja dokumentu analizy wykonalności	1 dzień	wto, 08.09.20	wto, 08.09.20	90
92			KM: odbiór / ostateczna akceptacja dokumentu analizy wykonalności	1 dzień	śro, 09.09.20	śro, 09.09.20	91

Projekt: Projekt1

Data: pię, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu


Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne


Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania
























Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem


Zadania zewnętrzne


Zewnętrzne punkty kontrolne


Termin ostateczny


Postęp


Ręczne (postęp)























































































Strona 8






















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
93			<b>Odbiór projektu technicznego platformy</b>	<b>48 dn</b>	<b>pią, 08.01.21</b>	<b>wto, 16.03.21</b>	
94			<b>Projektowanie prototypu zgodnie z dobrymi praktykami UX</b>	<b>48 dn</b>	<b>pią, 08.01.21</b>	<b>wto, 16.03.21</b>	
95			<b>I iteracja (warsztaty z interesariuszami)</b>	<b>28 dn</b>	<b>pią, 08.01.21</b>	<b>wto, 16.02.21</b>	
96			Przygotowanie pierwszej wersji platformy (interaktywne makiety / atrapy ekranów / GUI)	25 dn	pią, 08.01.21	czw, 11.02.21	32
97			Warsztaty w celu zebrania pierwszych uwag do makiet interaktywnych platformy	3 dn	pią, 12.02.21	wto, 16.02.21	96
98			<b>II iteracja (warsztaty z interesariuszami)</b>	<b>13 dn</b>	<b>śro, 17.02.21</b>	<b>pią, 05.03.21</b>	
99			Przygotowanie kolejnej wersji platformy (interaktywne makiety / atrapy ekranów / GUI)	10 dn	śro, 17.02.21	wto, 02.03.21	97
100			Warsztaty w celu zebrania kolejnych uwag do makiet interaktywnych platformy	3 dn	śro, 03.03.21	pią, 05.03.21	99
101			<b>III iteracja (warsztaty z interesariuszami)</b>	<b>7 dn</b>	<b>pon, 08.03.21</b>	<b>wto, 16.03.21</b>	
102			Przygotowanie finalnej wersji platformy (interaktywne makiety / atrapy ekranów / GUI)	5 dn	pon, 08.03.21	pią, 12.03.21	100
103			Warsztaty w celu zebrania finalnych uwag do makiet interaktywnych platformy	2 dn	pon, 15.03.21	wto, 16.03.21	102
104			<b>Wytworzenie dokumentu projektu technicznego</b>	<b>29 dn</b>	<b>pią, 08.01.21</b>	<b>śro, 17.02.21</b>	
105			<b>I iteracja</b>	<b>18 dn</b>	<b>pią, 08.01.21</b>	<b>wto, 02.02.21</b>	
106			Wykonanie pierwszej wersji dokumentu projektu technicznego	15 dn	pią, 08.01.21	czw, 28.01.21	32;92














Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
107			Weryfikacja dokumentu projektu technicznego	3 dn	pią, 29.01.21	wto, 02.02.21	106
108			<b>II iteracja</b>	<b>7 dn</b>	<b>śro, 03.02.21</b>	<b>czw, 11.02.21</b>	
109			Wykonanie kolejnej wersji dokumentu projektu technicznego	5 dn	śro, 03.02.21	wto, 09.02.21	107
110			Weryfikacja dokumentu projektu technicznego	2 dn	śro, 10.02.21	czw, 11.02.21	109
111			<b>III iteracja</b>	<b>4 dn</b>	<b>pią, 12.02.21</b>	<b>śro, 17.02.21</b>	
112			Wykonanie finalnej wersji dokumentu projektu technicznego	3 dn	pią, 12.02.21	wto, 16.02.21	110
113			Weryfikacja dokumentu projektu technicznego	1 dzień	śro, 17.02.21	śro, 17.02.21	112
114			Prezentacja dokumentu projektu technicznego szerszemu gronu	1 dzień	pią, 05.03.21	pią, 05.03.21	113ZR+11 dn
115			Ostateczne poprawki dokumentu	2 dn	pon, 08.03.21	wto, 09.03.21	114
116			KM: akceptacja ostatecznej wersji dokumentu projektu technicznego	1 dzień	śro, 10.03.21	śro, 10.03.21	115
117			<b>Przygotowanie środowisk IT w urzędzie</b>	<b>54,47 dn</b>	<b>pią, 29.01.21</b>	<b>czw, 15.04.21</b>	
118			Dostawa sprzętu (serwery i sprzęt sieciowy)	5 dn	pią, 29.01.21	czw, 04.02.21	32ZR+15 dn
119			Konfiguracja sprzętu	5 dn	pią, 05.02.21	czw, 11.02.21	118
120			KM: formalny odbiór sprzętu w urzędzie	1 dzień	pią, 12.02.21	pią, 12.02.21	119
121			<b>Developerskie</b>	<b>8,49 dn</b>	<b>czw, 11.03.21</b>	<b>wto, 23.03.21</b>	
122			Konfiguracja maszyn wirtualnych na serwerach	2 dn	czw, 11.03.21	pią, 12.03.21	116



















Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
123			Instalacja systemów operacyjnych	2 dn	pon, 15.03.21	wto, 16.03.21	122
124			Instalacja baz danych	1 dzień	śro, 17.03.21	śro, 17.03.21	123
125			<b>Konfiguracja środowiska developerskiego</b>	<b>3,49 dn</b>	<b>czw, 18.03.21</b>	<b>wto, 23.03.21</b>	
126			Otwarcie portów w firewall-ach	1 dzień	czw, 18.03.21	czw, 18.03.21	124
127			Konfiguracja urządzeń sieciowych	1 dzień	pią, 19.03.21	pią, 19.03.21	126
128			Rejestracja domeny	0,33 dn	pon, 22.03.21	pon, 22.03.21	127
129			Instalacja certyfikatu HTTPS	0,33 dn	pon, 22.03.21	pon, 22.03.21	128
130			Integracja z MS AD	0,33 dn	pon, 22.03.21	pon, 22.03.21	129
131			Konfiguracja IIS (serwera WWW MS)	0,5 dn	pon, 22.03.21	wto, 23.03.21	130
132			KM: środowisko developerskie w urzędzie utworzone i skonfigurowane	0 dn	wto, 23.03.21	wto, 23.03.21	131
133			<b>Testowe / integracyjne</b>	<b>8,49 dn</b>	<b>wto, 23.03.21</b>	<b>pią, 02.04.21</b>	
134			Konfiguracja maszyn wirtualnych na serwerach	2 dn	wto, 23.03.21	czw, 25.03.21	132
135			Instalacja systemów operacyjnych	2 dn	czw, 25.03.21	pon, 29.03.21	134
136			Instalacja baz danych	1 dzień	pon, 29.03.21	wto, 30.03.21	135
137			<b>Konfiguracja środowiska testowego / integracyjnego</b>	<b>3,49 dn</b>	<b>wto, 30.03.21</b>	<b>pią, 02.04.21</b>	
138			Otwarcie portów w firewall-ach	1 dzień	wto, 30.03.21	śro, 31.03.21	136
139			Konfiguracja urządzeń sieciowych	1 dzień	śro, 31.03.21	czw, 01.04.21	138
140			Rejestracja domeny	0,33 dn	czw, 01.04.21	czw, 01.04.21	139














Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
141			Instalacja certyfikatu HTTPS	0,33 dn	czw, 01.04.21	pią, 02.04.21	140
142			Integracja z MS AD	0,33 dn	pią, 02.04.21	pią, 02.04.21	141
143			Konfiguracja IIS (serwera WWW MS)	0,5 dn	pią, 02.04.21	pią, 02.04.21	142
144			KM: środowisko testowe / integracyjne w urzędzie utworzone i skonfigurowane	0 dn	pią, 02.04.21	pią, 02.04.21	143
145			<b>Produkcyjne</b>	<b>8,49 dn</b>	<b>pią, 02.04.21</b>	<b>czw, 15.04.21</b>	
146			Konfiguracja maszyn wirtualnych na serwerach	2 dn	pią, 02.04.21	wto, 06.04.21	144
147			Instalacja systemów operacyjnych	2 dn	wto, 06.04.21	czw, 08.04.21	146
148			Instalacja baz danych	1 dzień	czw, 08.04.21	pią, 09.04.21	147
149			<b>Konfiguracja środowiska produkcyjnego</b>	<b>3,49 dn</b>	<b>pią, 09.04.21</b>	<b>czw, 15.04.21</b>	
150			Otwarcie portów w firewall-ach	1 dzień	pią, 09.04.21	pon, 12.04.21	148
151			Konfiguracja urządzeń sieciowych	1 dzień	pon, 12.04.21	wto, 13.04.21	150
152			Rejestracja domeny	0,33 dn	wto, 13.04.21	śro, 14.04.21	151
153			Instalacja certyfikatu HTTPS	0,33 dn	śro, 14.04.21	śro, 14.04.21	152
154			Integracja z MS AD	0,33 dn	śro, 14.04.21	śro, 14.04.21	153
155			Konfiguracja IIS (serwera WWW MS)	0,5 dn	śro, 14.04.21	czw, 15.04.21	154
156			KM: środowisko produkcyjne w urzędzie utworzone i skonfigurowane	0 dn	czw, 15.04.21	czw, 15.04.21	155
157			<b>Zmiany projektowe (obsługa wniosków o zmianę - bez konieczności procesowania w CPPC)</b>	<b>31,48 dn</b>	<b>czw, 15.04.21</b>	<b>pią, 28.05.21</b>	

Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki	
158			<b>Zaakceptowane przez komitet sterujący</b>	<b>18,98 dn</b>	<b>czw, 15.04.21</b>	<b>śro, 12.05.21</b>		
159			<b>Podniesienie stosu technologicznego platformy (niwelacja długu technologicznego urzędu)</b>	<b>18,98 dn</b>	<b>czw, 15.04.21</b>	<b>śro, 12.05.21</b>		
160			<b>Podniesienie wersji serwera IIS (serwera WWW MS)</b>	<b>18,98 dn</b>	<b>czw, 15.04.21</b>	<b>śro, 12.05.21</b>		
161			Analiza wpływu na inne funkcjonujące w urzędzie systemy produkcyjne	2 dn	czw, 15.04.21	pon, 19.04.21	156	
162			Analiza możliwości wykonania ew. przyszłych integracji z innymi istniejącymi systemami produkcyjnymi w urzędzie	1 dzień	pon, 19.04.21	wto, 20.04.21	161	
163			Analiza zgodności licencyjnej i ew. wzrostu kosztów	1 dzień	wto, 20.04.21	śro, 21.04.21	162	
164			Ostateczna weryfikacja techniczna wpływu zmiany na zakres projektu i ew. przyszłą możliwość rozwoju czy też integracji wewnętrznych	1 dzień	śro, 21.04.21	czw, 22.04.21	163	
165			Uzyskano wewnętrzną pozytywną rekomendację realizacji zmiany	0,33 dn	czw, 22.04.21	czw, 22.04.21	164	
166			Akceptacja zmiany na komitecie sterującym	0,33 dn	czw, 29.04.21	pią, 30.04.21	165ZR+5 dn	
167			<b>Realizacja zaakceptowanej zmiany technicznej</b>	<b>8,32 dn</b>	<b>pią, 30.04.21</b>	<b>śro, 12.05.21</b>		
168			Ustalenie okienka serwisowego (ustalenie bezpiecznego terminu realizacji aktualizacji)	0,33 dn	pią, 30.04.21	pią, 30.04.21	166	

Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne















Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny




















Postęp













Ręczne (postęp)

Strona 13




















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
169			Aktualizacja na środowisku developerskim (godziny nocne)	0,33 dn	wto, 11.05.21	wto, 11.05.21	168ZR+7 dn
170			Aktualizacja na środowisku testowym / integracyjnym (godziny nocne)	0,33 dn	wto, 11.05.21	śro, 12.05.21	169
171			Aktualizacja na środowisku produkcyjnym (godziny nocne)	0,33 dn	śro, 12.05.21	śro, 12.05.21	170
172			Smoke testy (szybkie testy funkcjonalne po wdrożeniu aktualizacji, godziny nocne)	0,5 dn	wto, 11.05.21	śro, 12.05.21	169
173			<b>Odrzucone przez komitet sterujący</b>	<b>12,66 dn</b>	<b>śro, 12.05.21</b>	<b>pią, 28.05.21</b>	
174			<b>Podniesienie stosu technologicznego platformy (niwelacja długu technologicznego urzędu)</b>	<b>12,66 dn</b>	<b>śro, 12.05.21</b>	<b>pią, 28.05.21</b>	
175			<b>Podniesienie wersji silnika baz danych</b>	<b>9,33 dn</b>	<b>śro, 12.05.21</b>	<b>wto, 25.05.21</b>	
176			Analiza wpływu na inne funkcjonujące w urzędzie systemy produkcyjne (negatywna)	2 dn	śro, 12.05.21	pią, 14.05.21	172
177			Analiza możliwości wykonania ew. przyszłych integracji z innymi istniejącymi systemami produkcyjnymi w urzędzie	1 dzień	pią, 14.05.21	pon, 17.05.21	176
178			Analiza zgodności licencyjnej i ew. wzrostu kosztów (negatywna)	1 dzień	pon, 17.05.21	wto, 18.05.21	177

Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
179			Ostateczna weryfikacja techniczna wpływu zmiany na zakres projektu i ew. przyszłą możliwość rozwoju czy też integracji wewnętrznych (wynik negatywny)	1 dzień	wto, 18.05.21	śro, 19.05.21	178
180			Uzyskano wewnętrzną negatywną rekomendację realizacji zmiany	0,33 dn	śro, 19.05.21	śro, 19.05.21	179
181			Odrzucenie zmiany na Komitecie Sterującym	1 dzień	pon, 24.05.21	wto, 25.05.21	180ZR+3 dn
182			<b>Zmiana ekranu logowania do platformy</b>	<b>7,33 dn</b>	<b>śro, 19.05.21</b>	<b>pią, 28.05.21</b>	
183			Analiza zmiany funkcjonalnej przez analityka biznesowego (wstępna pozytywna)	1 dzień	śro, 19.05.21	czw, 20.05.21	180
184			Analiza zmiany funkcjonalnej przez Projektanta IT (negatywna - konflikt technologiczny z zaplanowaną do wdrożenia technologią SSO)	2 dn	czw, 20.05.21	pon, 24.05.21	183
185			Wycena ewentualnej zmiany funkcjonalnej u wykonawcy (negatywna - zbyt drogo i za długo)	3 dn	śro, 19.05.21	pon, 24.05.21	183RR
186			Analiza wpływu na pozostałe funkcjonalności wytwarzanej platformy i na ew. możliwość przyszłych integracji (wynik negatywny)	1 dzień	pon, 24.05.21	wto, 25.05.21	184
187			Uzyskano wewnętrzną negatywną rekomendację realizacji zmiany	0,33 dn	wto, 25.05.21	wto, 25.05.21	186;185
188			Odrzucenie zmiany na Komitecie Sterującym	1 dzień	czw, 27.05.21	pią, 28.05.21	187ZR+2 dn

Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20
















Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
189			<b>Development wykonawcy platformy - prace inicjujące</b>	<b>30 dn</b>	<b>wto, 23.03.21</b>	<b>wto, 04.05.21</b>	
190			Development / wytworzenie pierwszej wersji platformy na środowisku developerskim w urzędzie	30 dn	wto, 23.03.21	wto, 04.05.21	132
191			<b>Przeprowadzenie testów oprogramowania oraz dalszy development</b>	<b>227,46 dn</b>	<b>wto, 04.05.21</b>	<b>czw, 17.03.22</b>	
192			<b>Instalacja platformy na środowisku testowym / integracyjnym</b>	<b>20 dn</b>	<b>wto, 04.05.21</b>	<b>wto, 01.06.21</b>	
193			Przygotowanie paczek instalacyjnych wraz z instrukcjami instalacji	3 dn	wto, 04.05.21	pią, 07.05.21	190
194			Przekazanie paczek instalacyjnych wraz z kodem źródłowym i instrukcjami instalacji do repozytorium (gitlab)	2 dn	pią, 07.05.21	wto, 11.05.21	193
195			<b>Zgłaszanie uwag i poprawki materiału wdrożeniowego</b>	<b>8 dn</b>	<b>wto, 11.05.21</b>	<b>pią, 21.05.21</b>	
196			<b>I iteracja</b>	<b>5 dn</b>	<b>wto, 11.05.21</b>	<b>wto, 18.05.21</b>	
197			<b>Weryfikacja zgodności paczek instalacyjnych z wewnętrznymi standardami / procedurami IT w urzędzie</b>	<b>5 dn</b>	<b>wto, 11.05.21</b>	<b>wto, 18.05.21</b>	
198			Zgłoszenie uwag	3 dn	wto, 11.05.21	pią, 14.05.21	194
199			Poprawa materiału wdrożeniowego i instrukcji instalacyjnych	2 dn	pią, 14.05.21	wto, 18.05.21	198
200			<b>II iteracja</b>	<b>3 dn</b>	<b>wto, 18.05.21</b>	<b>pią, 21.05.21</b>	
201			<b>Weryfikacja zgodności paczek instalacyjnych z wewnętrznymi standardami / procedurami IT w urzędzie</b>	<b>3 dn</b>	<b>wto, 18.05.21</b>	<b>pią, 21.05.21</b>	

Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
202			Zgłoszenie uwag	2 dn	wto, 18.05.21	czw, 20.05.21	199
203			Poprawa materiału wdrożeniowego i instrukcji instalacyjnych	1 dzień	czw, 20.05.21	pią, 21.05.21	202
204			<b>Instalacja paczek w urzędzie (środowisko testowe / integracyjne)</b>	<b>7 dn</b>	<b>pią, 21.05.21</b>	<b>wto, 01.06.21</b>	
205			<b>I podejście</b>	<b>4 dn</b>	<b>pią, 21.05.21</b>	<b>czw, 27.05.21</b>	
206			Instalacja paczek bazodanowych	1 dzień	pią, 21.05.21	pon, 24.05.21	203
207			Instalacja paczek aplikacyjnych	1 dzień	pon, 24.05.21	wto, 25.05.21	206
208			Zgłoszenie błędów	0 dn	wto, 25.05.21	wto, 25.05.21	207
209			Poprawa błędów	2 dn	wto, 25.05.21	czw, 27.05.21	208
210			<b>II podejście</b>	<b>3 dn</b>	<b>czw, 27.05.21</b>	<b>wto, 01.06.21</b>	
211			Instalacja paczek bazodanowych	0,5 dn	czw, 27.05.21	czw, 27.05.21	209
212			Instalacja paczek aplikacyjnych	0,5 dn	czw, 27.05.21	pią, 28.05.21	211
213			Zgłoszenie błędów	0 dn	pią, 28.05.21	pią, 28.05.21	212
214			Poprawa błędów	1 dzień	pią, 28.05.21	pon, 31.05.21	213
215			Instalacja poprawionych paczek instalacyjnych na środowisku testowym / integracyjnym	1 dzień	pon, 31.05.21	wto, 01.06.21	214

Projekt: Projekt1

Data: pię, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu


Zadanie nieaktywne


Nieaktywny punkt kontrolny


Podsumowanie nieaktywne


Zadanie ręczne


Tylko z czasem trwania


























Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem


Zadania zewnętrzne


Zewnętrzne punkty kontrolne


Termin ostateczny


Postęp


Ręczne (postęp)




































































































Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
216			KM: paczki instalacyjne budujące platformę zainstalowane z powodzeniem na środowisku testowym / integracyjnym	0 dn	wto, 01.06.21	wto, 01.06.21	215
217			<b>Wykonanie testów funkcjonalnych / jednostkowych</b>	<b>80,13 dn</b>	<b>wto, 01.06.21</b>	<b>wto, 21.09.21</b>	
218			<b>I iteracja (etap) testowania</b>	<b>41,3 dn</b>	<b>wto, 01.06.21</b>	<b>śro, 28.07.21</b>	
219			Wykonanie testów funkcjonalnych / jednostkowych na podstawie wcześniej odebranych scenariuszy testowych	10 dn	wto, 01.06.21	wto, 15.06.21	216;55
220			Równoległe zgłaszanie błędów w aplikacji Jira	10 dn	wto, 01.06.21	wto, 15.06.21	219RR
221			Wsparcie administratora baz danych	30,3 dn	wto, 01.06.21	wto, 13.07.21	219RR
222			Wsparcie inżyniera systemowego	30,3 dn	wto, 01.06.21	wto, 13.07.21	219RR
223			Wsparcie koordynatora IT	30,3 dn	wto, 01.06.21	wto, 13.07.21	219RR
224			Wsparcie analityka biznesowego	30,3 dn	wto, 01.06.21	wto, 13.07.21	219RR
225			Wsparcie projektanta IT	30,3 dn	wto, 01.06.21	wto, 13.07.21	219RR
226			Koordynacja testów	30,3 dn	wto, 01.06.21	wto, 13.07.21	219RR
227			<b>Poprawki błędów i wgranie na środowisko poprawionego materiału wdrożeniowego</b>	<b>11 dn</b>	<b>wto, 13.07.21</b>	<b>śro, 28.07.21</b>	
228			Odtworzenie błędów na środowisku testowym / integracyjnym	5 dn	wto, 13.07.21	wto, 20.07.21	226
229			Wykonanie poprawek na środowisku developerskim	5 dn	wto, 13.07.21	wto, 20.07.21	228RR
230			Wykonanie testów poprawek na środowisku developerskim	5 dn	wto, 13.07.21	wto, 20.07.21	229RR


















Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20




















Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




















Id.	 Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
231		 Przygotowanie paczek instalacyjnych z poprawkami na środowisko testowe	3 dn	wto, 20.07.21	pią, 23.07.21	230
232		 Instalacja paczek z poprawkami na środowisko testowe	2 dn	pią, 23.07.21	wto, 27.07.21	231
233		 Wstępna weryfikacja zainstalowanych poprawek na środowisku testowym	1 dzień	wto, 27.07.21	śro, 28.07.21	232
234		 <b>II iteracja (etap) testowania</b>	<b>28,5 dn</b>	<b>śro, 28.07.21</b>	<b>wto, 07.09.21</b>	
235		 Wykonanie testów funkcjonalnych / jednostkowych na podstawie wcześniej odebranych scenariuszy testowych	15 dn	śro, 28.07.21	śro, 18.08.21	233
236		 Równoległe zgłaszanie błędów w aplikacji Jira	15 dn	śro, 28.07.21	śro, 18.08.21	235RR
237		 Wsparcie administratora baz danych	15 dn	śro, 28.07.21	śro, 18.08.21	236RR
238		 Wsparcie inżyniera systemowego	15 dn	śro, 28.07.21	śro, 18.08.21	237RR
239		 Wsparcie koordynatora IT	15 dn	śro, 28.07.21	śro, 18.08.21	238RR
240		 Wsparcie analityka biznesowego	15 dn	śro, 28.07.21	śro, 18.08.21	239RR
241		 Wsparcie projektanta IT	15 dn	śro, 28.07.21	śro, 18.08.21	240RR
242		 Koordynacja testów	15 dn	śro, 28.07.21	śro, 18.08.21	241RR
243		 <b>Poprawki błędów i wgranie na środowisko poprawionego materiału wdrożeniowego</b>	<b>13,5 dn</b>	<b>śro, 18.08.21</b>	<b>wto, 07.09.21</b>	
244		 Odtworzenie błędów na środowisku testowym / integracyjnym	5 dn	śro, 18.08.21	śro, 25.08.21	236

Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20




















Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			





















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
245			Wykonanie poprawek na środowisku developerskim	3 dn	śro, 25.08.21	pon, 30.08.21	244
246			Wykonanie testów poprawek na środowisku developerskim	2 dn	pon, 30.08.21	śro, 01.09.21	245
247			Przygotowanie paczek instalacyjnych z poprawkami na środowisko testowe	2 dn	śro, 01.09.21	pią, 03.09.21	246
248			Instalacja paczek z poprawkami na środowisko testowe	1 dzień	pią, 03.09.21	pon, 06.09.21	247
249			Wstępna weryfikacja zainstalowanych poprawek na środowisku testowym	0,5 dn	pon, 06.09.21	wto, 07.09.21	248
250			<b>III iteracja (etap) testowania</b>	<b>10,33 dn</b>	<b>wto, 07.09.21</b>	<b>wto, 21.09.21</b>	
251			Wykonanie testów funkcjonalnych / jednostkowych na podstawie wcześniej odebranych scenariuszy testowych	5 dn	wto, 07.09.21	wto, 14.09.21	249
252			Równoległe zgłaszanie błędów w aplikacji Jira	5 dn	wto, 07.09.21	wto, 14.09.21	251RR
253			Wsparcie administratora baz danych	5 dn	wto, 07.09.21	wto, 14.09.21	252RR
254			Wsparcie inżyniera systemowego	5 dn	wto, 07.09.21	wto, 14.09.21	253RR
255			Wsparcie koordynatora IT	5 dn	wto, 07.09.21	wto, 14.09.21	254RR
256			Wsparcie analityka biznesowego	5 dn	wto, 07.09.21	wto, 14.09.21	255RR
257			Wsparcie projektanta IT	5 dn	wto, 07.09.21	wto, 14.09.21	256RR
258			Koordynacja testów	5 dn	wto, 07.09.21	wto, 14.09.21	257RR

Projekt: Projekt1 Data: pię, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
259			<b>Poprawki błędów i wgranie na środowisko poprawionego materiału wdrożeniowego</b>	<b>5,33 dn</b>	<b>wto, 14.09.21</b>	<b>wto, 21.09.21</b>	
260			Odtworzenie błędów na środowisku testowym / inegracyjnym	2 dn	wto, 14.09.21	czw, 16.09.21	252
261			Wykonanie poprawek na środowisku developerskim	1 dzień	wto, 14.09.21	śro, 15.09.21	260RR
262			Wykonanie testów poprawek na środowisku developerskim	1 dzień	śro, 15.09.21	czw, 16.09.21	261
263			Przygotowanie paczek instalacyjnych z poprawkami na środowisko testowe	1 dzień	czw, 16.09.21	pią, 17.09.21	262
264			Instalacja paczek z poprawkami na środowisko testowe	1 dzień	pią, 17.09.21	pon, 20.09.21	263
265			Wstępna weryfikacja zainstalowanych poprawek na środowisku testowym	0,33 dn	pon, 20.09.21	pon, 20.09.21	264
266			Weryfikacja ostatecznych poprawek przez testera z urzędu	1 dzień	pon, 20.09.21	wto, 21.09.21	265
267			KM: zakończenie testów jednostkowych / funkcjonalnych	0 dn	wto, 21.09.21	wto, 21.09.21	266
268			<b>Wykonanie testów integracyjnych</b>	<b>67 dn</b>	<b>wto, 21.09.21</b>	<b>czw, 23.12.21</b>	
269			<b>I iteracja</b>	<b>40 dn</b>	<b>wto, 21.09.21</b>	<b>wto, 16.11.21</b>	
270			Wykonanie testów integracyjnych na podstawie wcześniej odebranych scenariuszy testowych do testów integracyjnych	20 dn	wto, 21.09.21	wto, 19.10.21	266;66

Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
271			Równoległe zgłaszanie błędów w aplikacji Jira	20 dn	wto, 21.09.21	wto, 19.10.21	270RR
272			Wsparcie administratora baz danych	20 dn	wto, 21.09.21	wto, 19.10.21	271RR
273			Wsparcie inżyniera systemowego	20 dn	wto, 21.09.21	wto, 19.10.21	272RR
274			Wsparcie koordynatora IT	20 dn	wto, 21.09.21	wto, 19.10.21	273RR
275			Wsparcie analityka biznesowego	20 dn	wto, 21.09.21	wto, 19.10.21	274RR
276			Wsparcie projektanta IT	20 dn	wto, 21.09.21	wto, 19.10.21	275RR
277			Koordinacja testów	20 dn	wto, 21.09.21	wto, 19.10.21	276RR
278			<b>Poprawki błędów i wgranie na środowisko poprawionego materiału wdrożeniowego</b>	<b>20 dn</b>	<b>wto, 19.10.21</b>	<b>wto, 16.11.21</b>	
279			Odtworzenie błędów na środowisku testowym / inegracyjnym	10 dn	wto, 19.10.21	wto, 02.11.21	271
280			Wykonanie poprawek na środowisku developerskim	10 dn	wto, 19.10.21	wto, 02.11.21	279RR
281			Wykonanie testów poprawek na środowisku developerskim	10 dn	wto, 19.10.21	wto, 02.11.21	280RR
282			Przygotowanie paczek instalacyjnych z poprawkami na środowisko testowe	5 dn	wto, 02.11.21	wto, 09.11.21	281
283			Instalacja paczek z poprawkami na środowisko testowe	3 dn	wto, 09.11.21	pią, 12.11.21	282
284			Wstępna weryfikacja zainstalowanych poprawek na środowisku testowym	2 dn	pią, 12.11.21	wto, 16.11.21	283

Projekt: Projekt1

Data: pię, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu


Zadanie nieaktywne


Nieaktywny punkt kontrolny


Podsumowanie nieaktywne


Zadanie ręczne


Tylko z czasem trwania


























Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem


Zadania zewnętrzne


Zewnętrzne punkty kontrolne


Termin ostateczny


Postęp


Ręczne (postęp)













































































































Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
285			<b>II iteracja</b>	<b>27 dn</b>	<b>wto, 16.11.21</b>	<b>czw, 23.12.21</b>	
286			Wykonanie testów integracyjnych na podstawie wcześniej odebranych scenariuszy testowych do testów integracyjnych	10 dn	wto, 16.11.21	wto, 30.11.21	284
287			Równoległe zgłaszanie błędów w aplikacji Jira	10 dn	wto, 16.11.21	wto, 30.11.21	286RR
288			Wsparcie administratora baz danych	10 dn	wto, 16.11.21	wto, 30.11.21	287RR
289			Wsparcie inżyniera systemowego	10 dn	wto, 16.11.21	wto, 30.11.21	288RR
290			Wsparcie koordynatora IT	10 dn	wto, 16.11.21	wto, 30.11.21	289RR
291			Wsparcie analityka biznesowego	10 dn	wto, 16.11.21	wto, 30.11.21	290RR
292			Wsparcie projektanta IT	10 dn	wto, 16.11.21	wto, 30.11.21	291RR
293			Koordinacja testów	10 dn	wto, 16.11.21	wto, 30.11.21	292RR
294			<b>Poprawki błędów i wgranie na środowisko poprawionego materiału wdrożeniowego</b>	<b>17 dn</b>	<b>wto, 30.11.21</b>	<b>czw, 23.12.21</b>	
295			Odtworzenie błędów na środowisku testowym / integracyjnym	5 dn	wto, 30.11.21	wto, 07.12.21	287
296			Wykonanie poprawek na środowisku developerskim	3 dn	wto, 07.12.21	pią, 10.12.21	295
297			Wykonanie testów poprawek na środowisku developerskim	3 dn	pią, 10.12.21	śro, 15.12.21	296
298			Przygotowanie paczek instalacyjnych z poprawkami na środowisko testowe	2 dn	śro, 15.12.21	pią, 17.12.21	297

Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20



















Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
299			Instalacja paczek z poprawkami na środowisko testowe	1 dzień	pią, 17.12.21	pon, 20.12.21	298
300			Wstępna weryfikacja zainstalowanych poprawek na środowisku testowym	1 dzień	pon, 20.12.21	wto, 21.12.21	299
301			Weryfikacja ostatecznych poprawek przez testera z urzędu	2 dn	wto, 21.12.21	czw, 23.12.21	300
302			KM: zakończenie testów integracyjnych	0 dn	czw, 23.12.21	czw, 23.12.21	301
303			<b>Wykonanie testów wydajnościowych i stabilności (środowisko produkcyjne)</b>	<b>36,08 dn</b>	<b>czw, 23.12.21</b>	<b>pią, 11.02.22</b>	
304			Analiza techniczna czy można wykonać testy wydajnościowe od razu na środowisku produkcyjnym	0,5 dn	czw, 23.12.21	pią, 24.12.21	302
305			Pozytywna rekomendacja	0,25 dn	pią, 24.12.21	pią, 24.12.21	304
306			<b>Instalacja platformy na środowisku produkcyjnym</b>	<b>15 dn</b>	<b>pią, 24.12.21</b>	<b>pią, 14.01.22</b>	
307			Przygotowanie materiału wdrożeniowego (paczek instalacyjnych i instrukcji)	3 dn	pią, 24.12.21	śro, 29.12.21	305
308			Przegląd materiału wdrożeniowego i zgłoszenie uwag (zgodność z procedurami IT w urzędzie, merytoryczny przegląd kodu / skryptów instalacyjnych)	2 dn	śro, 29.12.21	pią, 31.12.21	307
309			Poprawa zgłoszonych błędów	1 dzień	pią, 31.12.21	pon, 03.01.22	308
310			Ostateczna weryfikacja poprawek paczek instalacyjnych i instrukcji	1 dzień	pon, 03.01.22	wto, 04.01.22	309




















Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20





















Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
311			Wypracowanie terminu wdrożenia i planu wdrożenia na produkcję (w tym zasad komunikacji podczas wdrożenia i kolejności instalowania paczek instalacyjnych)	1 dzień	pią, 07.01.22	pon, 10.01.22	310ZR+3 dn
312			<b>Instalacja</b>	<b>1 dzień</b>	<b>czw, 13.01.22</b>	<b>pią, 14.01.22</b>	
313			Instalacja paczek dot. serwera IIS	1 dzień	czw, 13.01.22	pią, 14.01.22	311ZR+3 dn
314			Instalacja paczek dot. baz danych	1 dzień	czw, 13.01.22	pią, 14.01.22	313RR
315			Konfiguracja sieciowa	1 dzień	czw, 13.01.22	pią, 14.01.22	314RR
316			Koordinacja instalacji przez koordynatora IT	1 dzień	czw, 13.01.22	pią, 14.01.22	315RR
317			Koordinacja komunikacji podczas wdrożenia na produkcję	1 dzień	czw, 13.01.22	pią, 14.01.22	316RR
318			Zdalne wsparcie podczas instalacji platformy na produkcji	1 dzień	czw, 13.01.22	pią, 14.01.22	317RR
319			Wykonanie smoke testów (szybkie testy funkcjonalne potwierdzające wstępnie działanie rozwiązania)	1 dzień	czw, 13.01.22	pią, 14.01.22	318RR
320			KM: Platforma zainstalowana na środowisku produkcyjnym	0 dn	pią, 14.01.22	pią, 14.01.22	319
321			<b>Wykonanie testów</b>	<b>20,33 dn</b>	<b>pią, 14.01.22</b>	<b>pią, 11.02.22</b>	
322			<b>I iteracja</b>	<b>9 dn</b>	<b>pią, 14.01.22</b>	<b>czw, 27.01.22</b>	
323			Wykonanie testów zgodnie z planem testów, scenariuszami testów wydajnościowych i obciążeniowych	5 dn	pią, 14.01.22	pią, 21.01.22	78;43;320
324			Wsparcie podczas wykonywania testów wydajnościowych	5 dn	pią, 14.01.22	pią, 21.01.22	323RR

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
325			Poprawa błędów wykrytych podczas I iteracji testów wydajnościowych (wykrycie "wąskich gardeł" i optymalizacja rozwiązania)	2 dn	pią, 21.01.22	wto, 25.01.22	324
326			Przygotowanie poprawionych paczek instalacyjnych	1 dzień	wto, 25.01.22	śro, 26.01.22	325
327			Instalacja paczek z poprawkami	1 dzień	śro, 26.01.22	czw, 27.01.22	326
328			<b>II iteracja</b>	<b>11,33 dn</b>	<b>czw, 27.01.22</b>	<b>pią, 11.02.22</b>	
329			Wykonanie testów zgodnie z planem testów, scenariuszami testów wydajnościowych i obciążeniowych	3 dn	czw, 27.01.22	wto, 01.02.22	327
330			Wsparcie podczas wykonywania testów wydajnościowych	3 dn	czw, 27.01.22	wto, 01.02.22	329RR
331			Poprawa błędów wykrytych podczas II iteracji testów wydajnościowych (wykrycie "wąskich gardeł" i optymalizacja rozwiązania)	1 dzień	wto, 01.02.22	śro, 02.02.22	330
332			Przygotowanie poprawionych paczek instalacyjnych	1 dzień	śro, 02.02.22	czw, 03.02.22	331
333			Instalacja paczek z poprawkami	1 dzień	czw, 03.02.22	pią, 04.02.22	332
334			Ostateczna weryfikacja spełnienia wymagań wydajnościowych	1 dzień	pią, 04.02.22	pon, 07.02.22	333

Projekt: Projekt1

Data: pię, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu


Zadanie nieaktywne


Nieaktywny punkt kontrolny


Podsumowanie nieaktywne


Zadanie ręczne


Tylko z czasem trwania


























Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem


Zadania zewnętrzne


Zewnętrzne punkty kontrolne


Termin ostateczny


Postęp


Ręczne (postęp)



































































Strona 26




















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
335			Przygotowanie raportu z testów wydajnościowych (spełnienie wymagań wydajnościowych zapisanych w analizie biznesowej oraz w projekcie technicznym, opis skryptów i narzędzi użytych do testów, opis środowiska produkcyjnego i wersji komponentów, opis danych)	3 dn	pon, 07.02.22	czw, 10.02.22	334
336			Omówienie raportu przez wykonawcę w urzędzie	1 dzień	czw, 10.02.22	pią, 11.02.22	335
337			Akceptacja raportu z testów wydajnościowych przez koordynatora IT	0,33 dn	pią, 11.02.22	pią, 11.02.22	336
338			KM: testy wydajnościowe zakończone	0 dn	pią, 11.02.22	pią, 11.02.22	337
339			<b>Wykonanie audytu / testów bezpieczeństwa (środowisko produkcyjne)</b>	<b>24,25 dn</b>	<b>pią, 11.02.22</b>	<b>czw, 17.03.22</b>	
340			<b>I iteracja</b>	<b>11 dn</b>	<b>pią, 11.02.22</b>	<b>pon, 28.02.22</b>	
341			Wykonanie testów zgodnie z planem testów, scenariuszami testów bezpieczeństwa	5 dn	pią, 11.02.22	pią, 18.02.22	338
342			Wsparcie podczas wykonywania testów bezpieczeństwa	5 dn	pią, 11.02.22	pią, 18.02.22	341RR
343			Poprawa błędów wykrytych podczas I iteracji testów bezpieczeństwa (wykrycie podatności czy potencjalnych luk bezpieczeństwa i optymalizacja rozwiązania)	3 dn	pią, 18.02.22	śro, 23.02.22	342
344			Przygotowanie poprawionych paczek instalacyjnych	2 dn	śro, 23.02.22	pią, 25.02.22	343
345			Instalacja paczek z poprawkami	1 dzień	pią, 25.02.22	pon, 28.02.22	344




























Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
346			<b>II iteracja</b>	<b>13,25 dn</b>	<b>pon, 28.02.22</b>	<b>czw, 17.03.22</b>	
347			Wykonanie testów zgodnie z planem testów, scenariuszami testów bezpieczeństwa	3 dn	pon, 28.02.22	czw, 03.03.22	345
348			Wsparcie podczas wykonywania testów bezpieczeństwa	3 dn	pon, 28.02.22	czw, 03.03.22	347RR
349			Poprawa błędów wykrytych podczas II iteracji testów bezpieczeństwa (wykrycie podatności czy potencjalnych luk bezpieczeństwa i optymalizacja rozwiązania)	2 dn	czw, 03.03.22	pon, 07.03.22	348
350			Przygotowanie poprawionych paczek instalacyjnych	1 dzień	pon, 07.03.22	wto, 08.03.22	349
351			Instalacja paczek z poprawkami	1 dzień	wto, 08.03.22	śro, 09.03.22	350
352			Ostateczna weryfikacja spełnienia wymagań dot. bezpieczeństwa	1 dzień	śro, 09.03.22	czw, 10.03.22	351
353			Przygotowanie raportu z testów bezpieczeństwa (spełnienie wymagań dot. bezpieczeństwa w tym OWASP top 10, lista wykrytych podatności z prorytetami wraz z informacją o sposobie "załatania dziur", opis metodyki, użytych narzędzi i specyfikacja środowiska)	2 dn	czw, 10.03.22	pon, 14.03.22	352
354			Omówienie raportu przez wykonawcę w urzędzie	1 dzień	śro, 16.03.22	czw, 17.03.22	353ZR+2 dn
355			Akceptacja raportu z testów bezpieczeństwa przez koordynatora IT	0,25 dn	czw, 17.03.22	czw, 17.03.22	354
356			KM: testy bezpieczeństwa zakończone	0 dn	czw, 17.03.22	czw, 17.03.22	355






























Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
357			<b>Wykonanie audytu zgodności z WCAG 2.1 (środowisko testowe / integracyjne i produkcyjne)</b>	<b>15 dn</b>	<b>czw, 23.12.21</b>	<b>czw, 13.01.22</b>	
358			Wykonanie audytu z WCAG 2.1	10 dn	czw, 23.12.21	czw, 06.01.22	267;302
359			Przygotowanie raportu z audytu WCAG 2.1	3 dn	czw, 06.01.22	wto, 11.01.22	358
360			Prezentacja raportu w urzędzie	1 dzień	wto, 11.01.22	śro, 12.01.22	359
361			Akceptacja raportu z audytu WCAG 2.1	1 dzień	śro, 12.01.22	czw, 13.01.22	360
362			KM: audyt dot. spełnienia wymagań WCAG 2.1 zakończony wynikiem pozytywnym	0 dn	czw, 13.01.22	czw, 13.01.22	361
363			<b>KM: UZYSKANIE GOTOWOŚCI DO URUCHOMIENIA PRODUKCYJNEGO PLATFORMY</b>	<b>0 dn</b>	<b>czw, 17.03.22</b>	<b>czw, 17.03.22</b>	<b>362;356;338;302;</b>
364			<b>Odbiór pozostałej dokumentacji projektowej</b>	<b>72,33 dn</b>	<b>czw, 23.12.21</b>	<b>pon, 04.04.22</b>	
365			<b>Instrukcja obsługi platformy dla obywatela / interesariusza</b>	<b>15 dn</b>	<b>czw, 23.12.21</b>	<b>czw, 13.01.22</b>	
366			<b>I iteracja</b>	<b>8 dn</b>	<b>czw, 23.12.21</b>	<b>wto, 04.01.22</b>	
367			Wykonanie pierwszej wersji instrukcji	5 dn	czw, 23.12.21	czw, 30.12.21	302
368			Zgłoszenie uwag do instrukcji	3 dn	czw, 30.12.21	wto, 04.01.22	367
369			<b>II iteracja</b>	<b>5 dn</b>	<b>wto, 04.01.22</b>	<b>wto, 11.01.22</b>	
370			Wykonanie kolejnej wersji instrukcji	3 dn	wto, 04.01.22	pią, 07.01.22	368
371			Zgłoszenie uwag do instrukcji	2 dn	pią, 07.01.22	wto, 11.01.22	370
372			Przygotowanie ostatecznej wersji instrukcji	1 dzień	wto, 11.01.22	śro, 12.01.22	371
373			Akceptacja instrukcji	1 dzień	śro, 12.01.22	czw, 13.01.22	372































Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
374			<b>Instrukcja obsługi platformy dla urzędnika</b>	<b>15 dn</b>	<b>czw, 13.01.22</b>	<b>czw, 03.02.22</b>	
375			<b>I iteracja</b>	<b>8 dn</b>	<b>czw, 13.01.22</b>	<b>wto, 25.01.22</b>	
376			Wykonanie pierwszej wersji instrukcji	5 dn	czw, 13.01.22	czw, 20.01.22	373
377			Zgłoszenie uwag do instrukcji	3 dn	czw, 20.01.22	wto, 25.01.22	376
378			<b>II iteracja</b>	<b>5 dn</b>	<b>wto, 25.01.22</b>	<b>wto, 01.02.22</b>	
379			Wykonanie kolejnej wersji instrukcji	3 dn	wto, 25.01.22	pią, 28.01.22	377
380			Zgłoszenie uwag do instrukcji	2 dn	pią, 28.01.22	wto, 01.02.22	379
381			Przygotowanie ostatecznej wersji instrukcji	1 dzień	wto, 01.02.22	śro, 02.02.22	380
382			Akceptacja instrukcji	1 dzień	śro, 02.02.22	czw, 03.02.22	381
383			<b>Instrukcja dla administratorów platformy</b>	<b>10 dn</b>	<b>czw, 17.03.22</b>	<b>czw, 31.03.22</b>	
384			<b>I iteracja</b>	<b>5 dn</b>	<b>czw, 17.03.22</b>	<b>czw, 24.03.22</b>	
385			Wykonanie pierwszej wersji instrukcji	3 dn	czw, 17.03.22	wto, 22.03.22	356
386			Zgłoszenie uwag do instrukcji	2 dn	wto, 22.03.22	czw, 24.03.22	385
387			<b>II iteracja</b>	<b>3 dn</b>	<b>czw, 24.03.22</b>	<b>wto, 29.03.22</b>	
388			Wykonanie kolejnej wersji instrukcji	2 dn	czw, 24.03.22	pon, 28.03.22	386
389			Zgłoszenie uwag do instrukcji	1 dzień	pon, 28.03.22	wto, 29.03.22	388
390			Przygotowanie ostatecznej wersji instrukcji	1 dzień	wto, 29.03.22	śro, 30.03.22	389
391			Akceptacja instrukcji	1 dzień	śro, 30.03.22	czw, 31.03.22	390
392			<b>Dokumentacja powykonawcza platformy</b>	<b>12 dn</b>	<b>czw, 17.03.22</b>	<b>pon, 04.04.22</b>	



























Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




















Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
393			<b>Aktualizacja dokumentu analizy wykonalności</b>	<b>5 dn</b>	<b>czw, 17.03.22</b>	<b>czw, 24.03.22</b>	
394			Aktualizacja dokumentu analizy wykonalności	3 dn	czw, 17.03.22	wto, 22.03.22	356
395			Weryfikacja aktualizacji dokumentu analizy wykonalności	1 dzień	wto, 22.03.22	śro, 23.03.22	394
396			Akceptacja aktualizacji dokumentu analizy wykonalności	1 dzień	śro, 23.03.22	czw, 24.03.22	395
397			<b>Aktualizacja dokumentu projektu technicznego</b>	<b>7 dn</b>	<b>czw, 24.03.22</b>	<b>pon, 04.04.22</b>	
398			Aktualizacja dokumentu projektu technicznego	4 dn	czw, 24.03.22	śro, 30.03.22	396
399			Weryfikacja aktualizacji dokumentu projektu technicznego	2 dn	śro, 30.03.22	pią, 01.04.22	398
400			Akceptacja aktualizacji dokumentu projektu technicznego	1 dzień	pią, 01.04.22	pon, 04.04.22	399
401			<b>Materiały szkoleniowe dla urzędników i administratorów</b>	<b>53,33 dn</b>	<b>czw, 13.01.22</b>	<b>wto, 29.03.22</b>	
402			<b>Administratorzy</b>	<b>8 dn</b>	<b>czw, 17.03.22</b>	<b>wto, 29.03.22</b>	
403			Wykonanie materiałów szkoleniowych dla administratorów	5 dn	czw, 17.03.22	czw, 24.03.22	356
404			Przygotowanie środowiska testowego do przeprowadzenia szkoleń (założenie testowych użytkowników, przygotowanie danych szkoleniowych)	3 dn	czw, 24.03.22	wto, 29.03.22	403
405			<b>Urzędnicy</b>	<b>8 dn</b>	<b>czw, 13.01.22</b>	<b>wto, 25.01.22</b>	
406			Wykonanie materiałów szkoleniowych dla urzędników	5 dn	czw, 13.01.22	czw, 20.01.22	362
407			Przygotowanie środowiska testowego do przeprowadzenia szkoleń (założenie testowych użytkowników, przygotowanie danych szkoleniowych)	3 dn	czw, 20.01.22	wto, 25.01.22	406
408			<b>Szkolenia</b>	<b>58,33 dn</b>	<b>czw, 13.01.22</b>	<b>wto, 05.04.22</b>	

Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20



















Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
409			<b>Administratorzy</b>	<b>13 dn</b>	<b>czw, 17.03.22</b>	<b>wto, 05.04.22</b>	
410			Przygotowanie listy obecności, przygotowanie sprzętu komputerowego i Sali szkoleniowej, w tym catering	5 dn	czw, 17.03.22	czw, 24.03.22	403RR
411			Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów platformy w urzędzie	5 dn	wto, 29.03.22	wto, 05.04.22	404
412			Wsparcie techniczne podczas szkolenia	5 dn	wto, 29.03.22	wto, 05.04.22	411RR
413			<b>Urzednicy</b>	<b>18 dn</b>	<b>czw, 13.01.22</b>	<b>wto, 08.02.22</b>	
414			Przygotowanie listy obecności, przygotowanie sprzętu komputerowego i sali szkoleniowej, w tym catering	10 dn	czw, 13.01.22	czw, 27.01.22	406RR
415			Przeprowadzenie szkoleń dla wybranej grupy urzędników	10 dn	wto, 25.01.22	wto, 08.02.22	407
416			Wsparcie techniczne podczas szkolenia	10 dn	wto, 25.01.22	wto, 08.02.22	415RR
417			KM: zakończenie szkoleń w projekcie	0 dn	wto, 05.04.22	wto, 05.04.22	411;415
418			<b>Uruchomienie produkcyjne platformy</b>	<b>18 dn</b>	<b>czw, 31.03.22</b>	<b>wto, 26.04.22</b>	
419			Wypracowanie planu uruchomienia produkcyjnego platformy	1 dzień	czw, 31.03.22	pią, 01.04.22	417ZR-3 dn
420			Akceptacja planu uruchomienia platformy na produkcji	1 dzień	pon, 04.04.22	wto, 05.04.22	419ZR+1 dzień
421			<b>Pilot</b>	<b>5 dn</b>	<b>wto, 05.04.22</b>	<b>wto, 12.04.22</b>	
422			Udostępnienie produkcyjne platformy wybranej wcześniej grupie obywateli i urzędników	5 dn	wto, 05.04.22	wto, 12.04.22	417
423			Wsparcie techniczne wykonawcy	5 dn	wto, 05.04.22	wto, 12.04.22	422RR




















Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			






















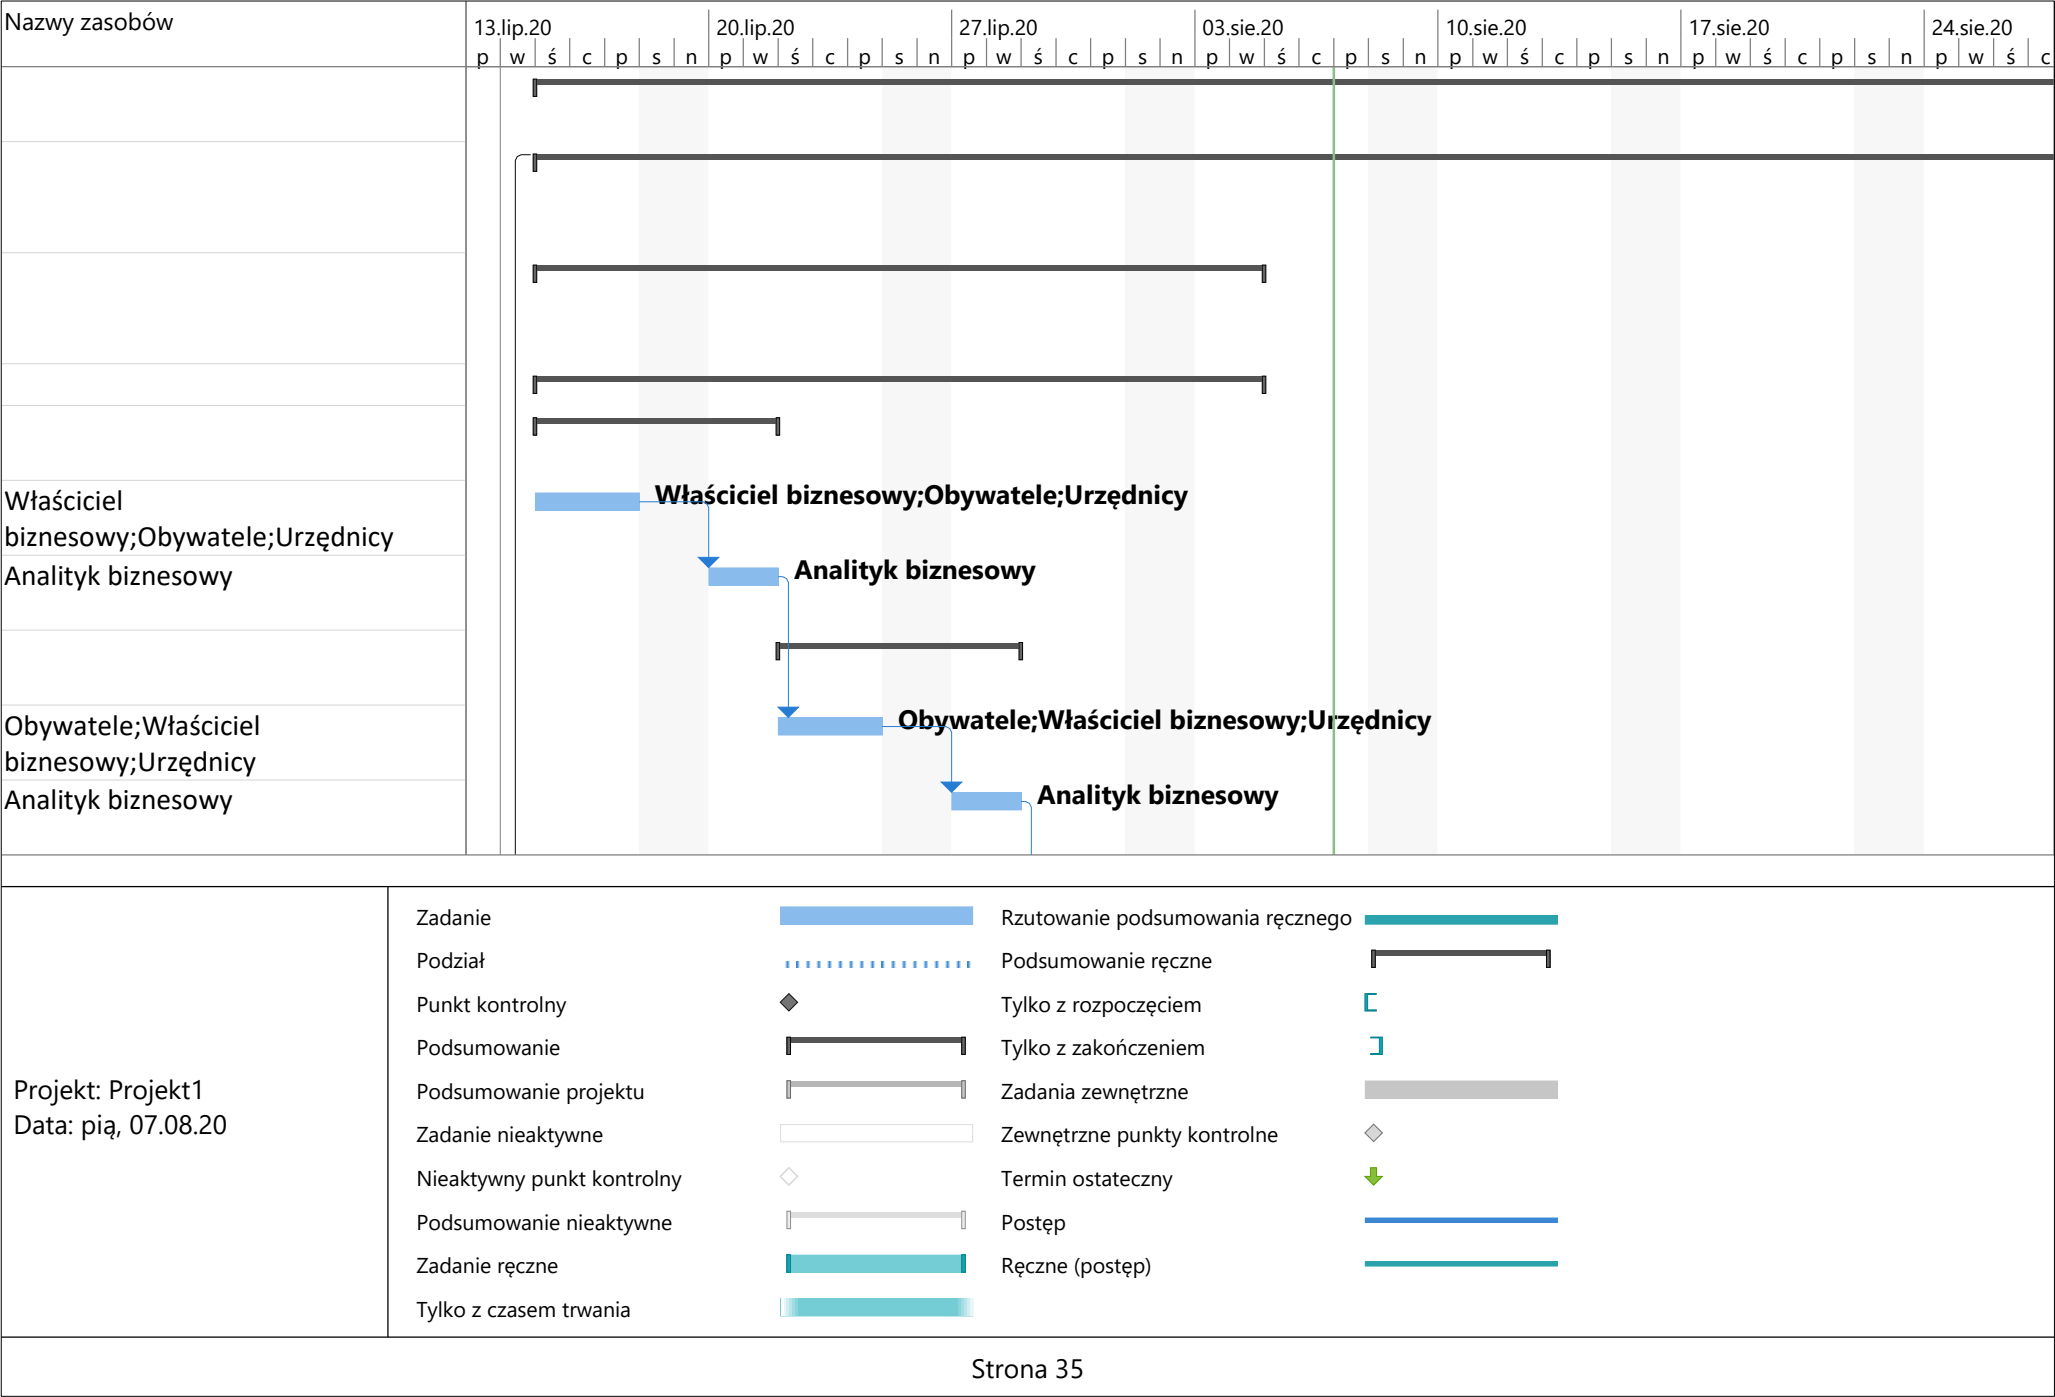
Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
424			Wewnętrzne wsparcie techniczne w urzędzie	5 dn	wto, 05.04.22	wto, 12.04.22	423RR
425			<b>Roll-out</b>	<b>10 dn</b>	<b>wto, 12.04.22</b>	<b>wto, 26.04.22</b>	
426			Udostępnienie produkcyjne platformy wszystkim obywatelom i urzędnikom	10 dn	wto, 12.04.22	wto, 26.04.22	422
427			Uruchomienie działań promujących rozwiązanie jakim jest platforma	10 dn	wto, 12.04.22	wto, 26.04.22	426RR
428			Wsparcie techniczne wykonawcy	10 dn	wto, 12.04.22	wto, 26.04.22	426RR
429			Wewnętrzne wsparcie techniczne w urzędzie	10 dn	wto, 12.04.22	wto, 26.04.22	428RR
430			<b>KM: Platforma uruchomiona produkcyjnie</b>	<b>0 dn</b>	<b>wto, 26.04.22</b>	<b>wto, 26.04.22</b>	<b>426</b>
431			<b>Odbiór oprogramowania platformy</b>	<b>20 dn</b>	<b>wto, 26.04.22</b>	<b>wto, 24.05.22</b>	
432			Przekazanie ostatecznej wersji kodu źródłowego platformy do repozytorium urzędu (narzędzie gitlab)	1 dzień	wto, 26.04.22	śro, 27.04.22	426
433			Weryfikacja przekazanych kodów	1 dzień	śro, 27.04.22	czw, 28.04.22	432
434			Formalny odbiór głównego produktu projektu (platformy)	1 dzień	czw, 28.04.22	pią, 29.04.22	433
435			<b>Stabilizacja po wdrożeniu na produkcję</b>	<b>20 dn</b>	<b>wto, 26.04.22</b>	<b>wto, 24.05.22</b>	
436			Zdalne wsparcie wykonawcy	20 dn	wto, 26.04.22	wto, 24.05.22	426
437			Wewnętrzne wsparcie techniczne w urzędzie	20 dn	wto, 26.04.22	wto, 24.05.22	436RR
438			<b>KM: zakończenie stabilizacji platformy</b>	<b>0 dn</b>	<b>wto, 24.05.22</b>	<b>wto, 24.05.22</b>	<b>437</b>
439			<b>Zarządzanie ryzykiem w projekcie</b>	<b>484,95 dn</b>	<b>śro, 15.07.20</b>	<b>wto, 24.05.22</b>	


Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzedniki
440			Zarządzanie ryzykiem w projekcie	484,95 dn	śro, 15.07.20	wto, 24.05.22	2RR





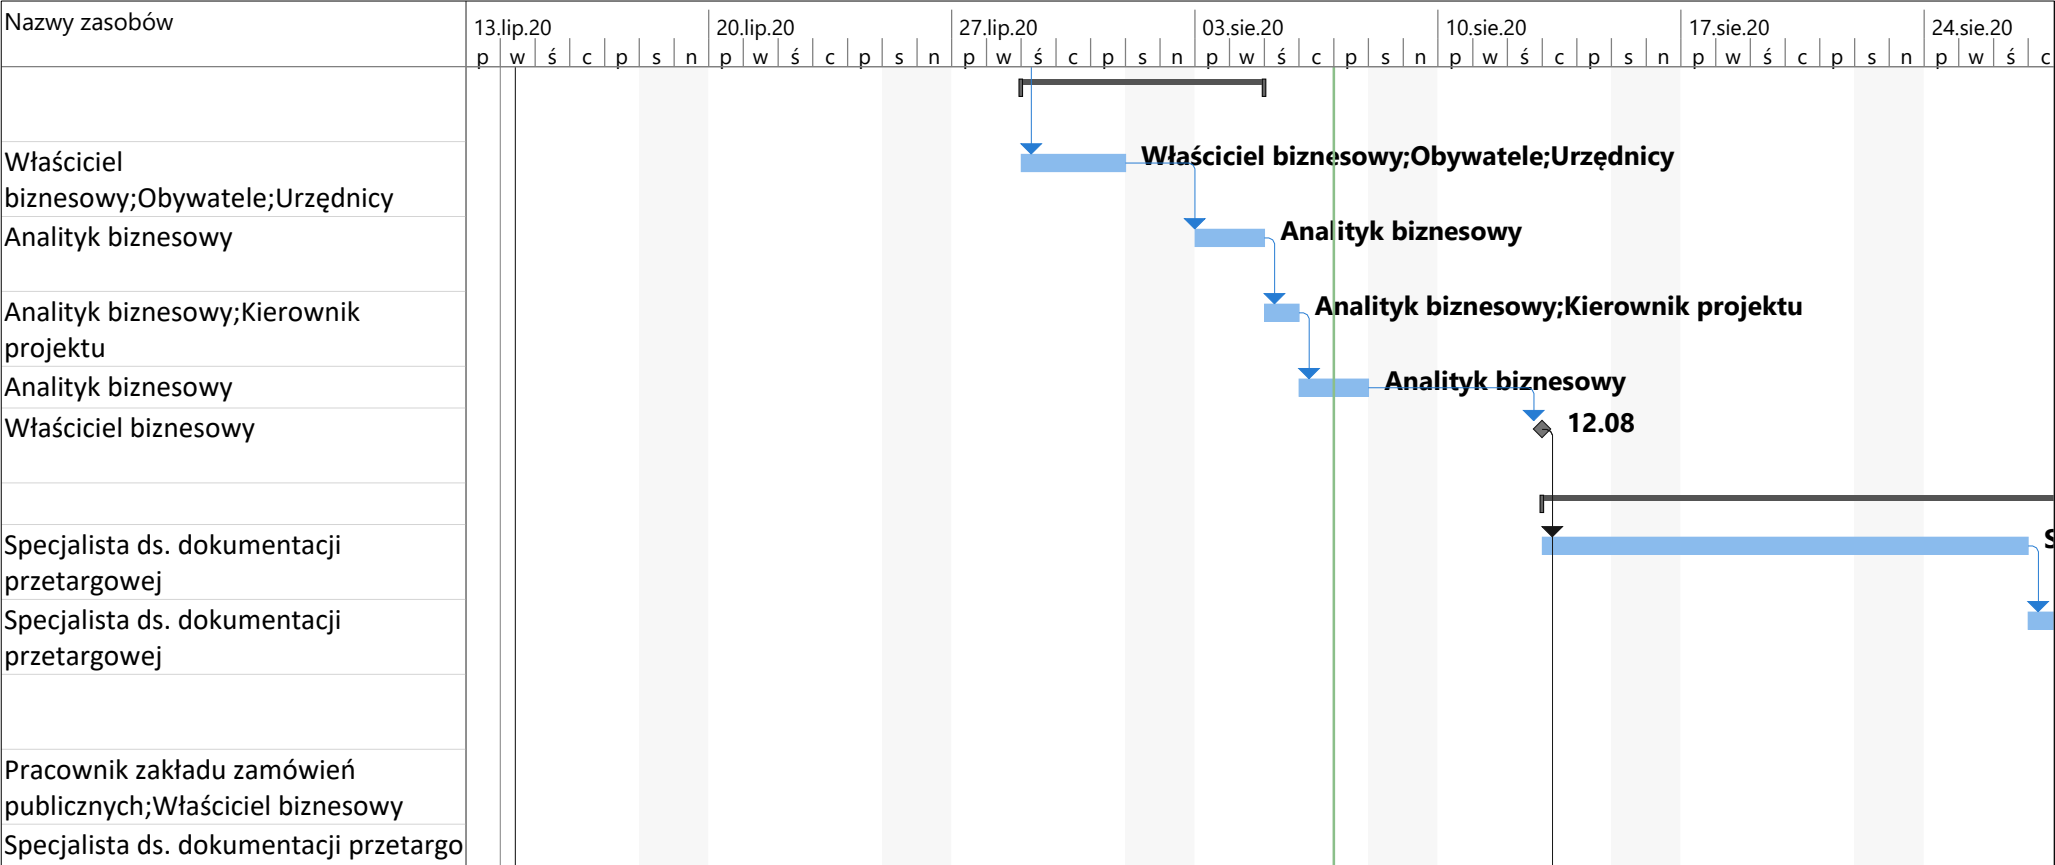














Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			





Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




















Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Pracownik zakładu zamówień publicznych;Właściciel biznesowy																																																	
Specjalista ds. dokumentacji przetargowej																																																	
Właściciel biznesowy																																																	
Kierownik projektu																																																	
Pracownik zakładu zamówień publicznych																																																	
Kierownik projektu																																																	
Przewodniczący komitetu sterującego																																																	
Wykonawca																																																	

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




















Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Tester;Analityk biznesowy;Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	
Tester;Analityk biznesowy;Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	
Tester;Analityk biznesowy;Koordynator IT;Kierownik Właściciel biznesowy																																																	
Wykonawca																																																	

<div>Projekt: Projekt1</div> <div>Data: pią, 07.08.20</div>	Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>
	Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>
	Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>
	Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>
	Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>
	Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>
	Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>
	Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>
	Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>
	Tylko z czasem trwania	<div></div>		

Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Analitik biznesowy																																																	
Analitik biznesowy;Tester																																																	
Wykonawca																																																	
Analitik biznesowy;Tester																																																	
Wykonawca																																																	
Analitik biznesowy;Tester;Kierownik projektu																																																	
Właściciel biznesowy																																																	
Wykonawca																																																	




















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			


Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Projektant IT																																																	
Tester																																																	
Wykonawca																																																	
Tester																																																	
Wykonawca																																																	
Kierownik projektu;Koordynator IT;Projektant IT;Tester																																																	
Właściciel biznesowy																																																	

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			







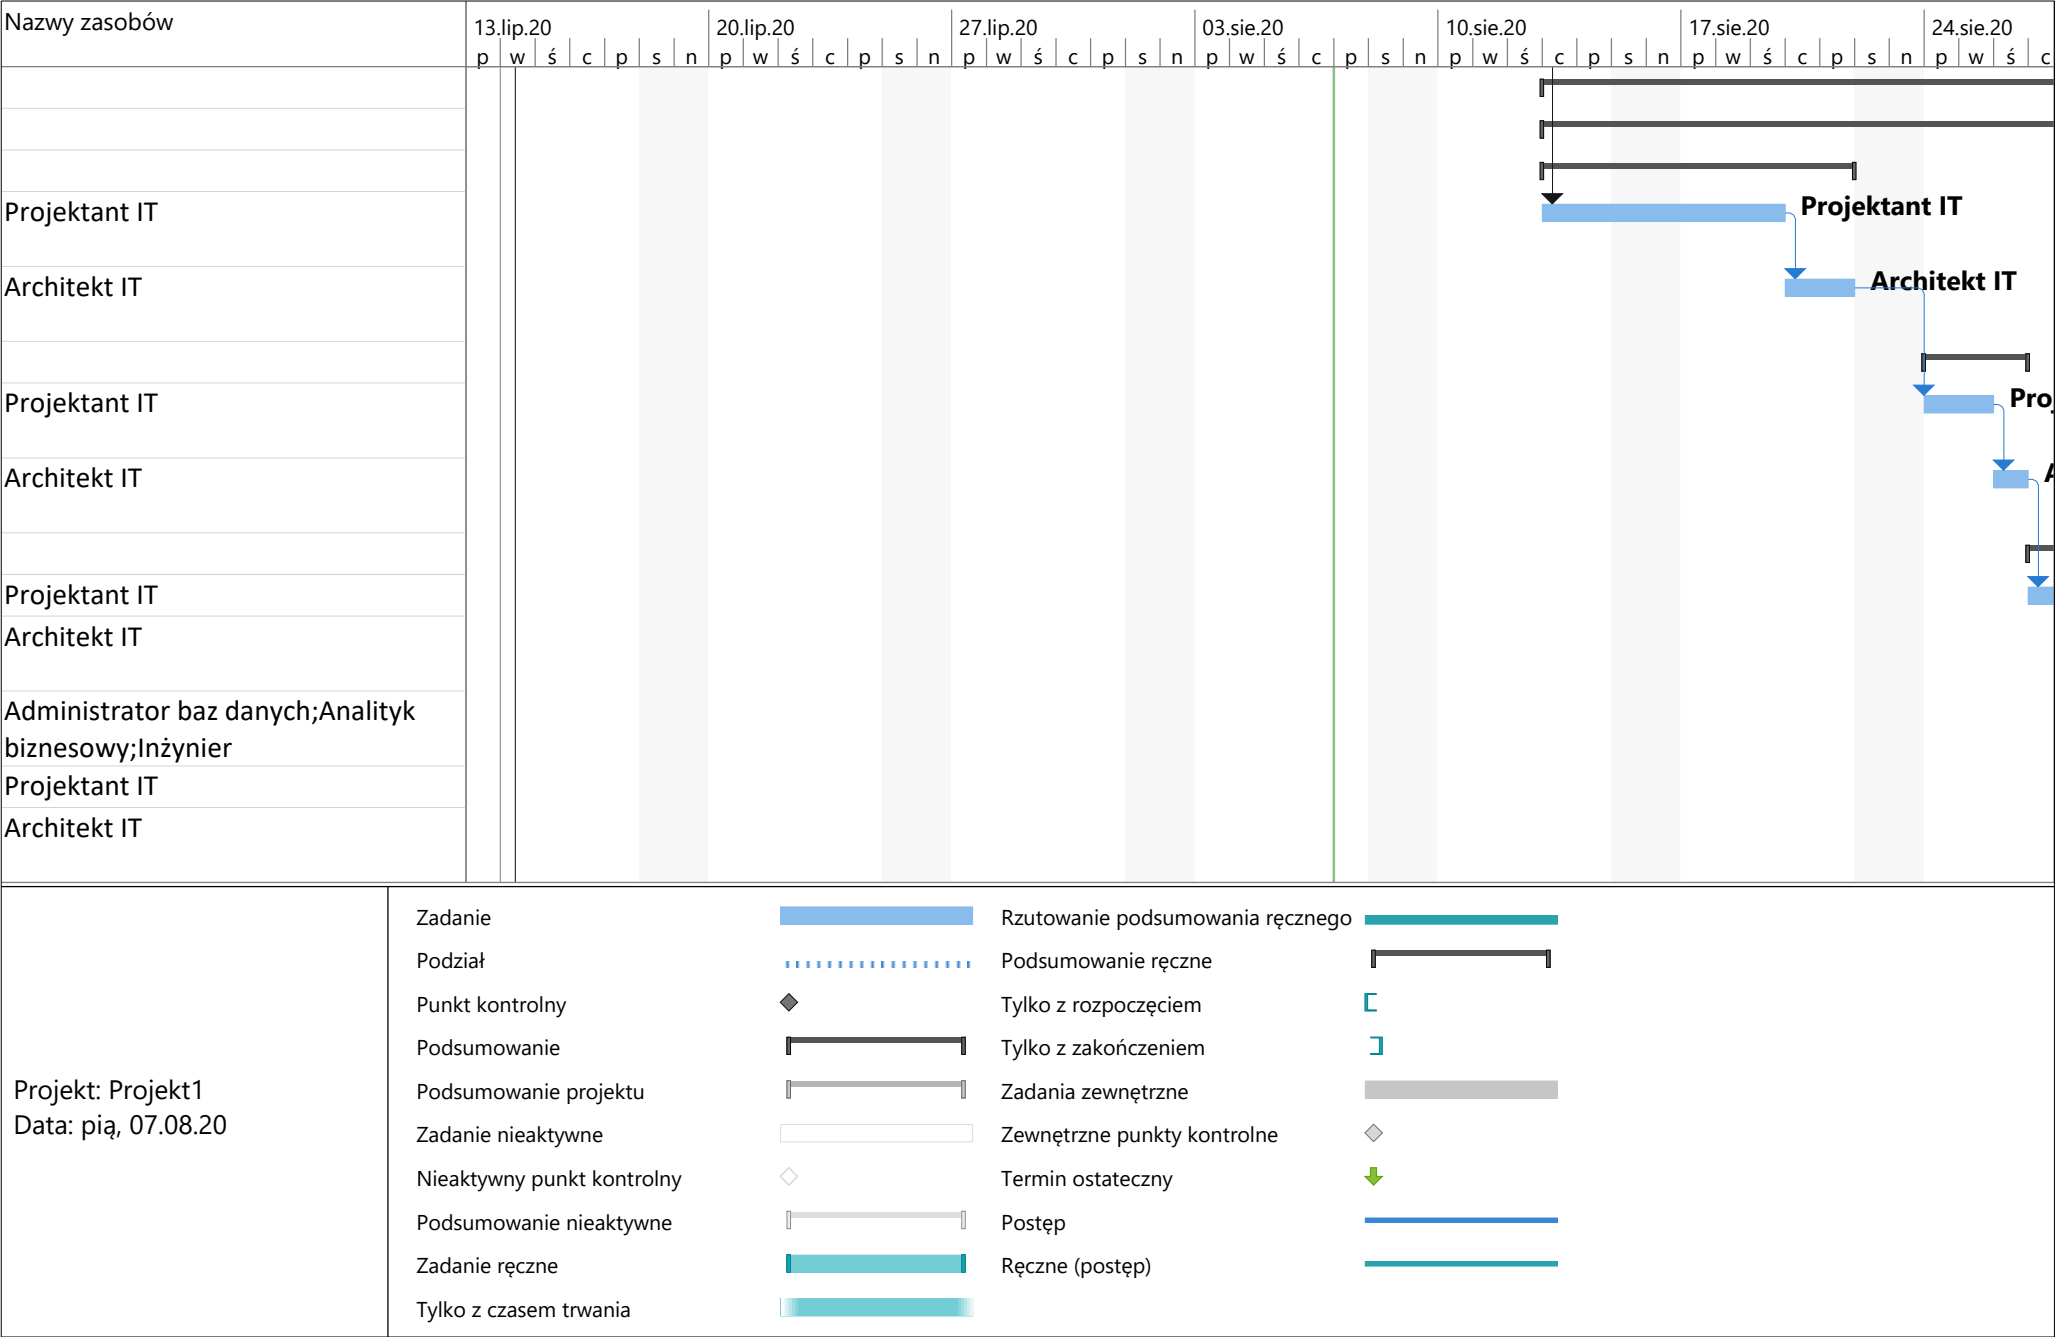














Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Wykonawca																																																	
Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	
Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	
Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	
Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	
Koordynator IT																																																	
Koordynator IT																																																	

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



[illegible]

Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Projektant IT																																																	
Wykonawca																																																	
Projektant IT																																																	
Wykonawca																																																	
Projektant IT;Architekt IT																																																	
Administrator baz danych;Analityk biznesowy;Architekt IT;Inżynier																																																	
Wykonawca																																																	
Architekt IT;Projektant IT																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Koordinator IT;Kierownik projektu																																																	
Inżynier systemowy																																																	

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




















Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Inżynier systemowy																																																	
Administrator baz danych																																																	
Administrator sieci																																																	
Administrator sieci																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Administrator baz danych																																																	
Administrator sieci																																																	
Administrator sieci																																																	
Inżynier systemowy																																																	

<div>Projekt: Projekt1</div> <div>Data: pią, 07.08.20</div>	Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>
	Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>
	Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>
	Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>
	Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>
	Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>
	Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>
	Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>
	Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>
	Tylko z czasem trwania	<div></div>		

Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Administrator baz danych																																																	
Administrator sieci																																																	
Administrator sieci																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	

<div>Projekt: Projekt1</div> <div>Data: pią, 07.08.20</div>	Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>
	Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>
	Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>
	Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>
	Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>
	Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>
	Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>
	Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>
	Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>
	Tylko z czasem trwania	<div></div>		

Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Projektant IT																																																	
Projektant IT																																																	
Kierownik projektu																																																	
Architekt IT																																																	
Architekt IT;Projektant IT;Kierownik projektu																																																	
Przewodniczący komitetu sterującego																																																	
Kierownik projektu																																																	




















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Tester																																																	
Projektant IT																																																	
Projektant IT																																																	
Kierownik projektu																																																	




















<div>Projekt: Projekt1</div> <div>Data: pią, 07.08.20</div>	Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>
	Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>
	Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>
	Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>
	Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>
	Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>
	Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>
	Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>
	Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>
	Tylko z czasem trwania	<div></div>		



Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Architekt IT																																																	
Architekt IT;Projektant IT;Kierownik projektu																																																	
Przewodniczący komitetu sterującego																																																	
Analitik biznesowy																																																	
Projektant IT																																																	
Kierownik projektu																																																	
Architekt IT;Projektant IT																																																	
Architekt IT;Kierownik projektu;Projektant IT																																																	

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych;Inżynier systemowy;Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	




















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			






















Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Obywatele;Tester;Urzednicy																																																	
Obywatele;Tester;Urzednicy																																																	
Administrator baz danych[33%]																																																	
Inzynier systemowy[33%]																																																	
Koordinator IT[33%]																																																	
Analitik biznesowy[33%]																																																	
Projektant IT[33%]																																																	
Kierownik projektu[33%]																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	

<div>Projekt: Projekt1</div> <div>Data: pią, 07.08.20</div>	Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>
	Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>
	Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>
	Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>
	Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>
	Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>
	Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>
	Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>
	Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>
	Tylko z czasem trwania	<div></div>		




















Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c			
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych;Inżynier systemowy;Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	
Obywatele;Tester;Urzednicy																																																	
Obywatele;Tester;Urzednicy																																																	
Administrator baz danych[33%]																																																	
Inzynier systemowy[33%]																																																	
Koordynator IT[33%]																																																	
Analitik biznesowy[33%]																																																	
Projektant IT[33%]																																																	
Kierownik projektu[33%]																																																	
Wykonawca																																																	

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




















Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych;Inżynier systemowy;Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	
Obywatele;Tester;Urzednicy																																																	
Obywatele;Tester;Urzednicy																																																	
Administrator baz danych[33%]																																																	
Inzynier systemowy[33%]																																																	
Koordynator IT[33%]																																																	
Analitik biznesowy[33%]																																																	
Projektant IT[33%]																																																	
Kierownik projektu[33%]																																																	

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych;Inżynier systemowy;Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	
Tester																																																	
Tester																																																	




















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Tester																																																	
Administrator baz danych[33%]																																																	
Inżynier systemowy[33%]																																																	
Koordynator IT[33%]																																																	
Analitik biznesowy[33%]																																																	
Projektant IT[33%]																																																	
Kierownik projektu[33%]																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych;Inżynier systemowy;Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Tester																																																	
Tester																																																	
Administrator baz danych[33%]																																																	
Inżynier systemowy[33%]																																																	
Koordynator IT[33%]																																																	
Analitik biznesowy[33%]																																																	
Projektant IT[33%]																																																	
Kierownik projektu[33%]																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Administrator baz danych;Inżynier systemowy;Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	
Tester																																																	
Projektant IT;Architekt IT																																																	
Architekt IT																																																	
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych;Inżynier systemowy;Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych;Inżynier systemowy;Koordynator IT																																																	

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny

Postęp




















Ręczne (postęp)

Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Administrator baz danych;Administrator sieci;Architekt IT;Inżynier systemowy;Kierownik																																																	
Inżynier systemowy																																																	
Administrator baz danych																																																	
Administrator sieci																																																	
Koordynator IT																																																	
Kierownik projektu																																																	
Wykonawca																																																	
Tester																																																	
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych[33%];Administrator																																																	




















<div>Projekt: Projekt1</div> <div>Data: pią, 07.08.20</div>	Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>
	Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>
	Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>
	Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>
	Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>
	Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>
	Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>
	Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>
	Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>
	Tylko z czasem trwania	<div></div>		






















Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych;Analityk bizr																																																	
Koordinat																																																	
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych[33%];Admin																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych;Inżynier systemowy;Koordynator IT																																																	

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych[33%];Admin																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych;Inżynier systemowy;Koordynator IT																																																	
Wykonawca																																																	
Wykonawca																																																	
Administrator baz danych;Analityk bizr																																																	
Koordynator IT																																																	

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Wykonawca;Obywatele;Urzednicy																																																	
Wykonawca																																																	
Kierownik projektu;Koordynator IT;Właściciel biznesowy																																																	
Właściciel biznesowy																																																	
Wykonawca																																																	
Obywatele																																																	
Wykonawca																																																	
Obywatele																																																	
Wykonawca																																																	
Właściciel biznesowy																																																	




















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			









Nazwy zasobów	13.lip.20							20.lip.20							27.lip.20							03.sie.20							10.sie.20							17.sie.20							24.sie.20						
	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c										
Kierownik projektu																																																	
Administrator baz danych;Administrator sieci;Inżynier																																																	
Administrator baz danych[25%];Admin																																																	
Kierownik projektu																																																	
Urzędnicy;Wykonawca																																																	
Administrator baz danych;Administrator																																																	
Administrator baz danych;Administrator																																																	
Przewodniczący komitetu sterującego																																																	
Obywatele;Urzędnicy																																																	
Wykonawca																																																	

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




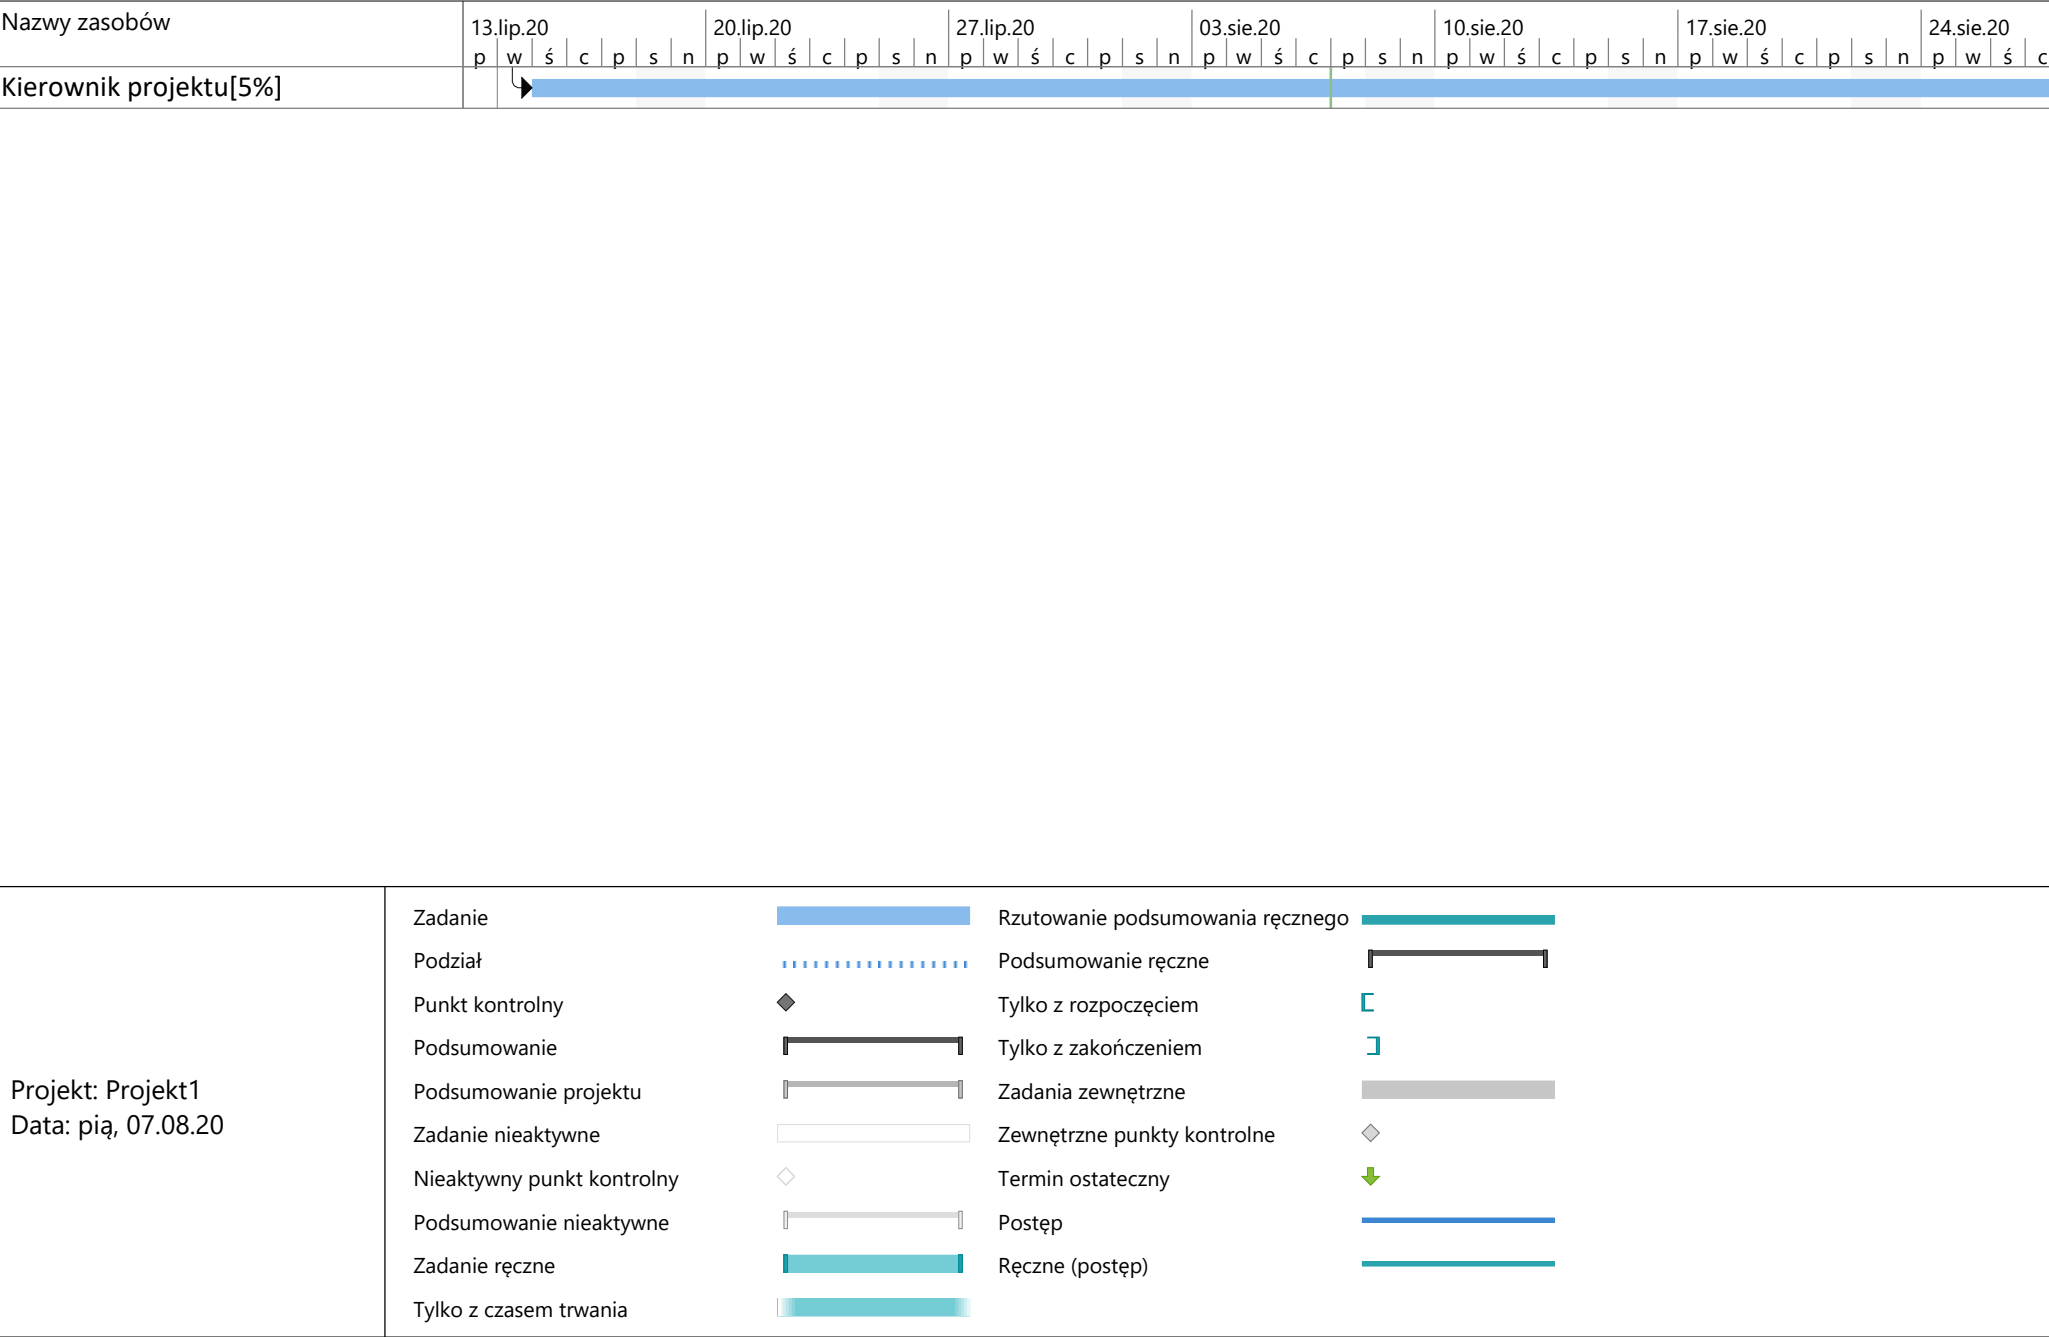



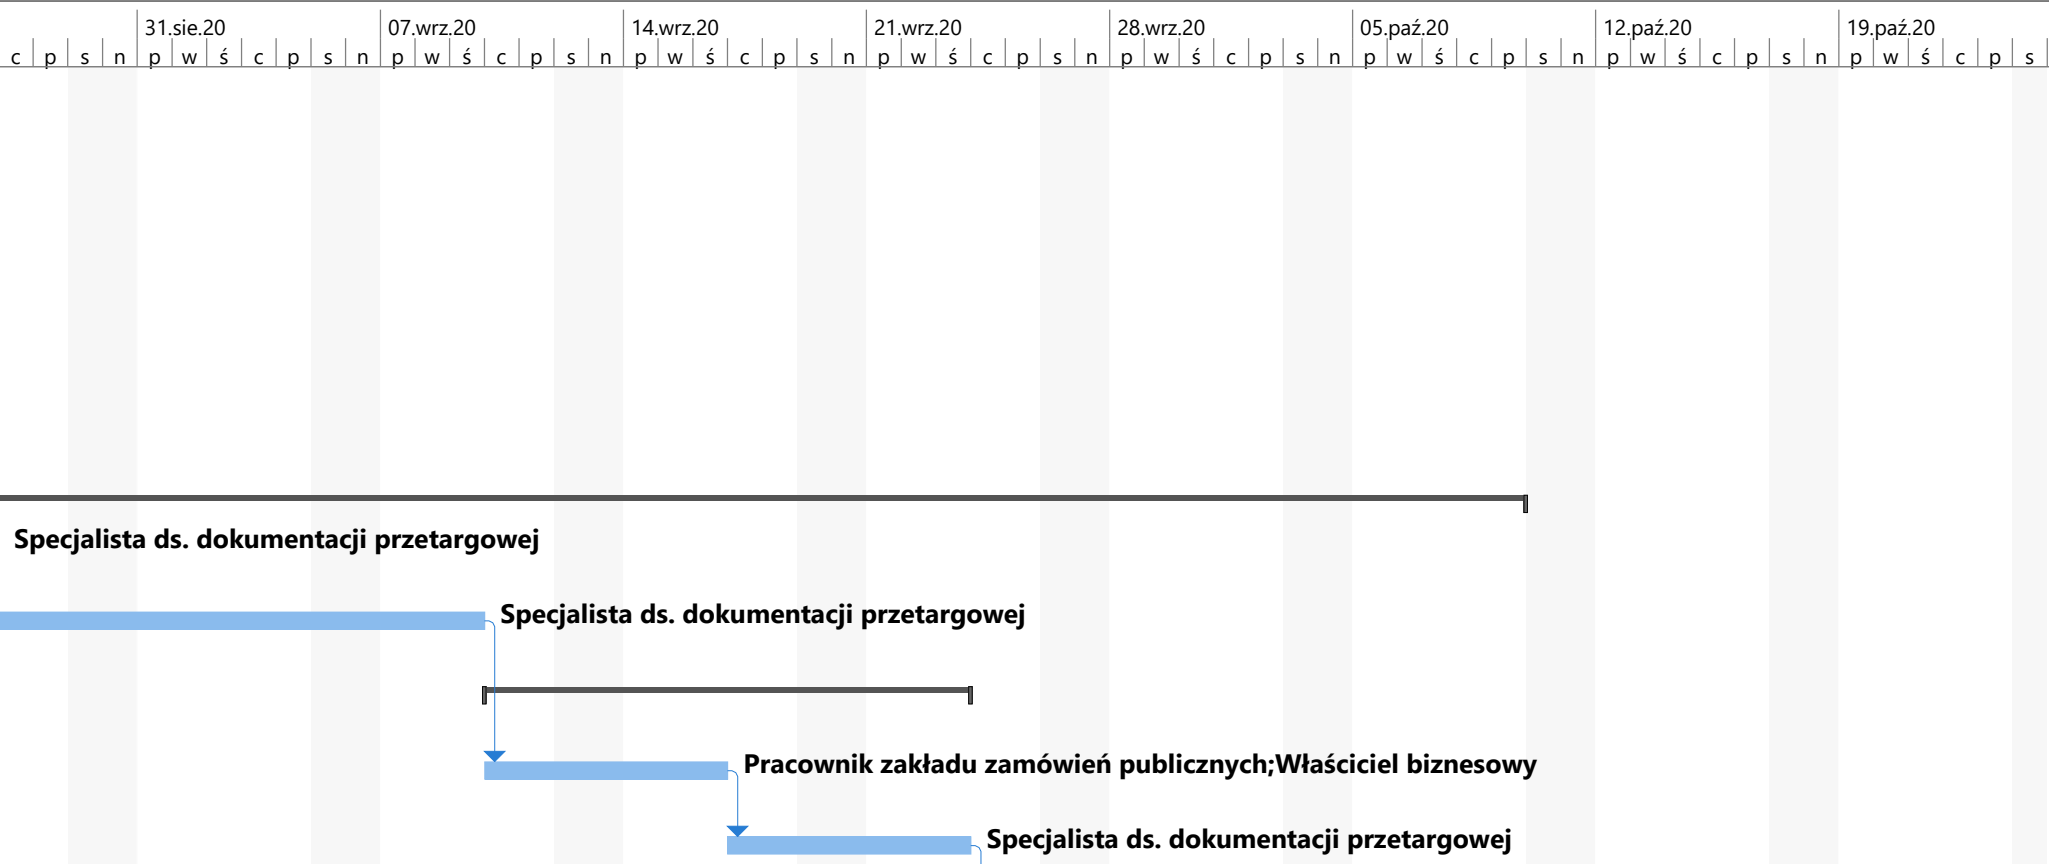




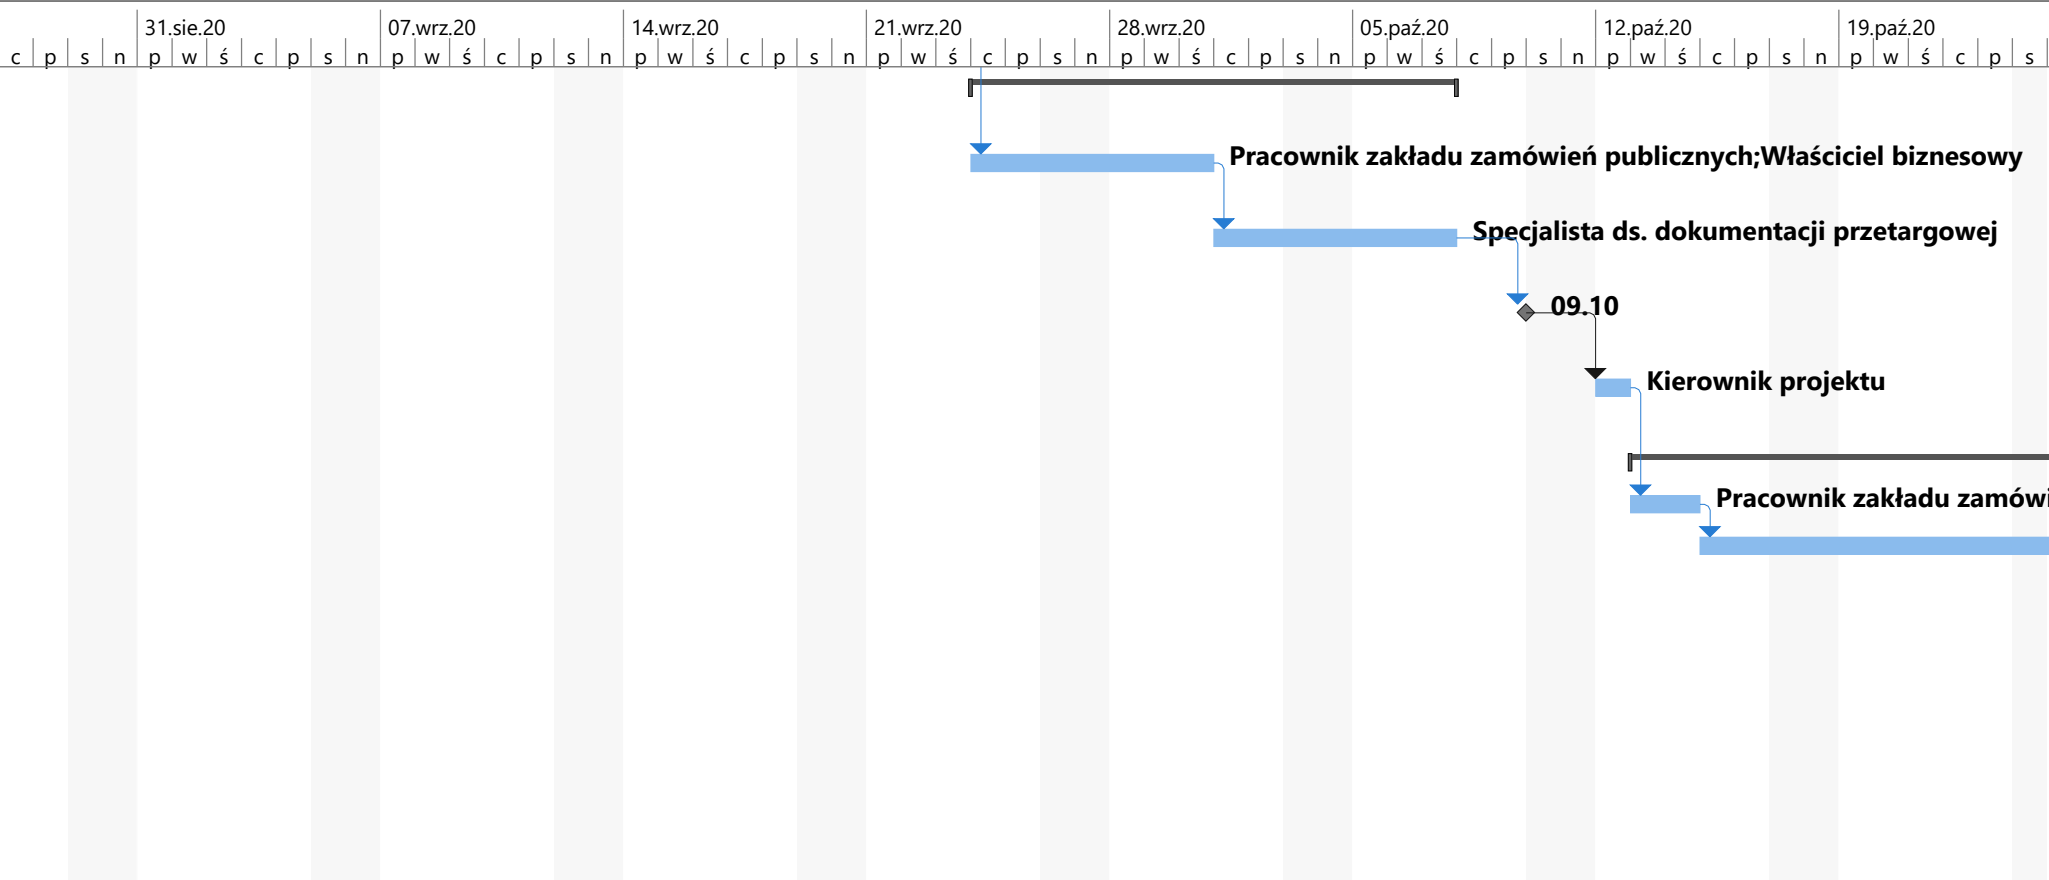





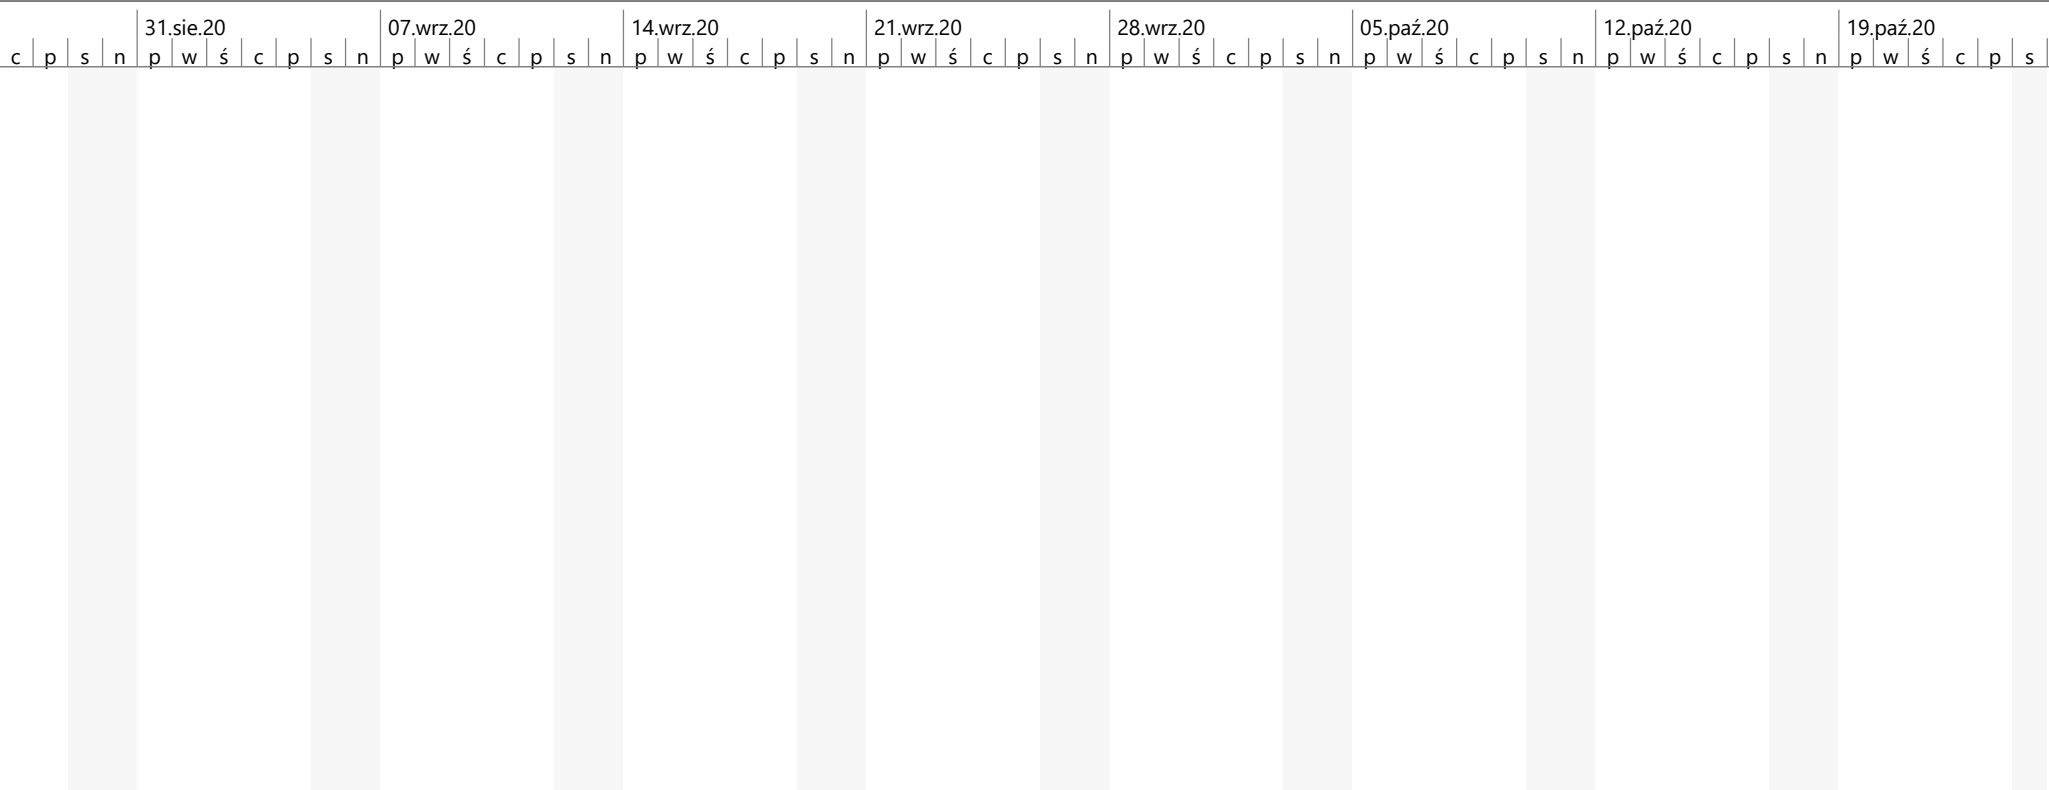










Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			









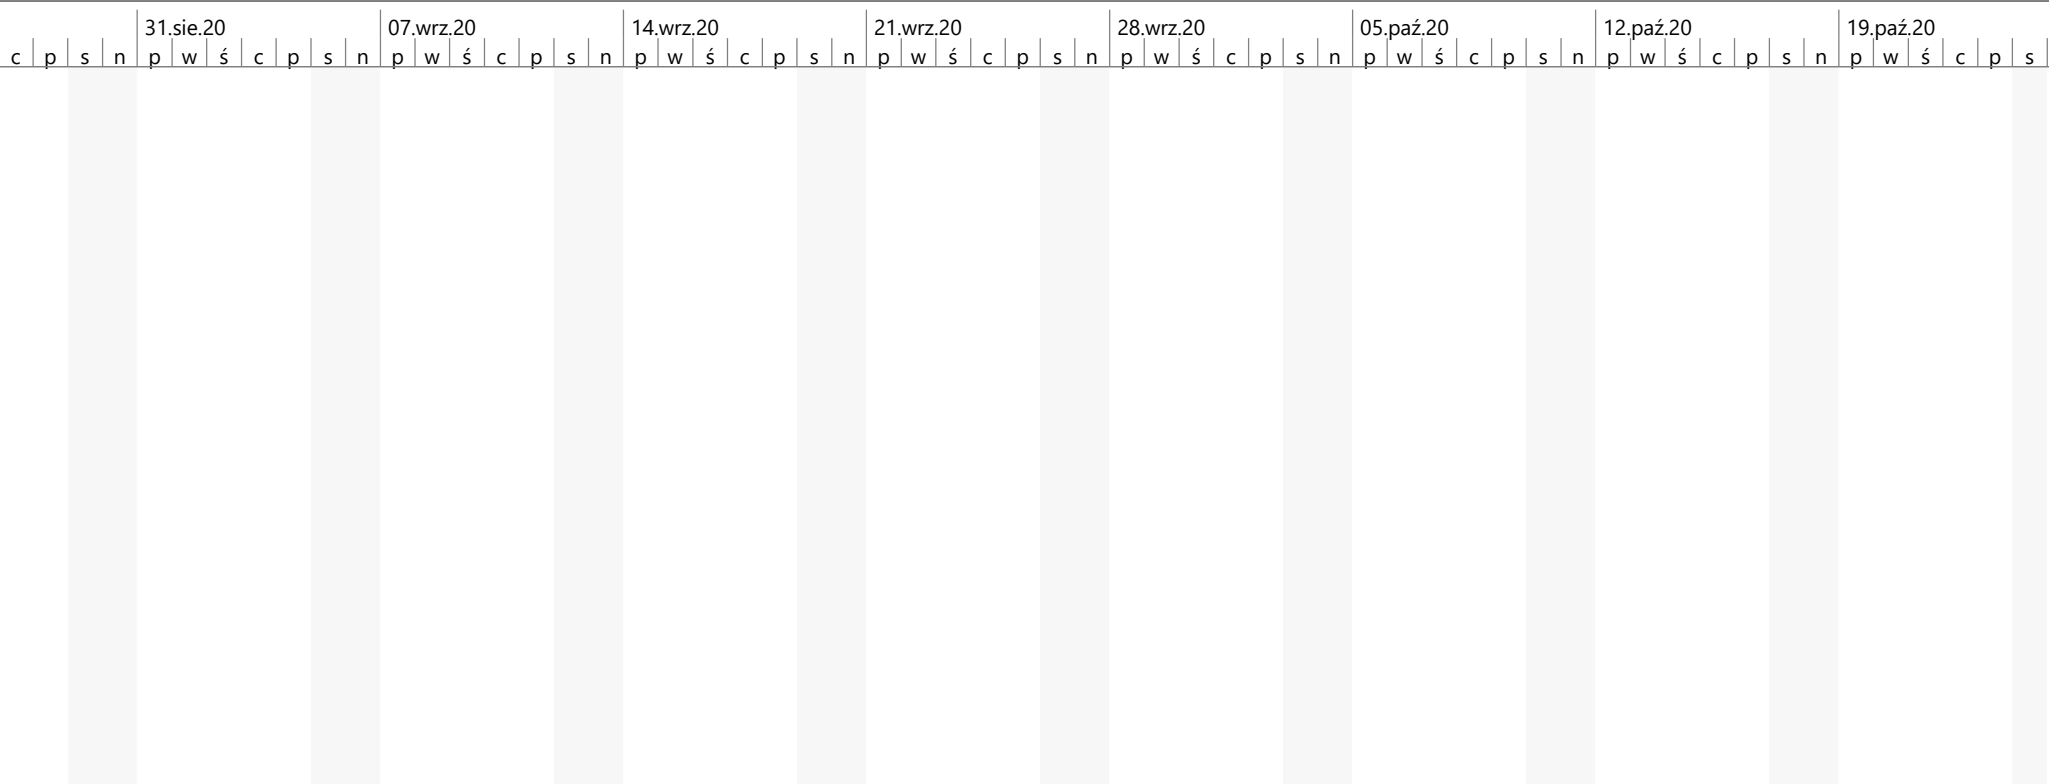












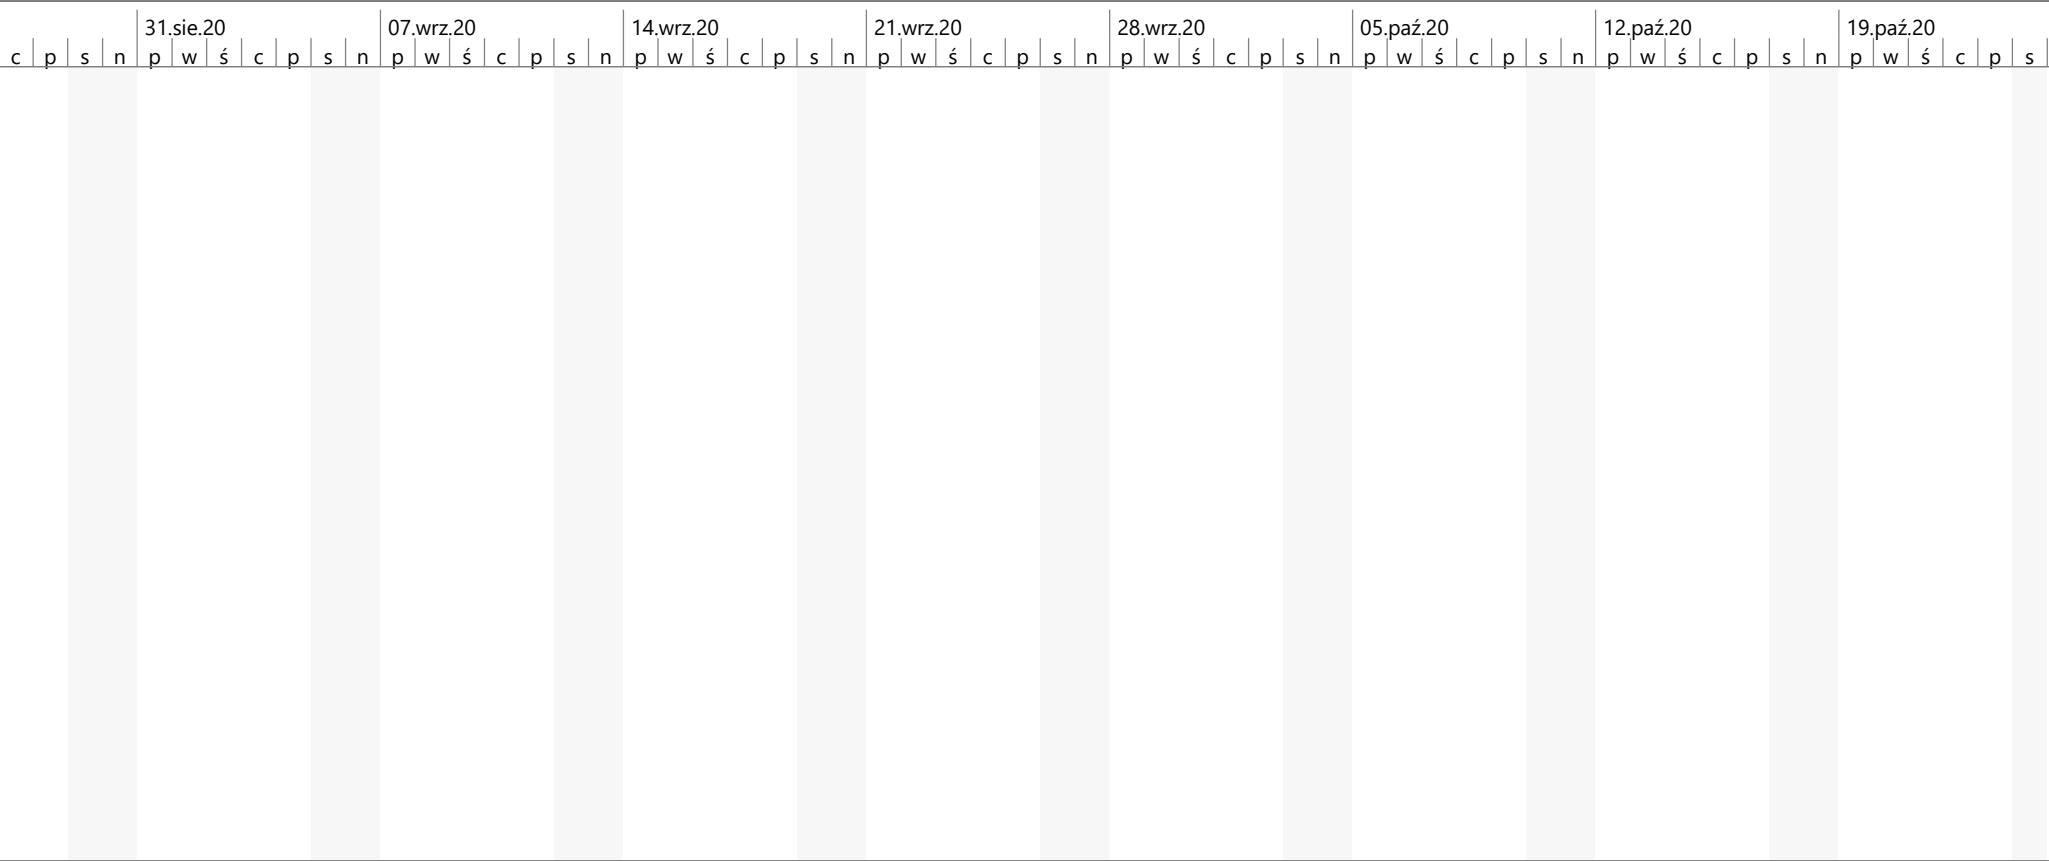





















Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

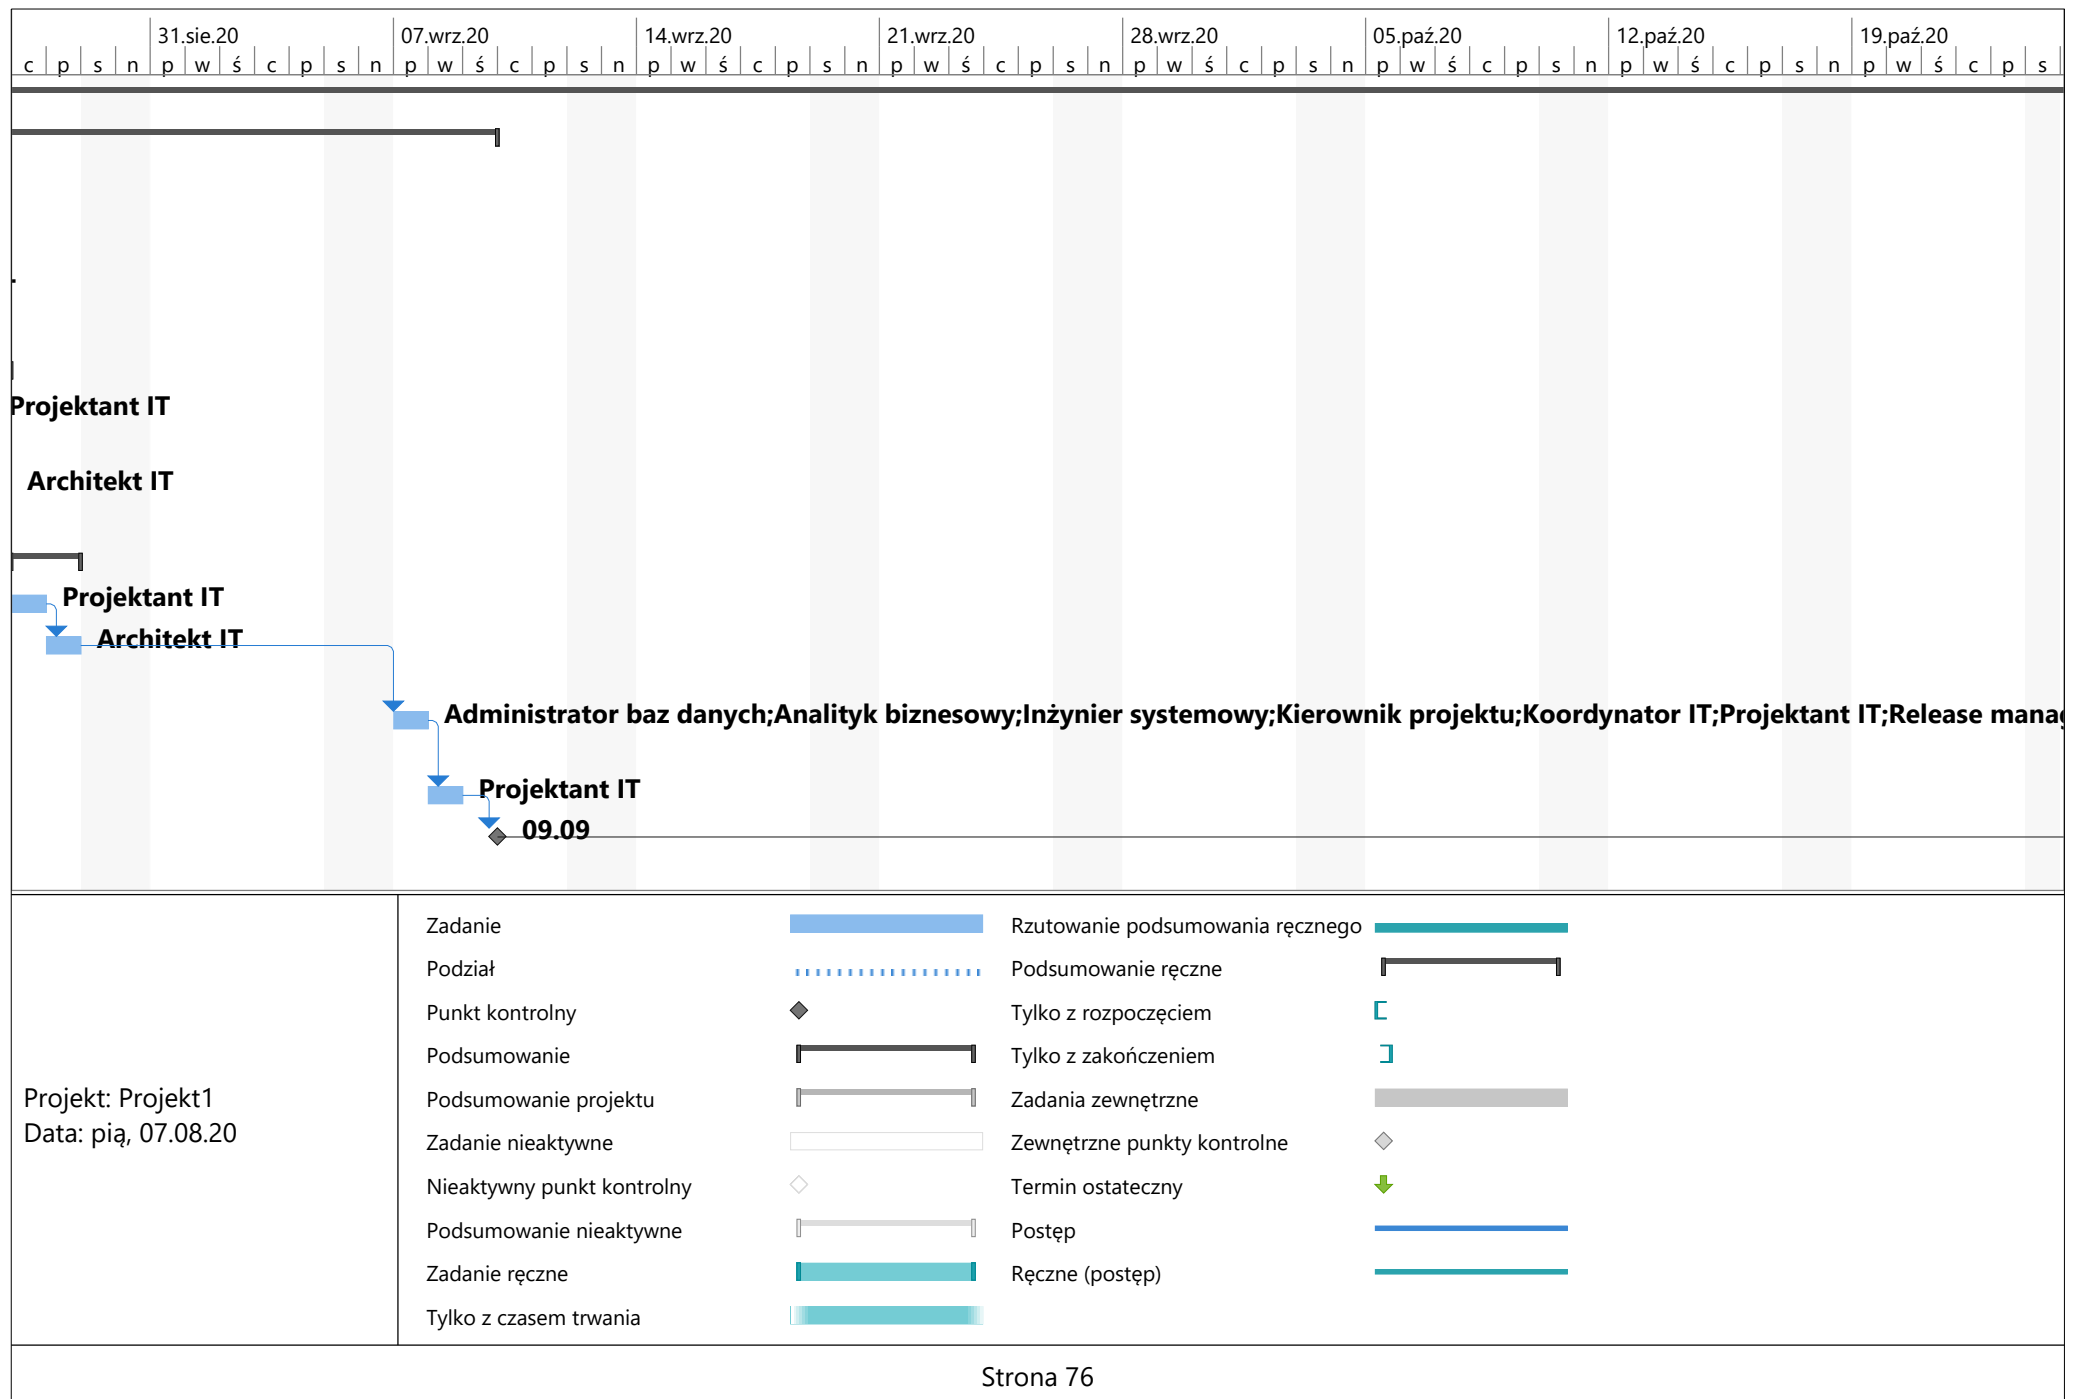




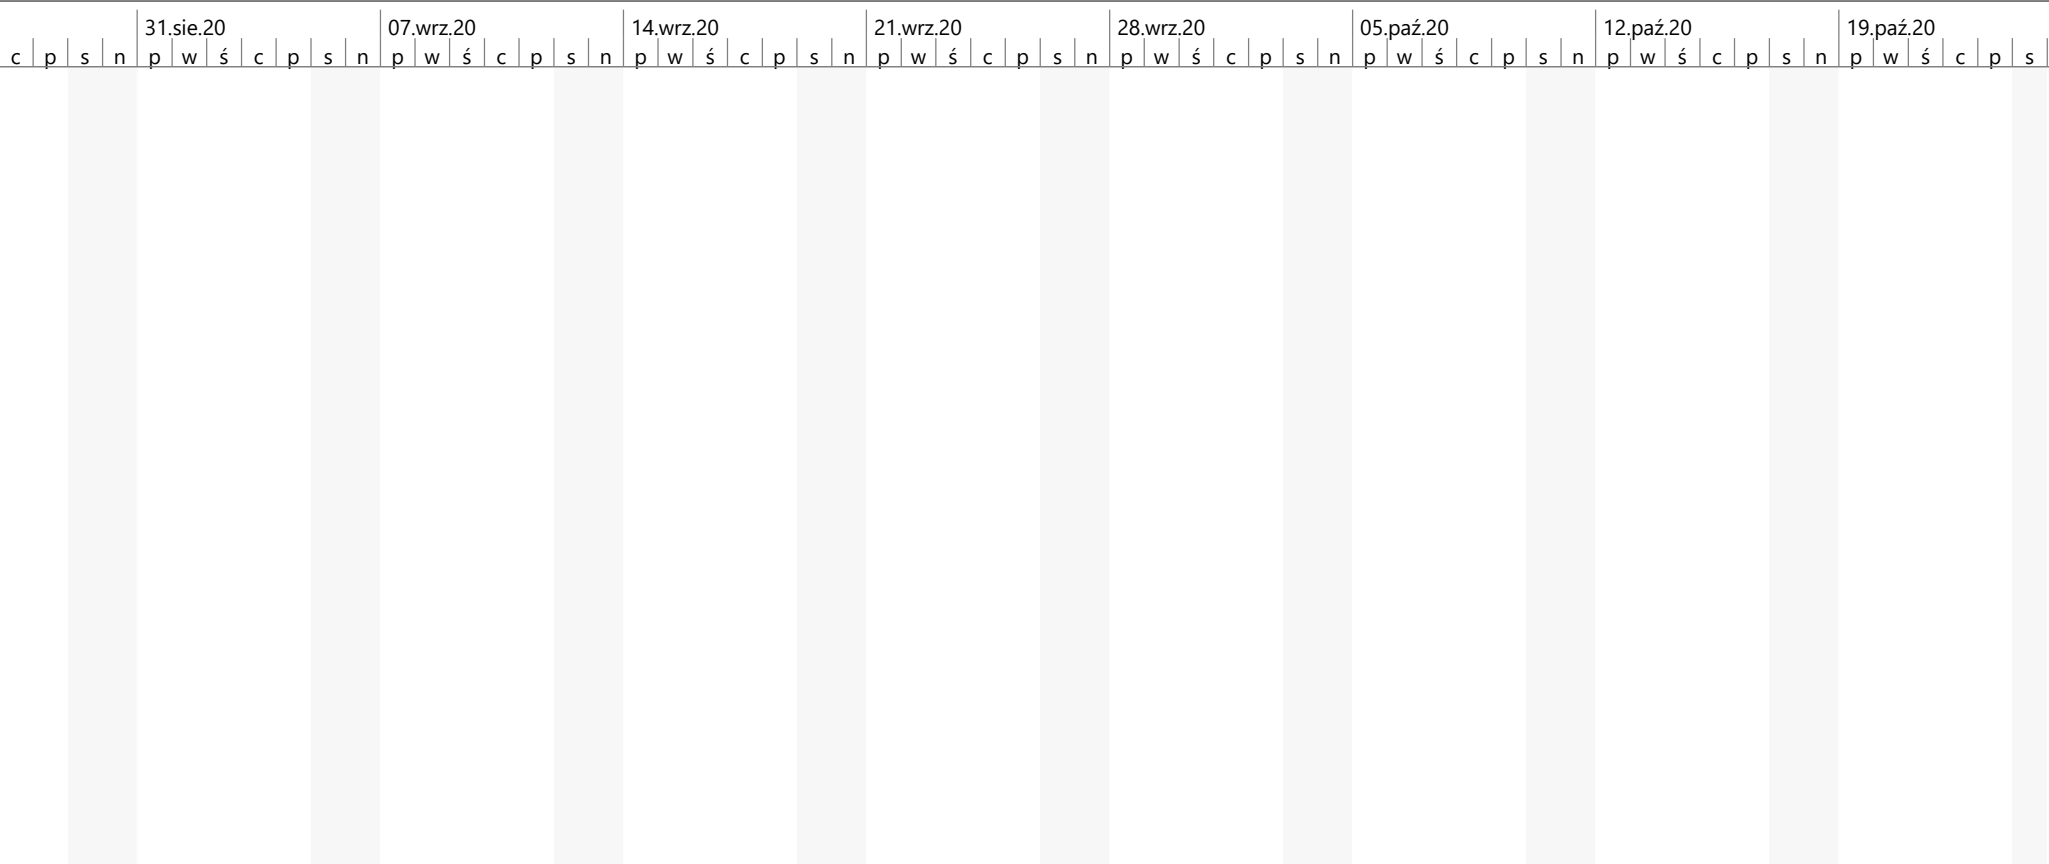







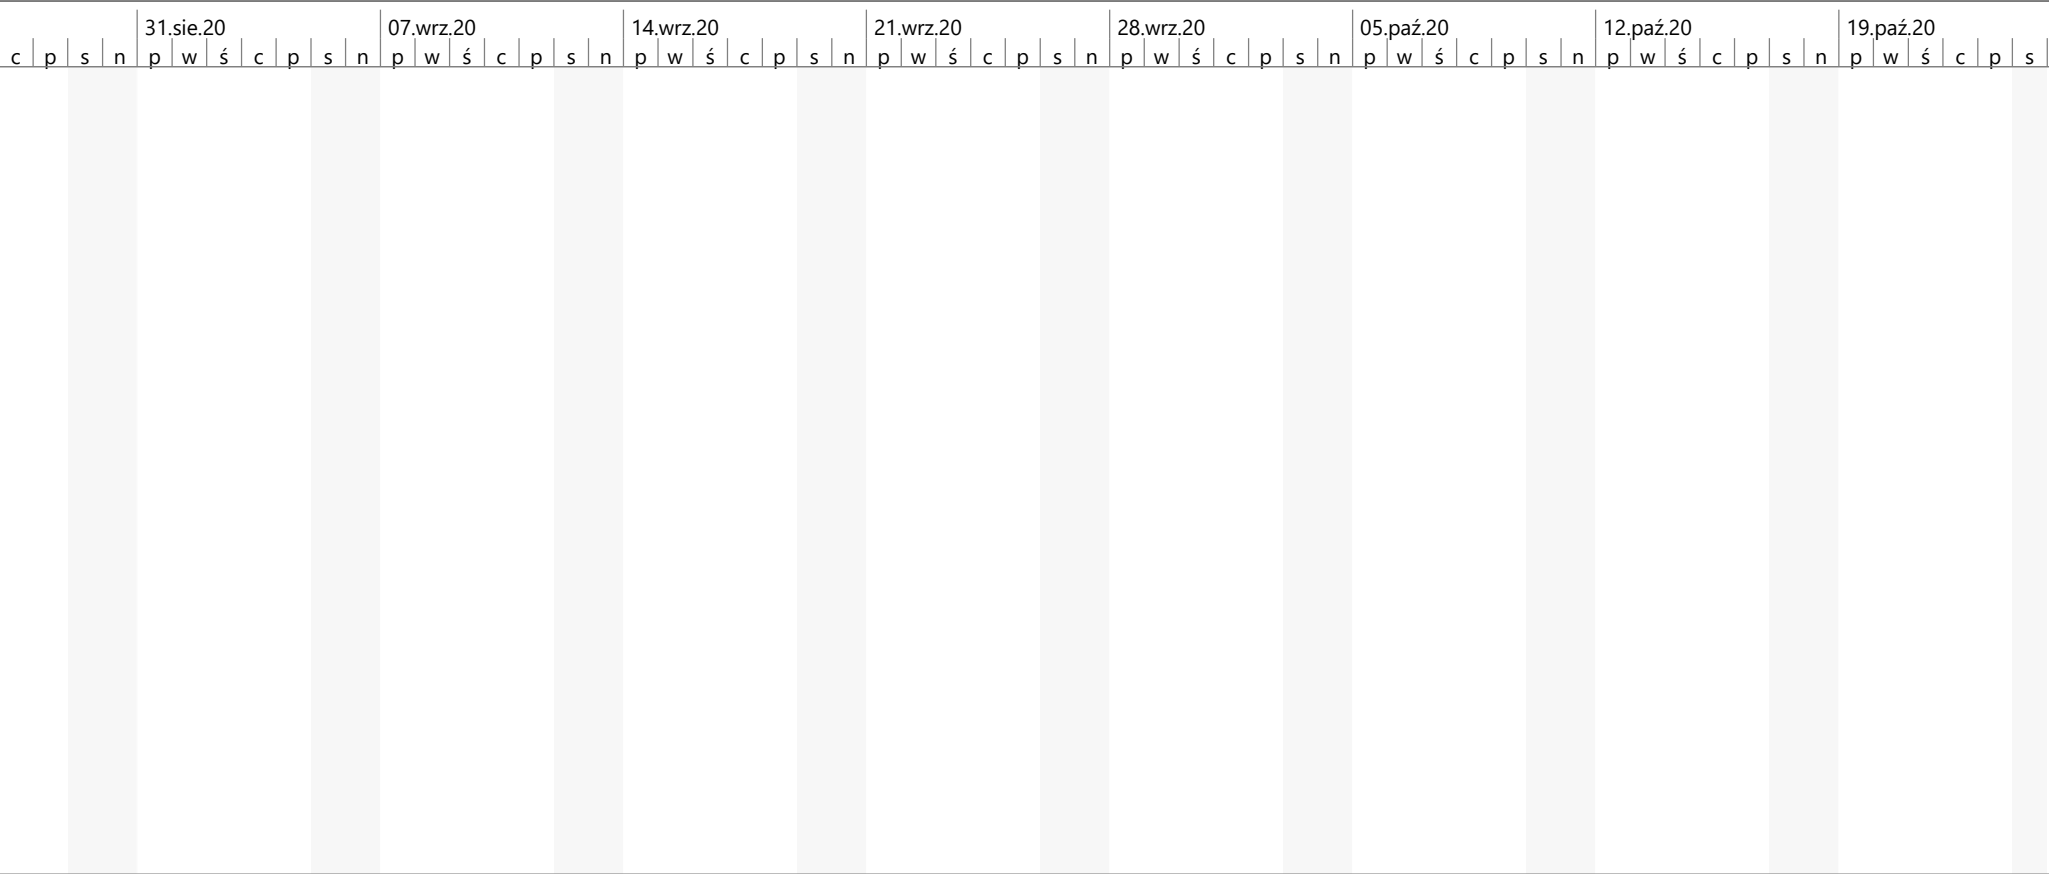












Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

























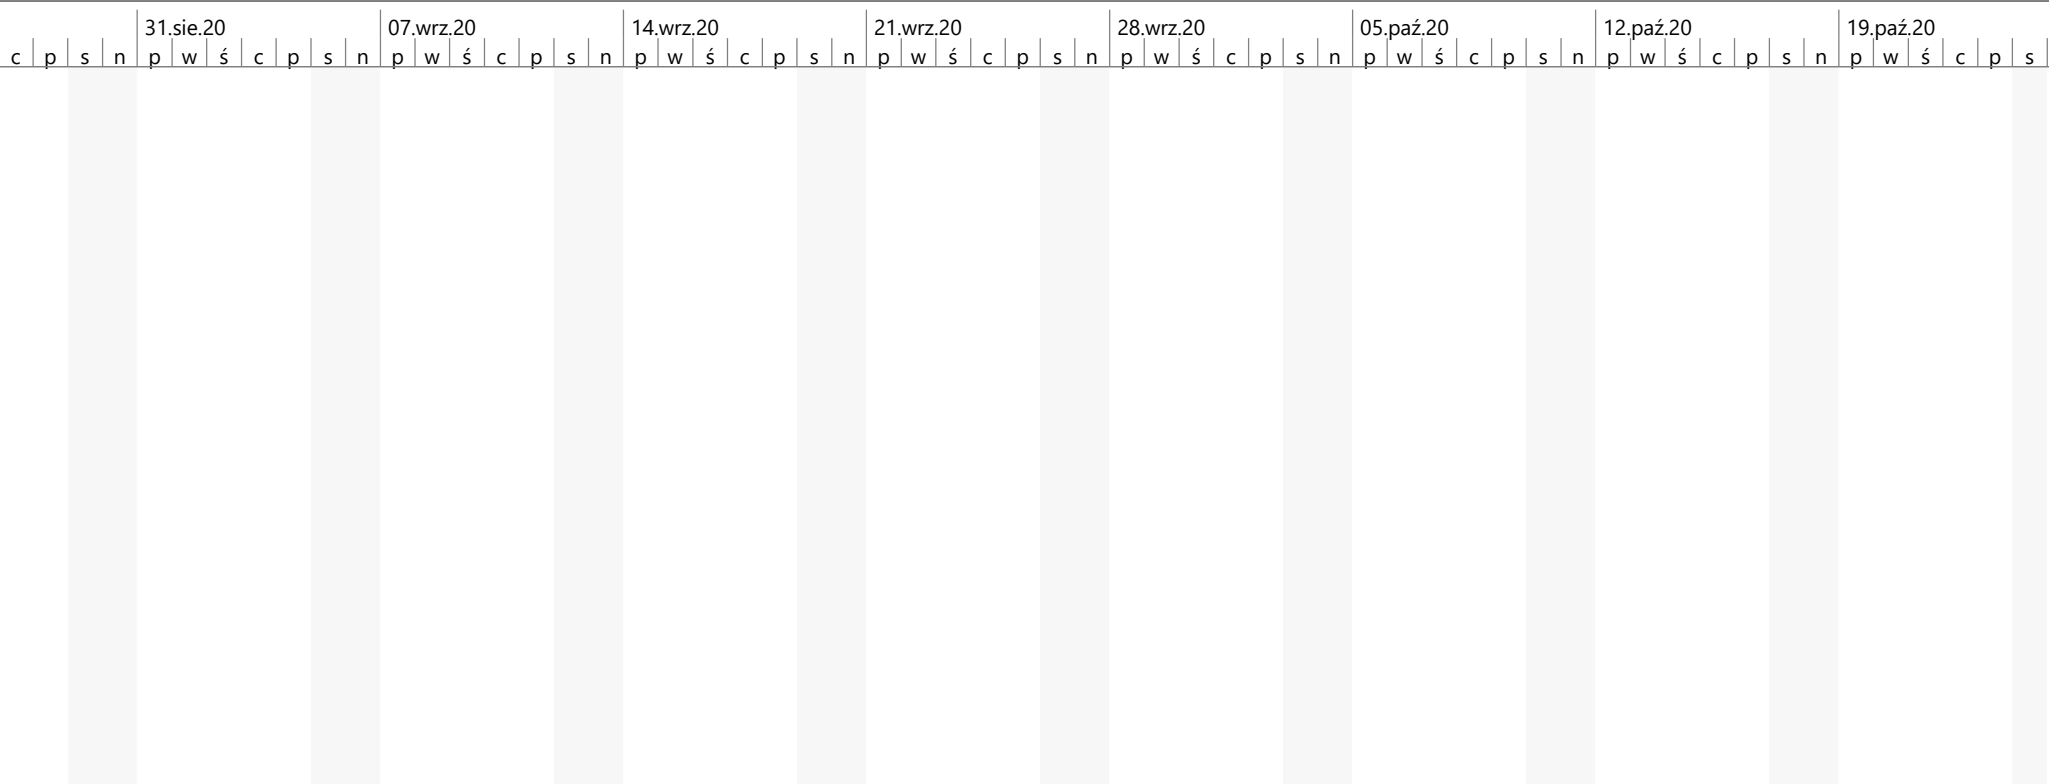
Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20




















Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			












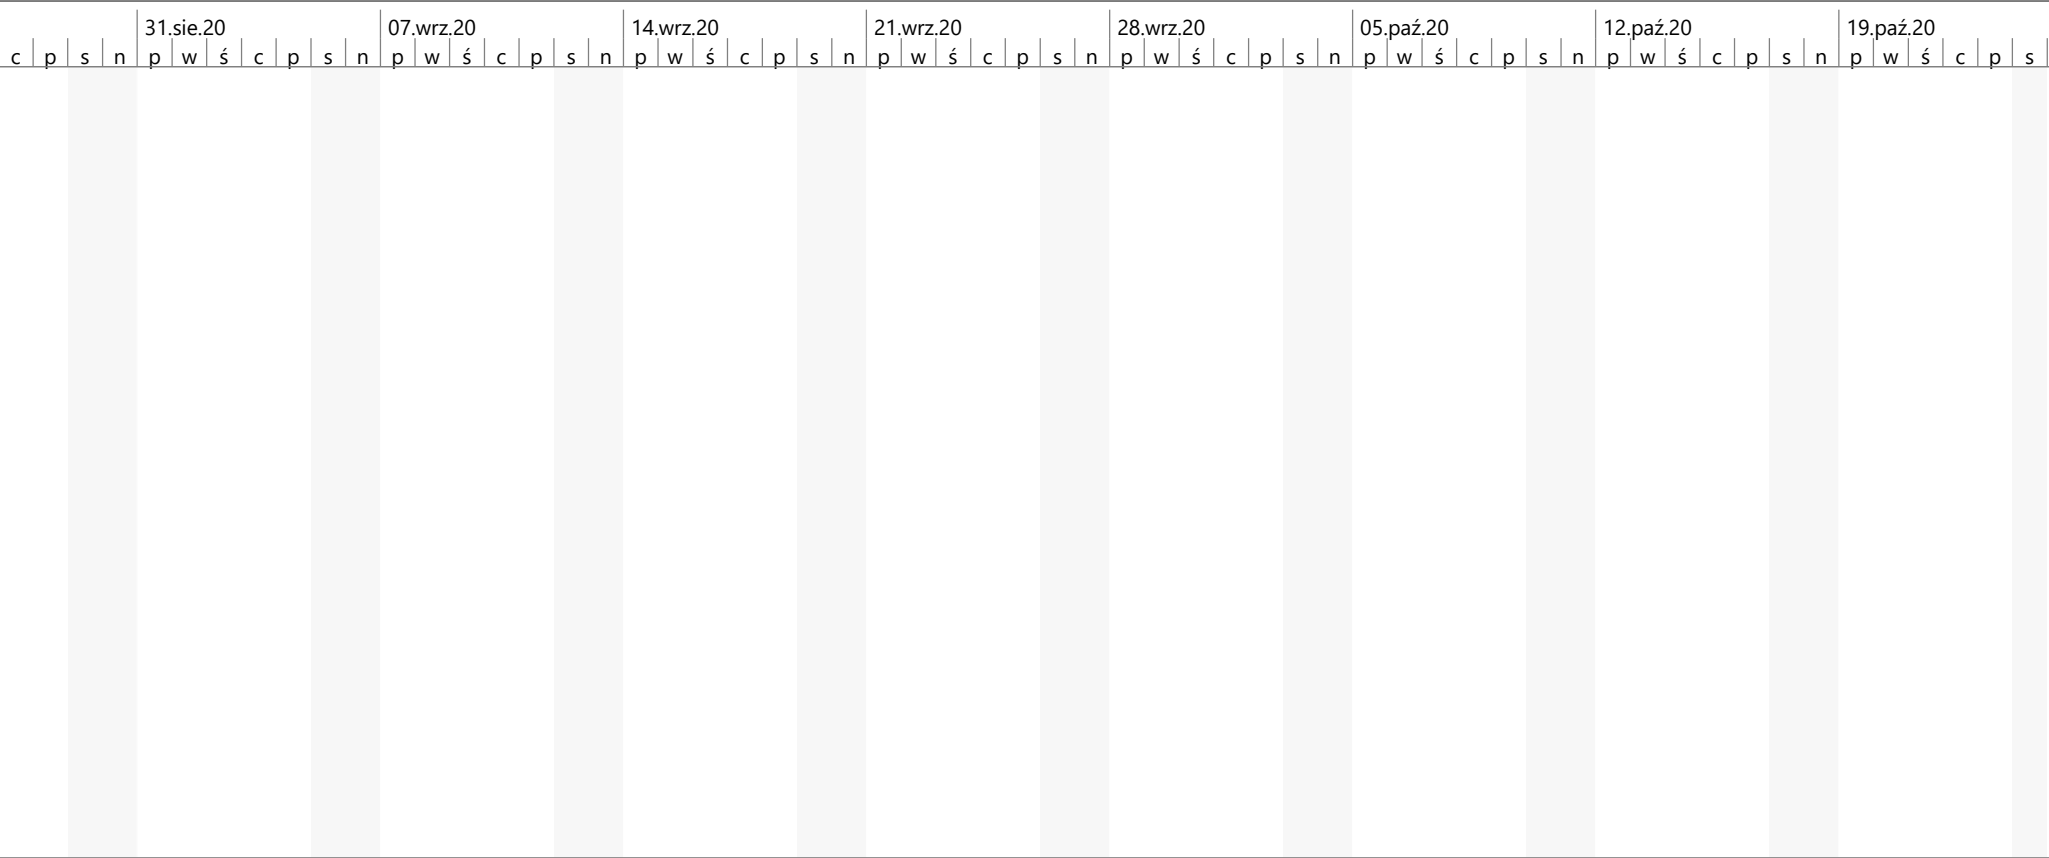













Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20









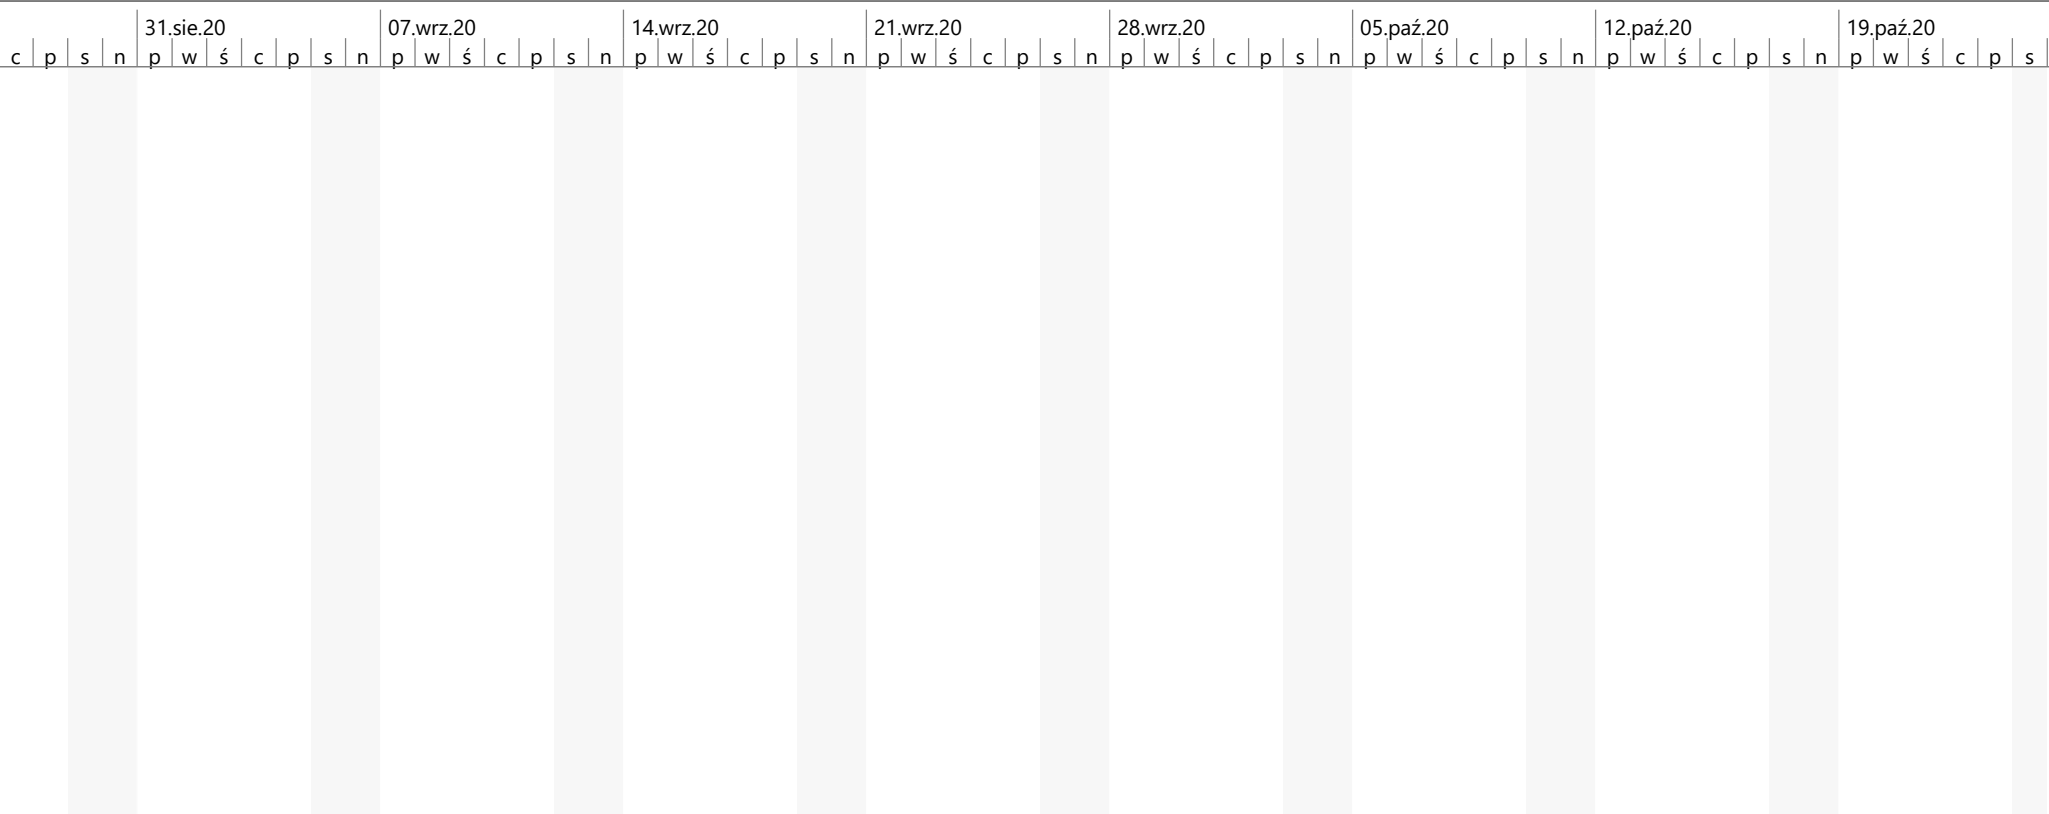










Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			









Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			































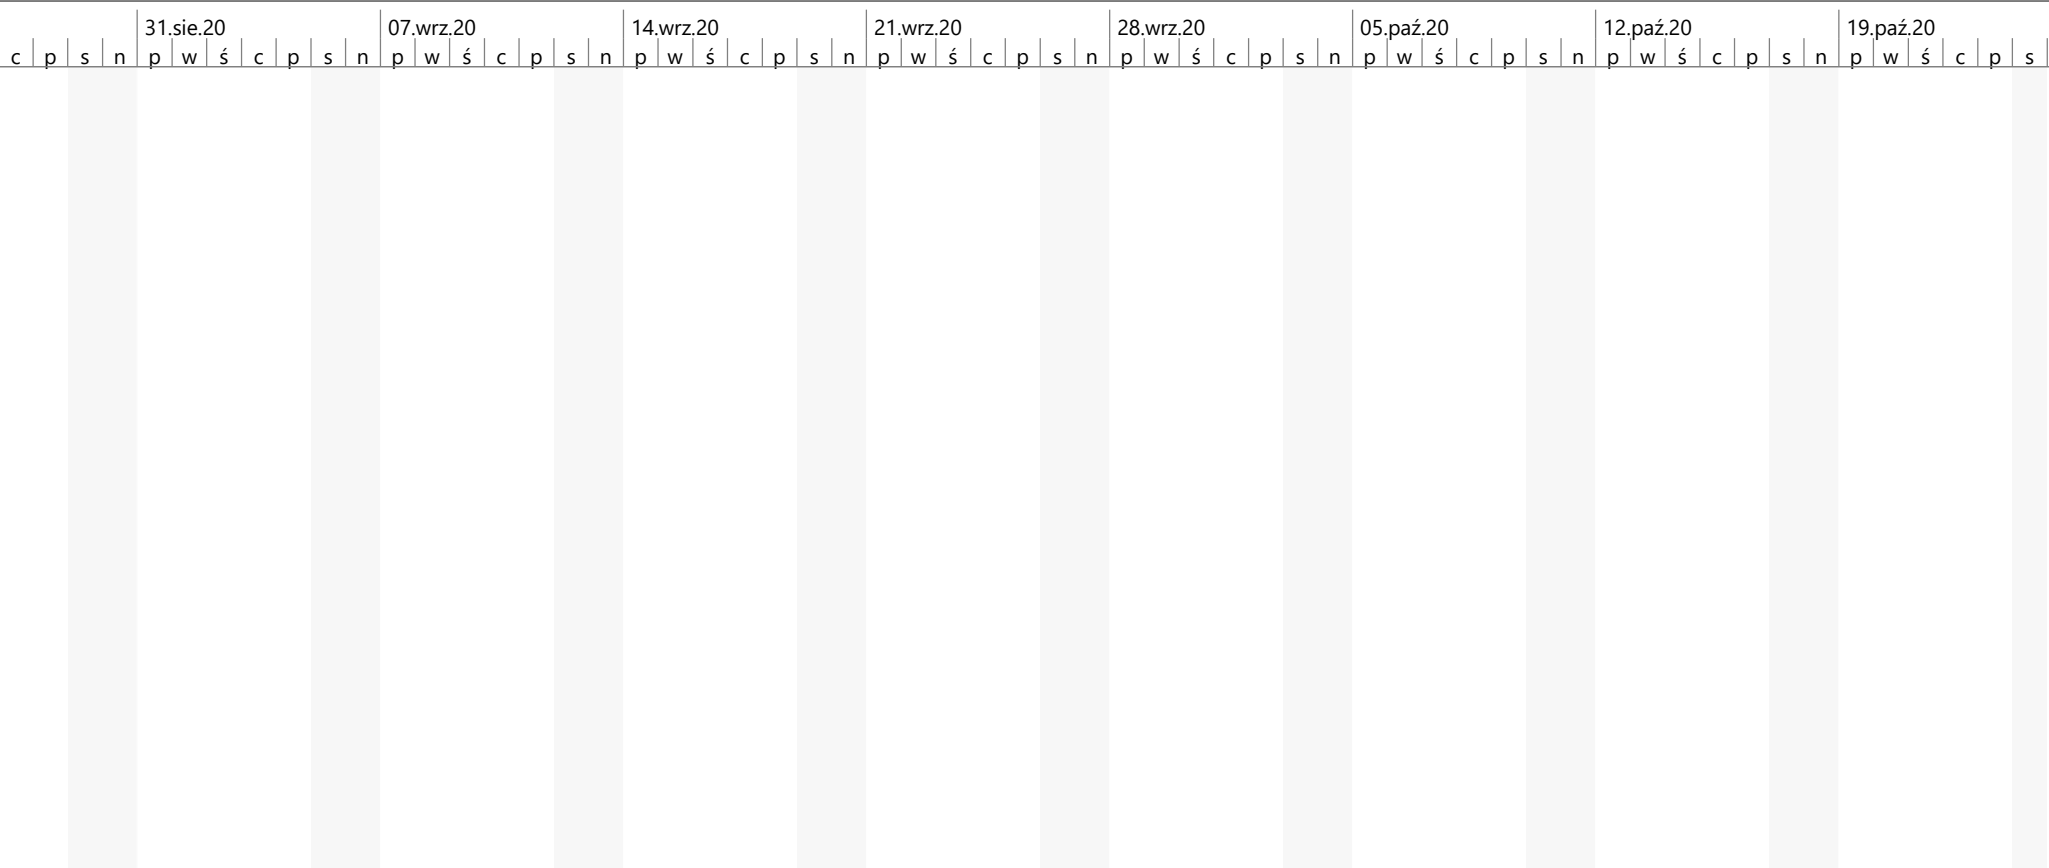
[illegible]

Projekt: Projekt1		Data: pią, 07.08.20	
Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			














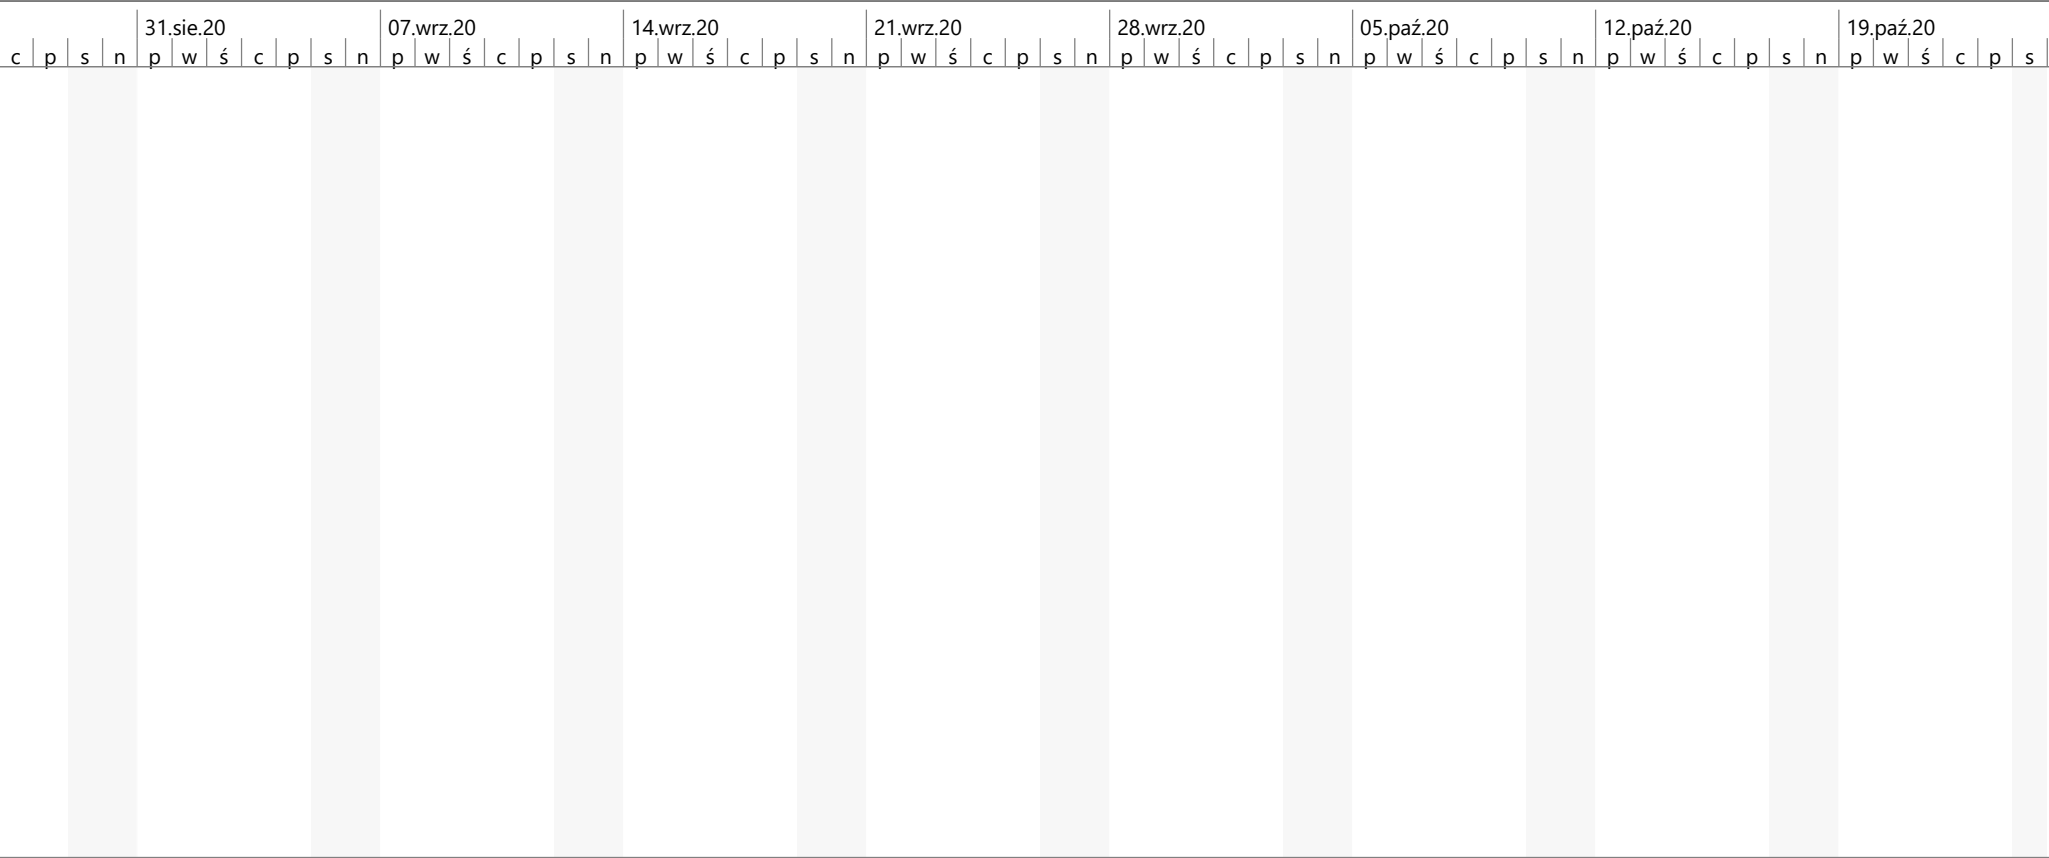










Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			


























Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			





				31.sie.20				07.wrz.20				14.wrz.20				21.wrz.20				28.wrz.20				05.paź.20				12.paź.20				19.paź.20													
c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20


Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>
Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>
Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>
Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>
Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>
Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>
Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>
Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>
Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>
Tylko z czasem trwania	<div></div>		

Strona 102








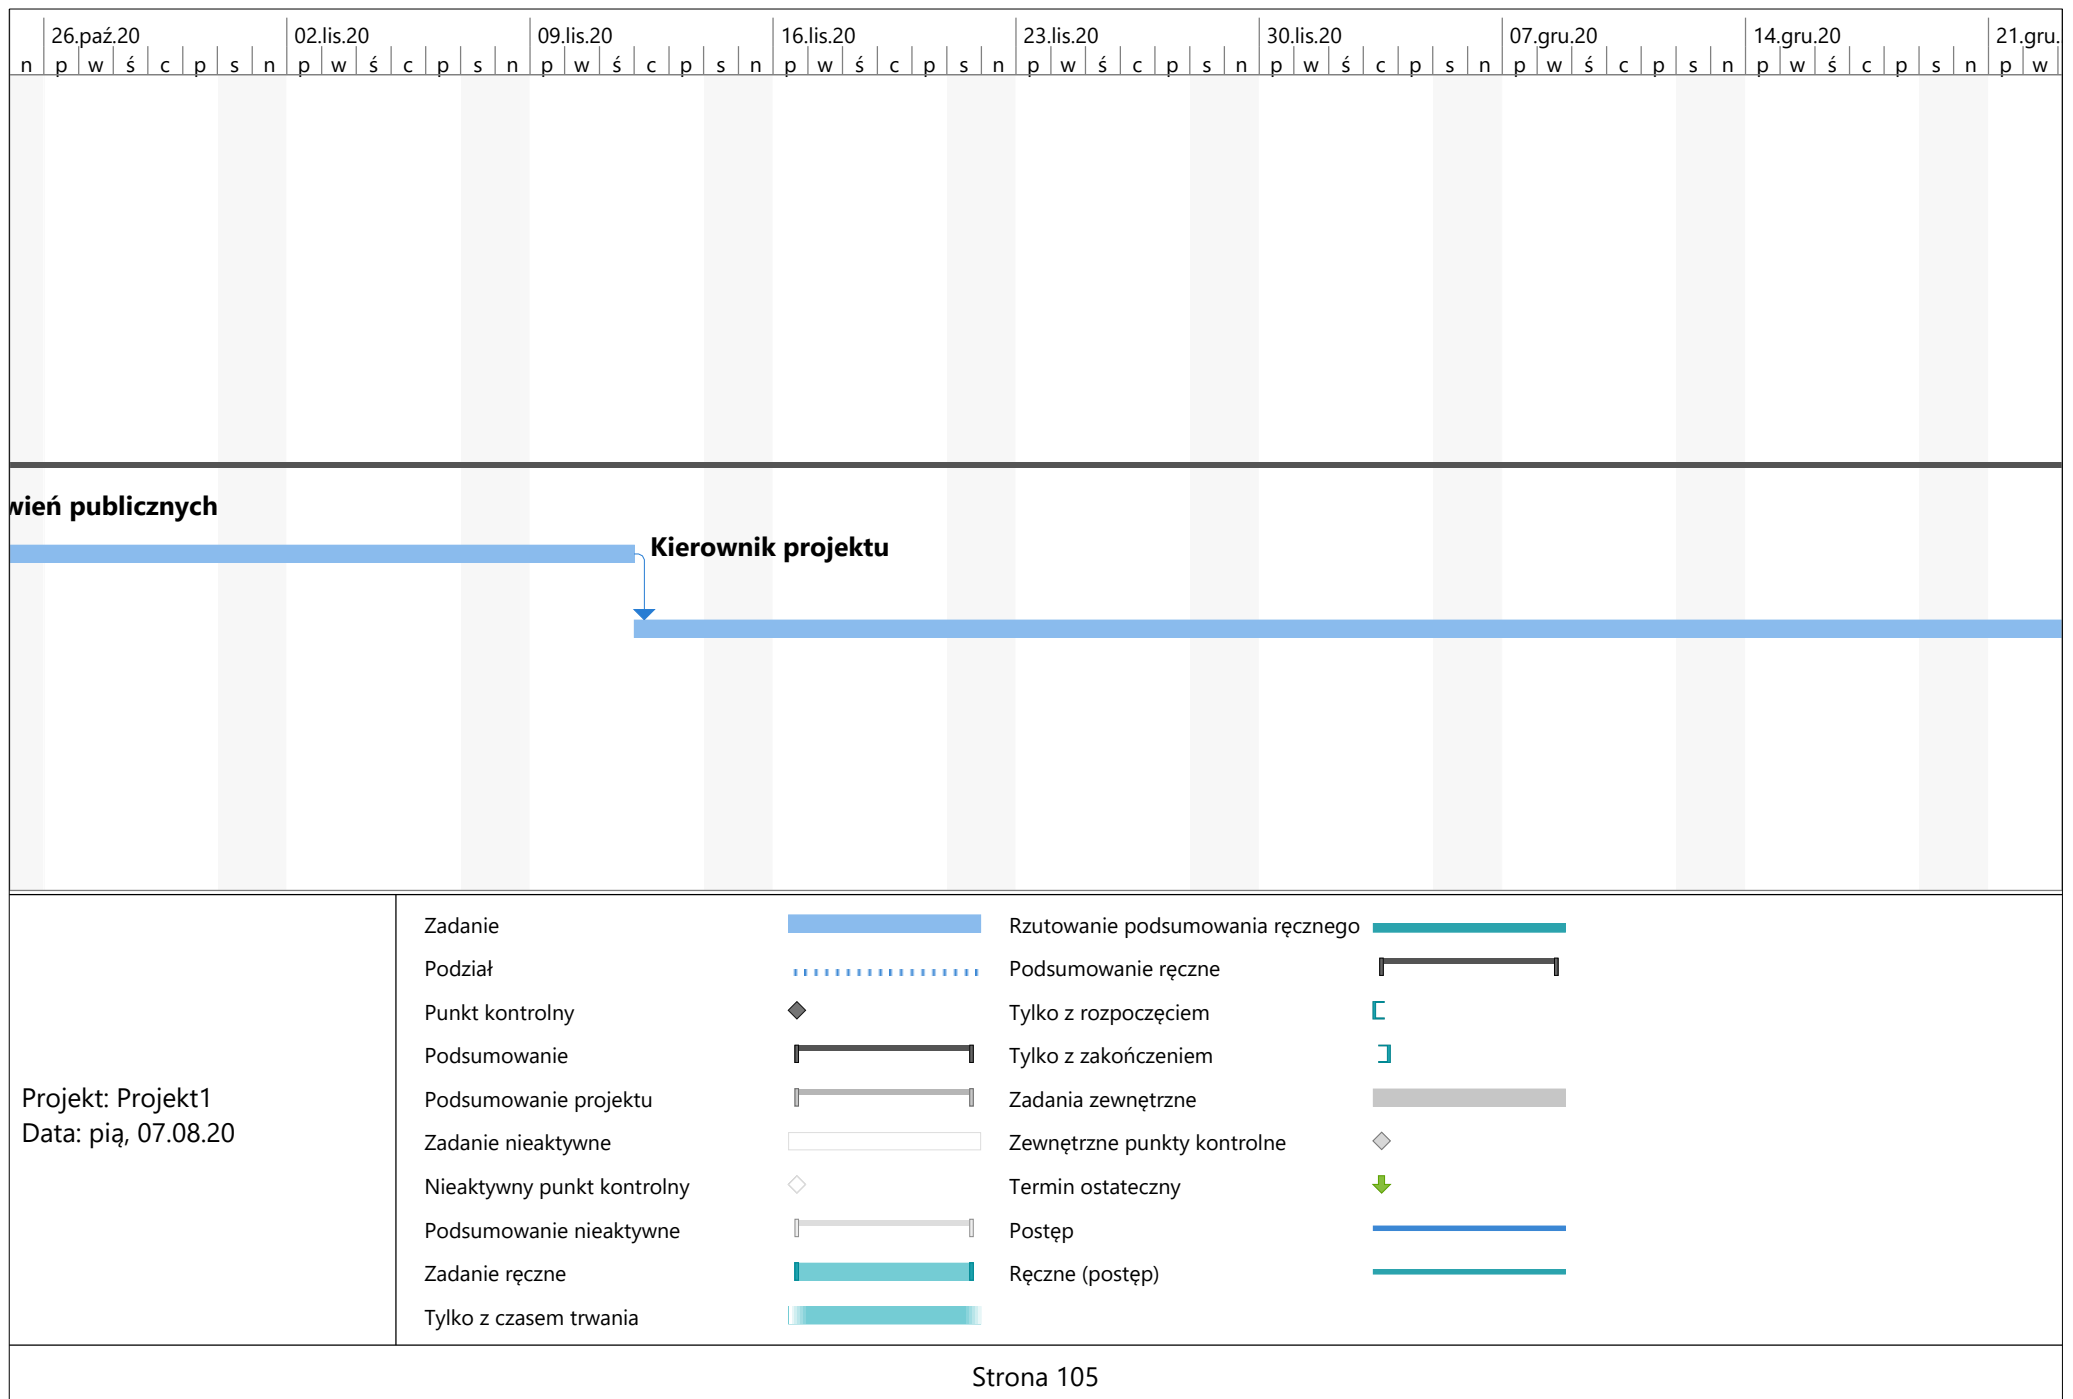











[illegible]







[illegible]

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			









ager;Tester;Właściciel biznesowy

Projekt: Projekt1  
Data: pię, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)




















Strona 110

[illegible]






[illegible]









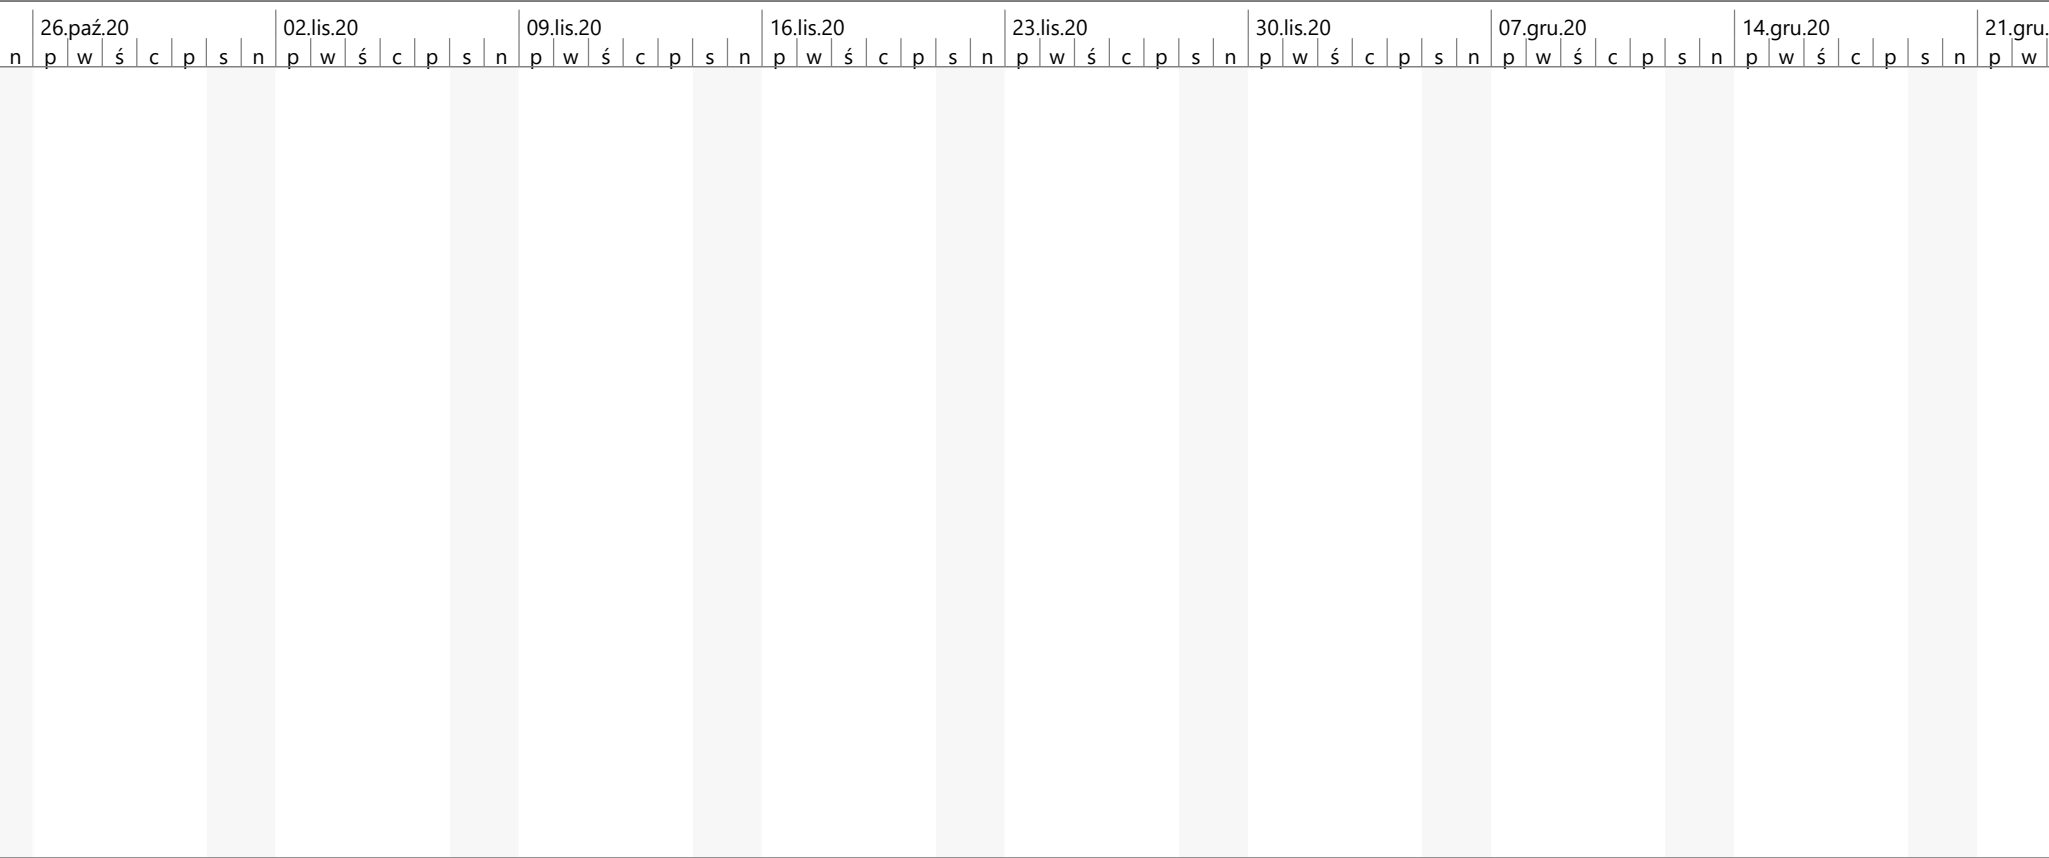










Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			









Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




























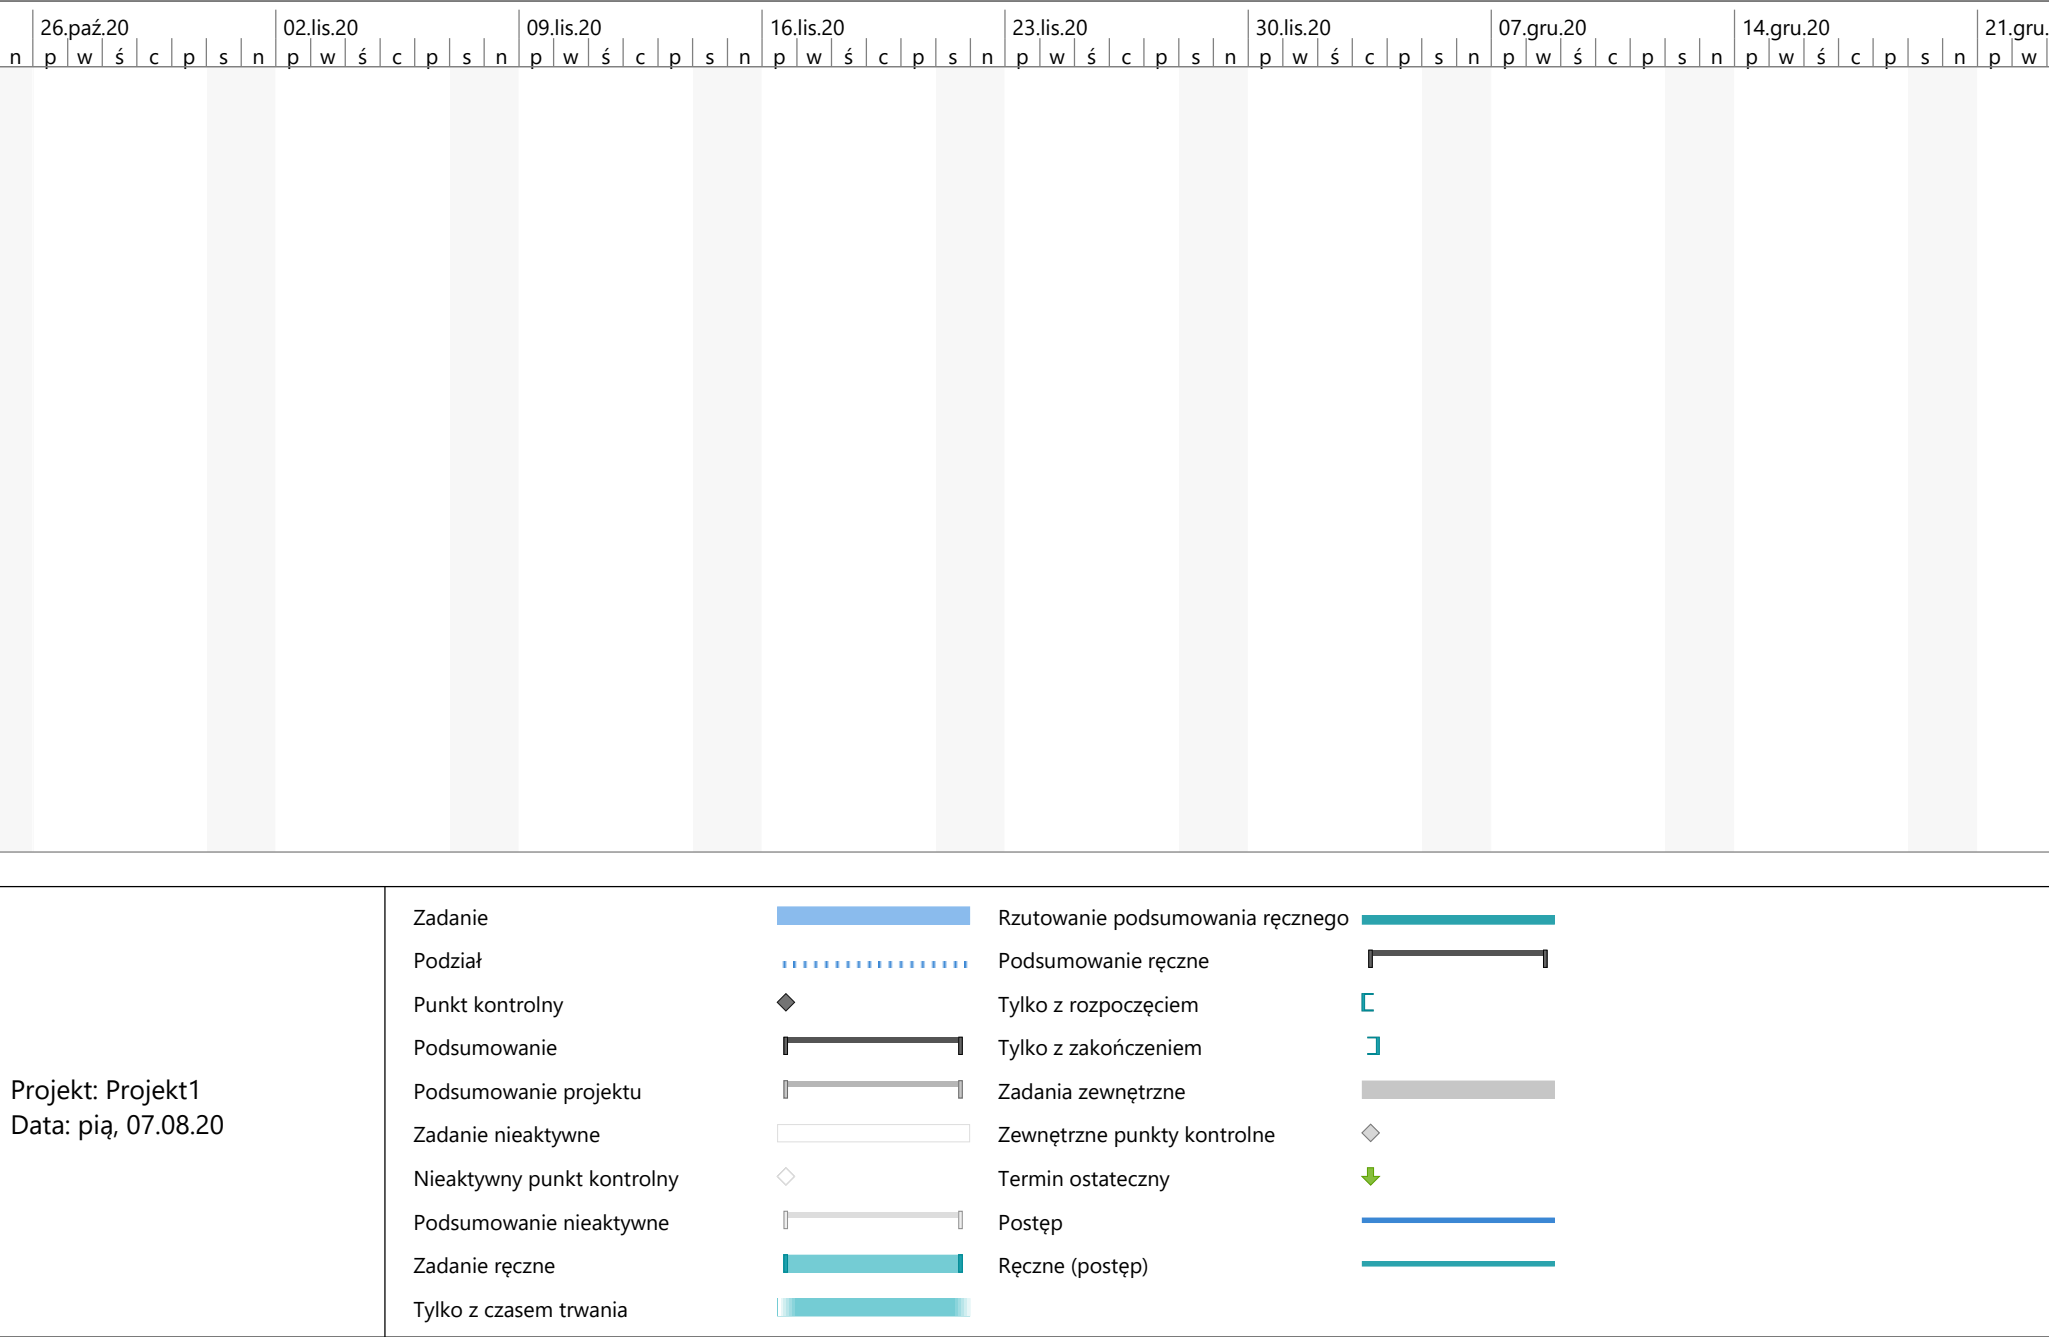























[illegible]


Projekt: Projekt1		Data: pią, 07.08.20	
Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			





[illegible]


Projekt: Projekt1		Data: pią, 07.08.20	
Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			









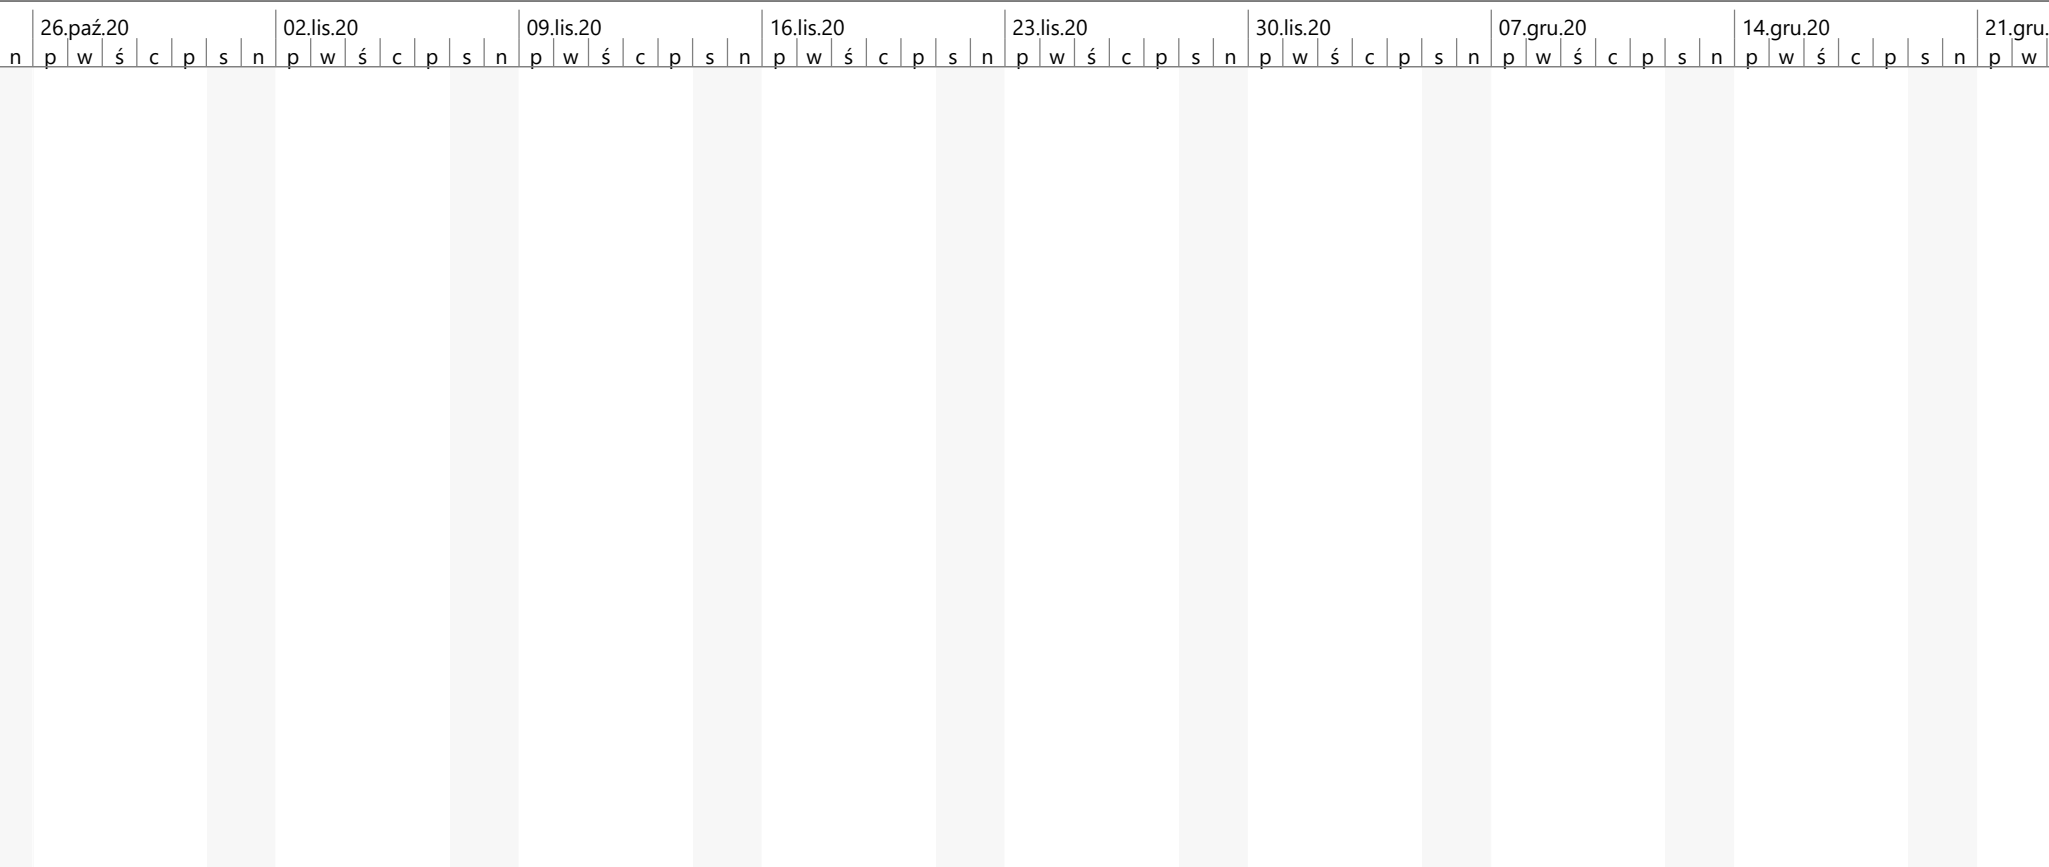


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			












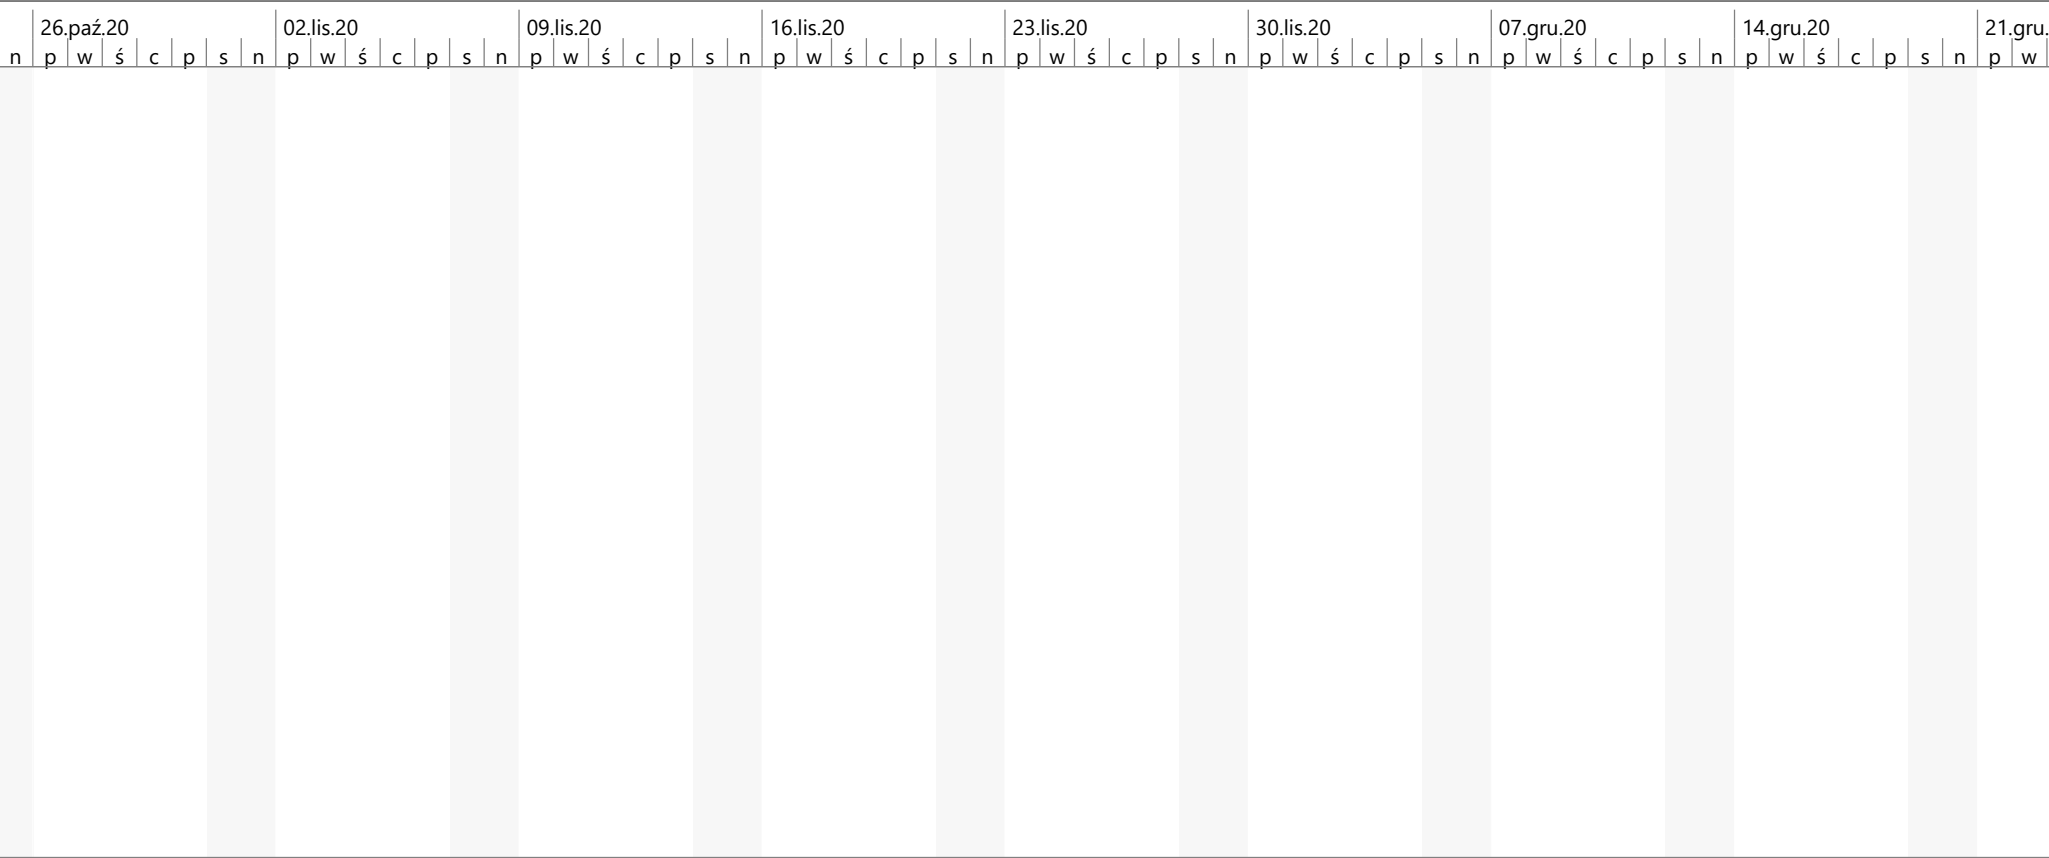














Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



26.paź.20

n

p

w

ś

c

p

s

n

02.lis.20

p

w

ś

c

p

s

n

09.lis.20

p

w

ś

c

p

s

n

16.lis.20

p

w

ś

c

p

s

n

23.lis.20

p

w

ś

c

p

s

n

30.lis.20

p

w

ś

c

p

s

n

07.gru.20

p

w

ś

c

p

s

n

14.gru.20

p

w

ś

c

p

s

n

21.gru.20

p

w

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny


Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania


<










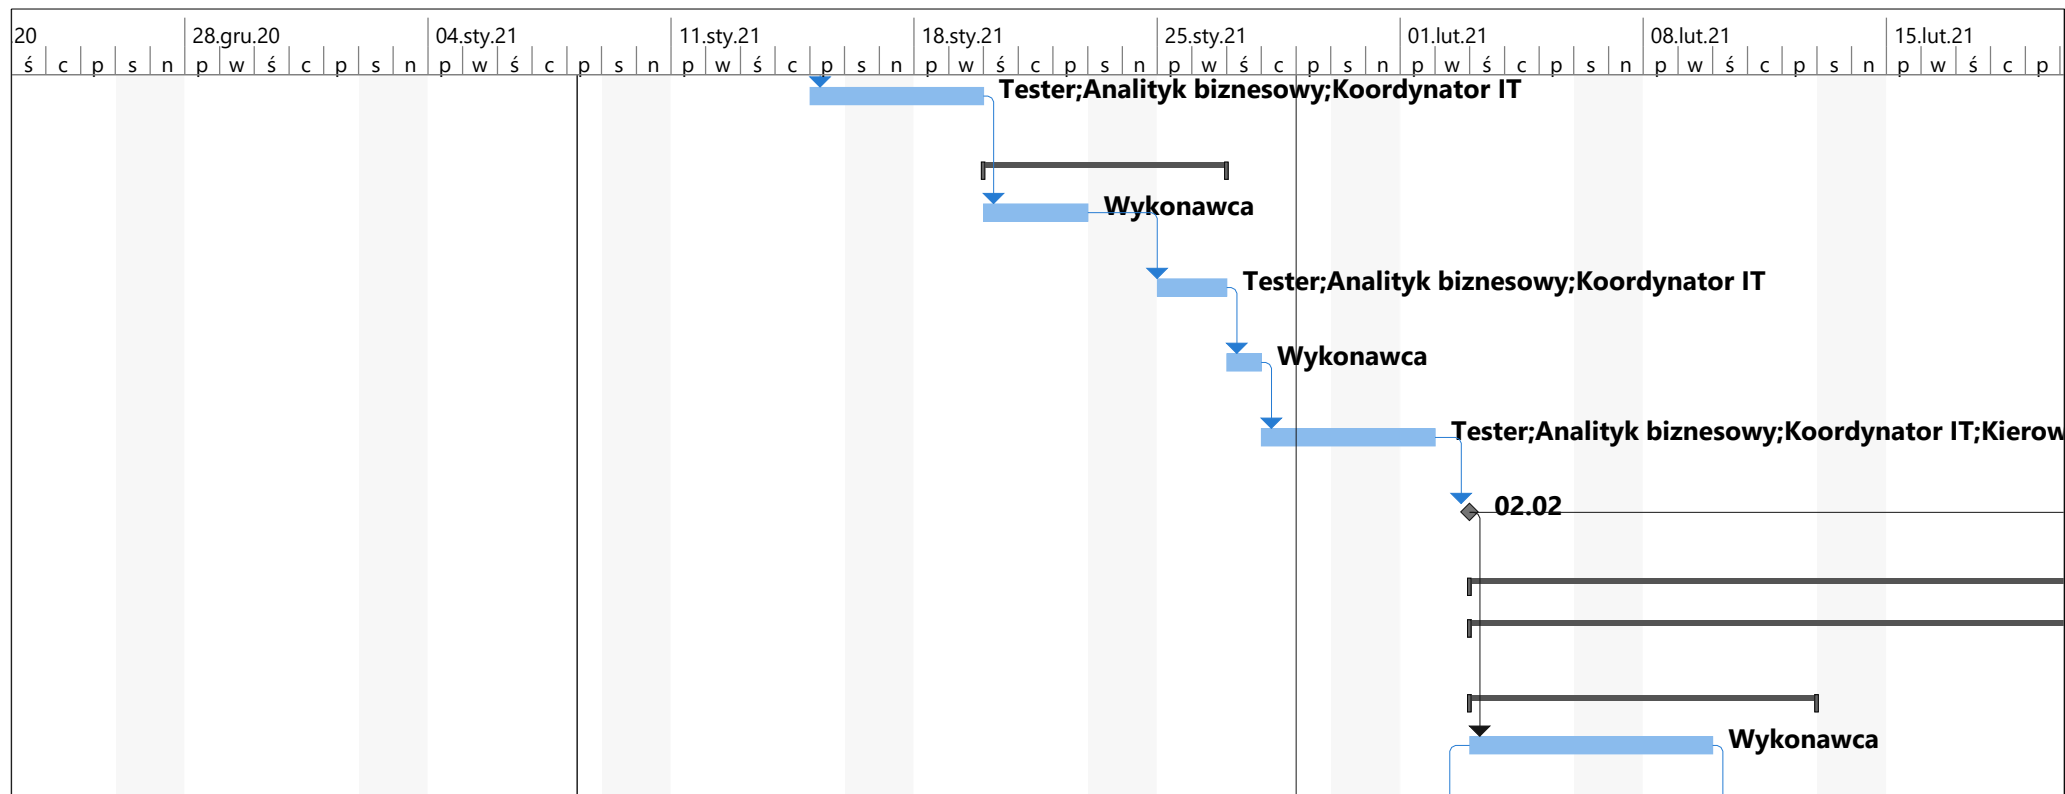


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

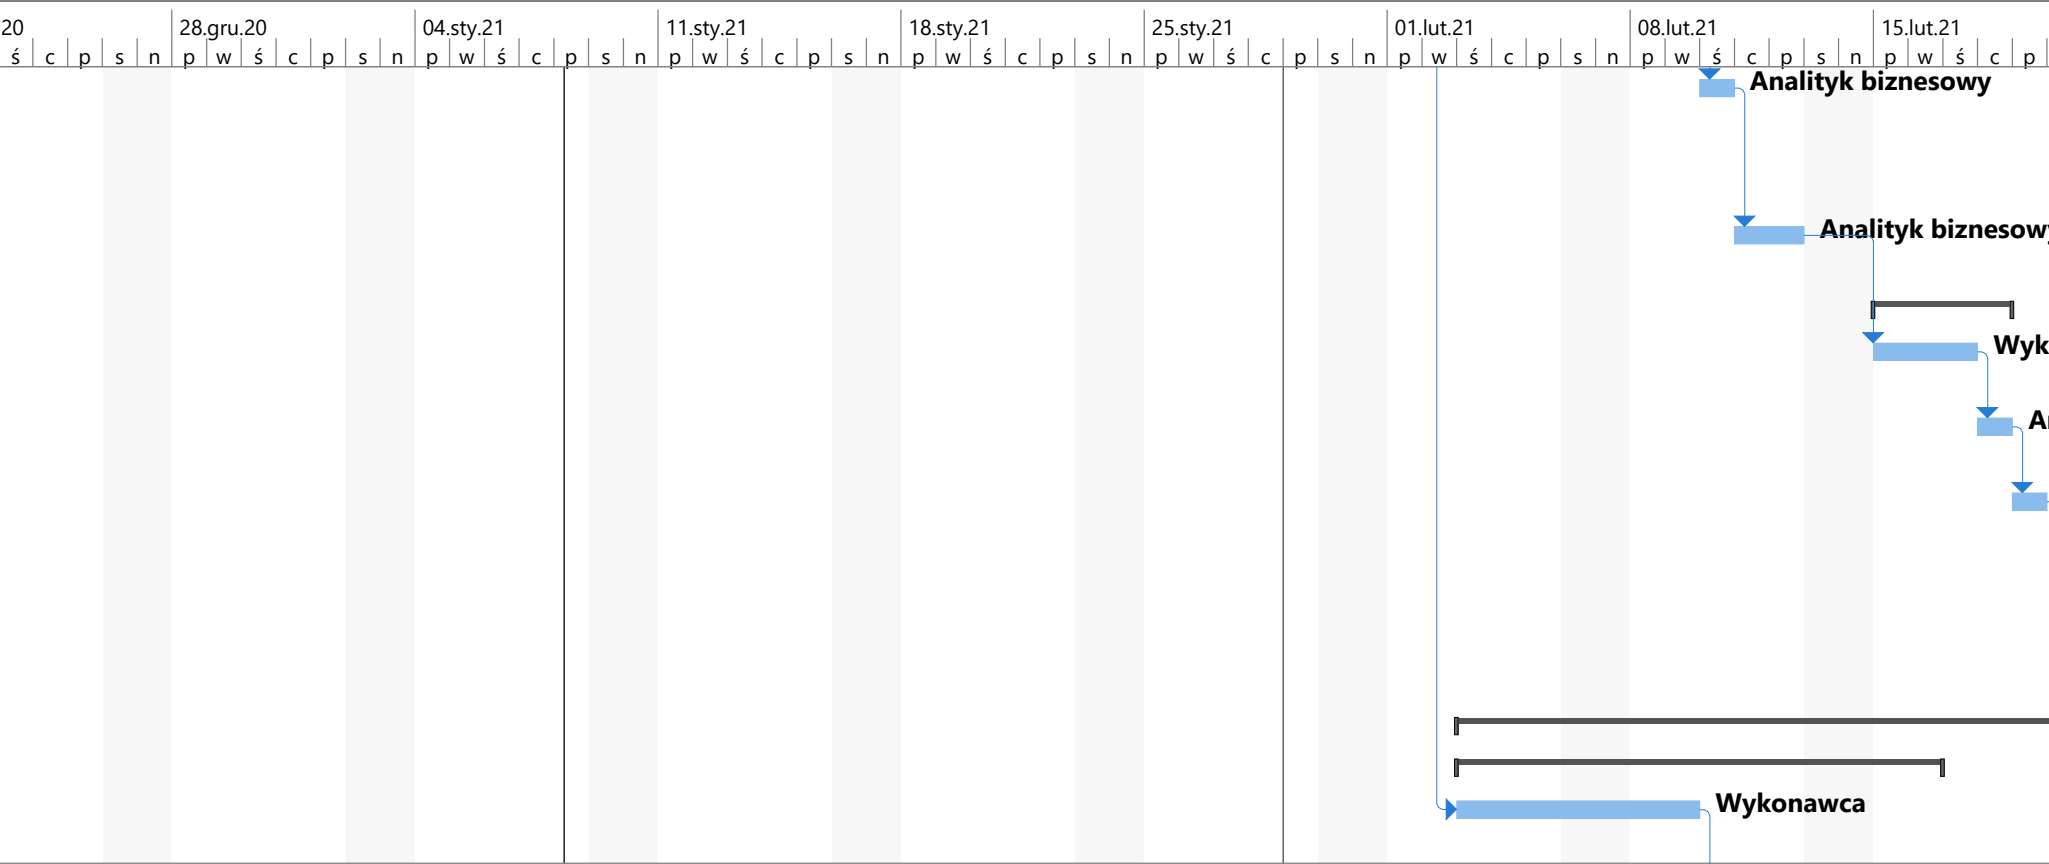



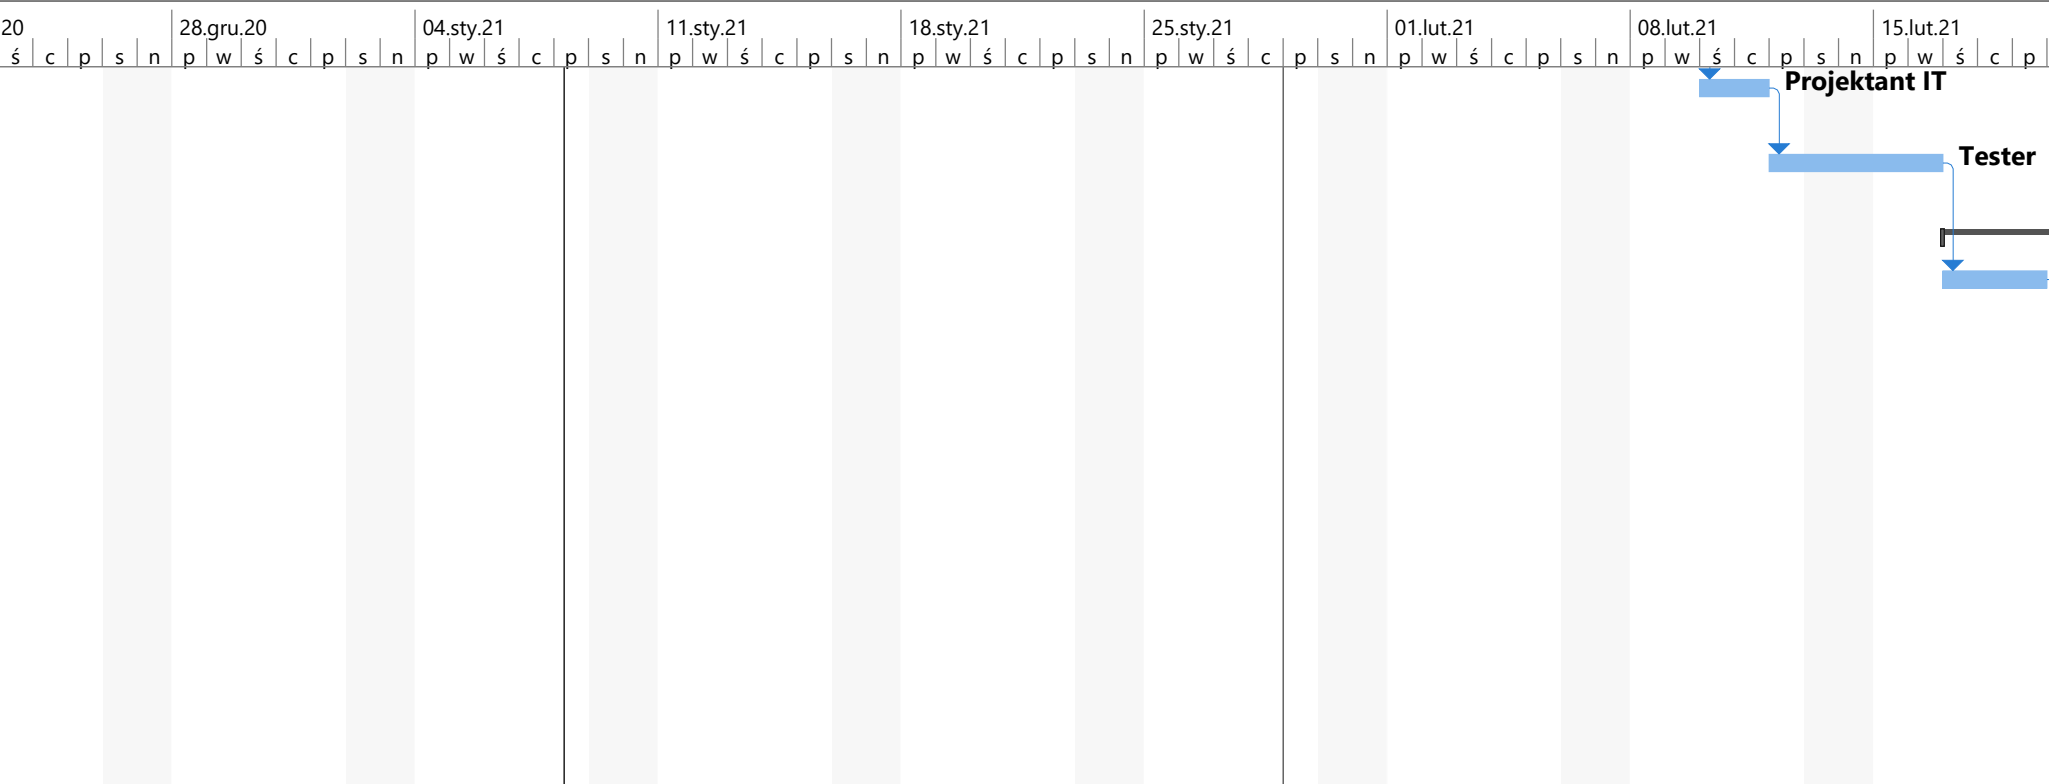
















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

20

ś

c

p

s

n

28.gru.20

p

w

ś

c

p

s

n

04.sty.21

p

w

ś

c

p

s

n

11.sty.21

p

w

ś

c

p

s

n

18.sty.21

p

w

ś

c

p

s

n

25.sty.21

p

w

ś

c

p

s

n

01.lut.21

p

w

ś

c

p

s

n

08.lut.21

p

w

ś

c

p

s

n

15.lut.21

p

w

ś

c

p

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)

Strona 144







Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			









Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



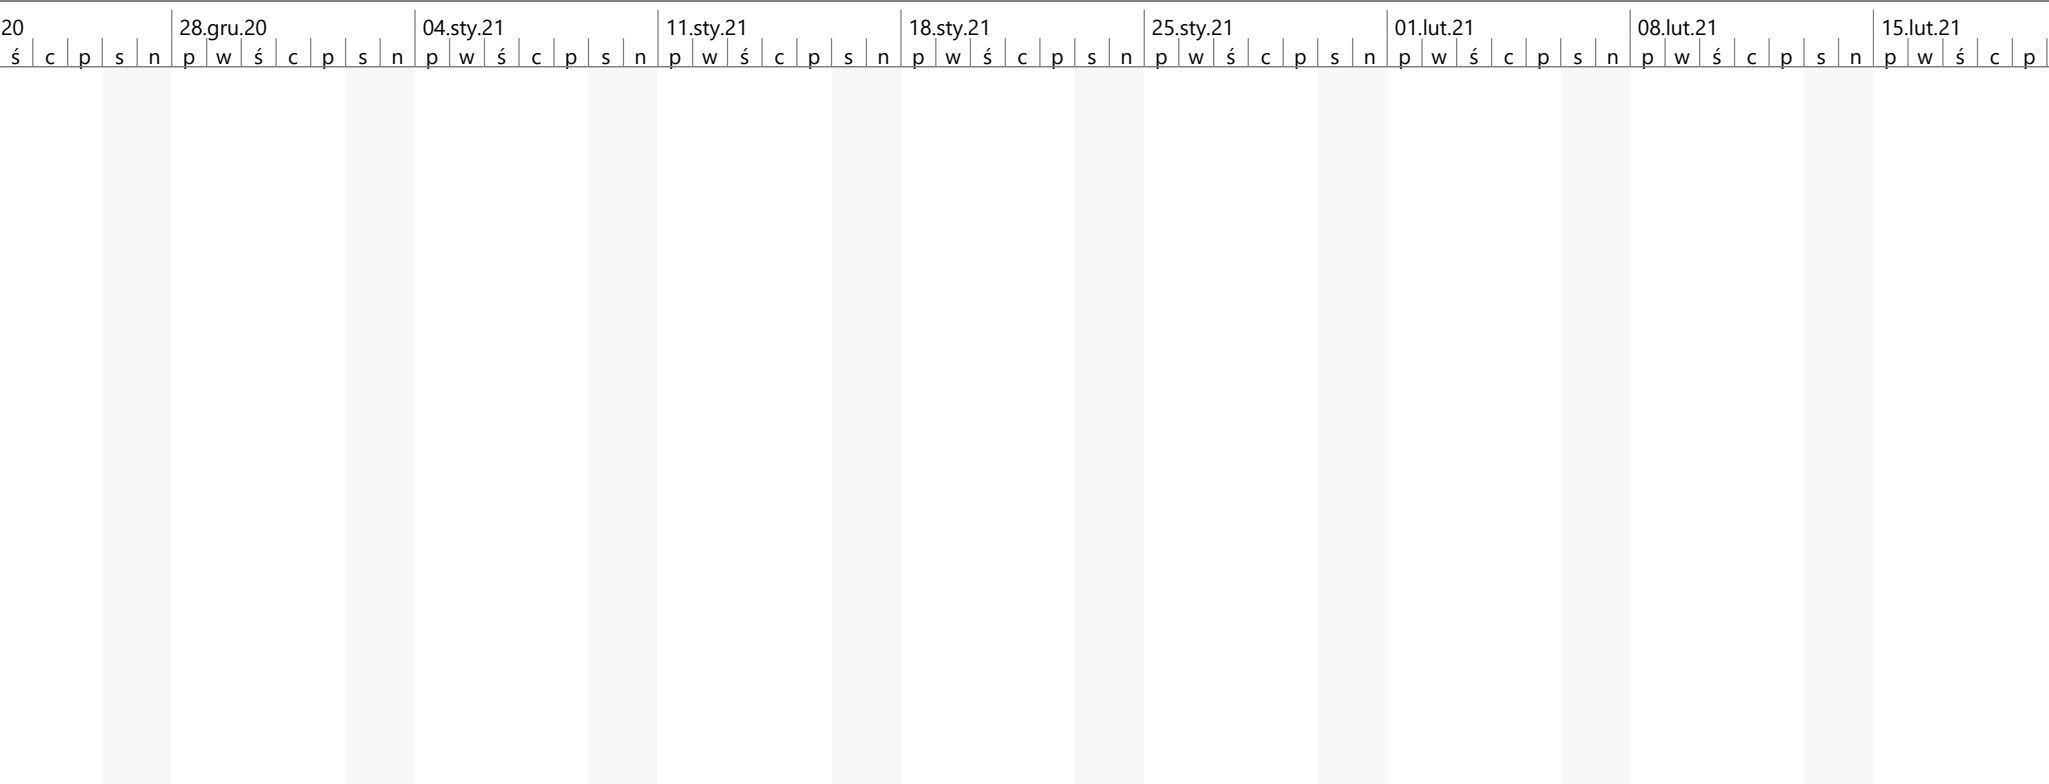

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




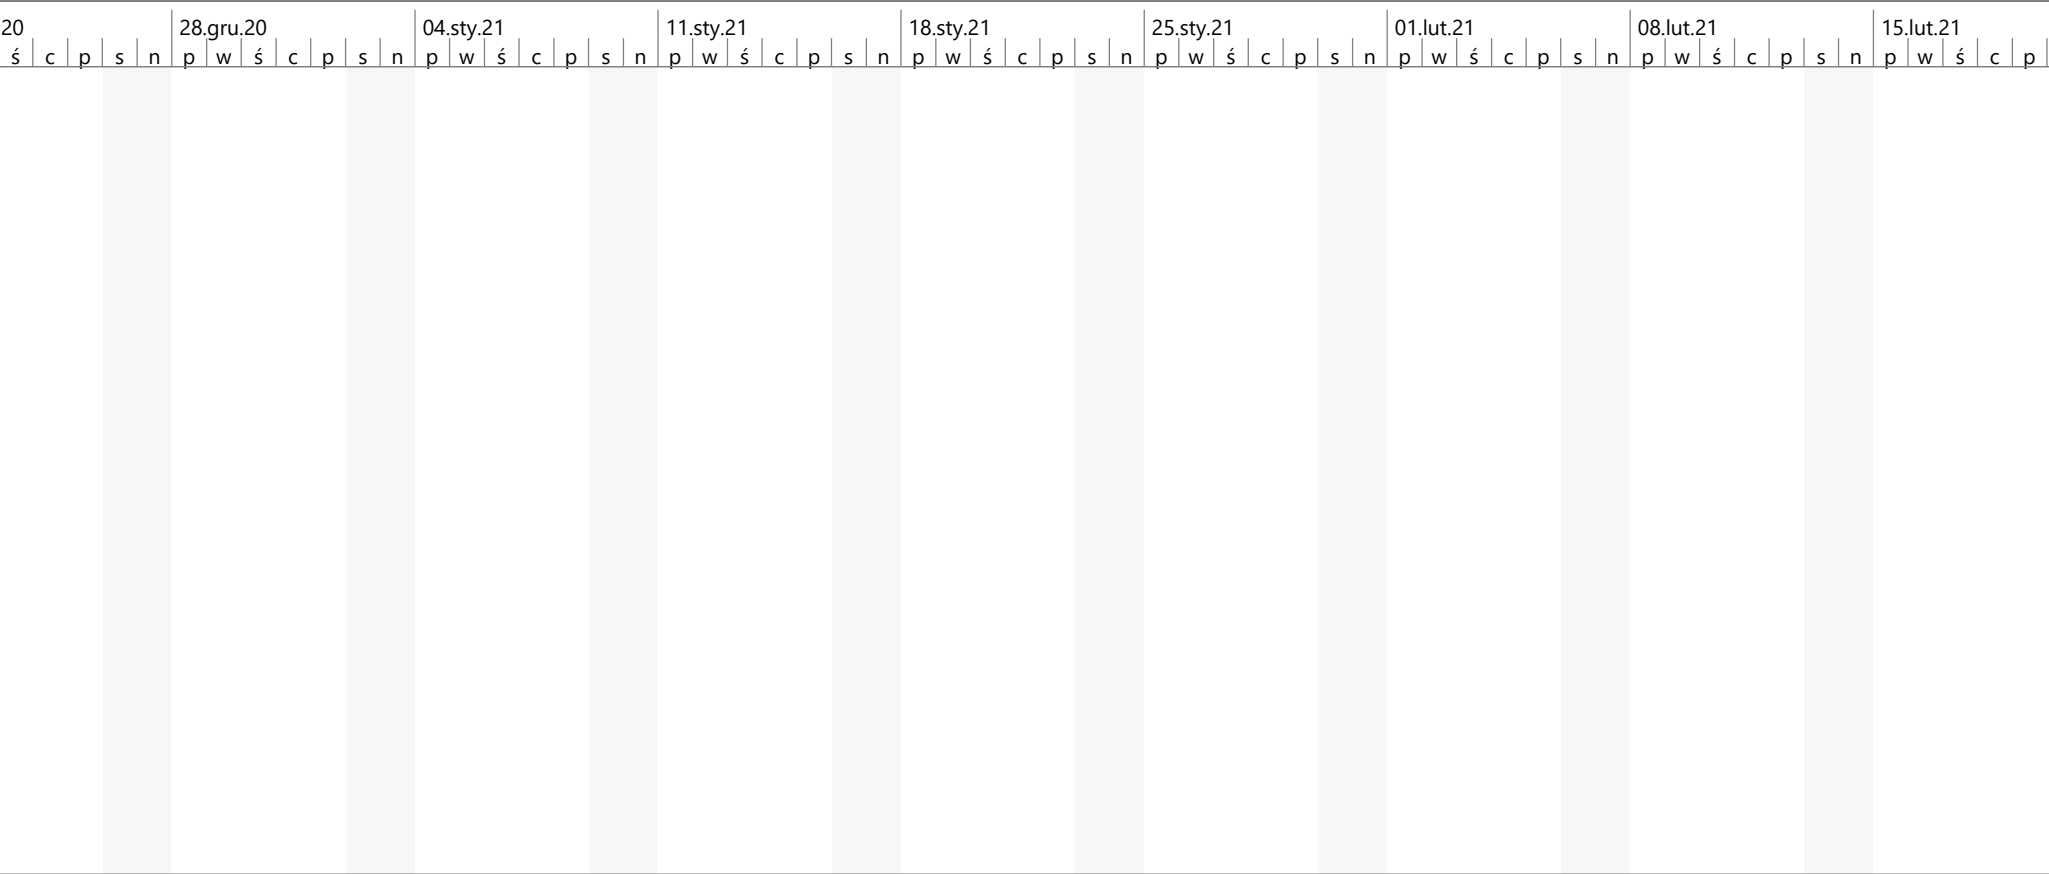


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			









<div>Projekt: Projekt1</div> <div>Data: pią, 07.08.20</div>	Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>
	Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>
	Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>
	Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>
	Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>
	Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>
	Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>
	Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>
	Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>
	Tylko z czasem trwania	<div></div>		









Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			






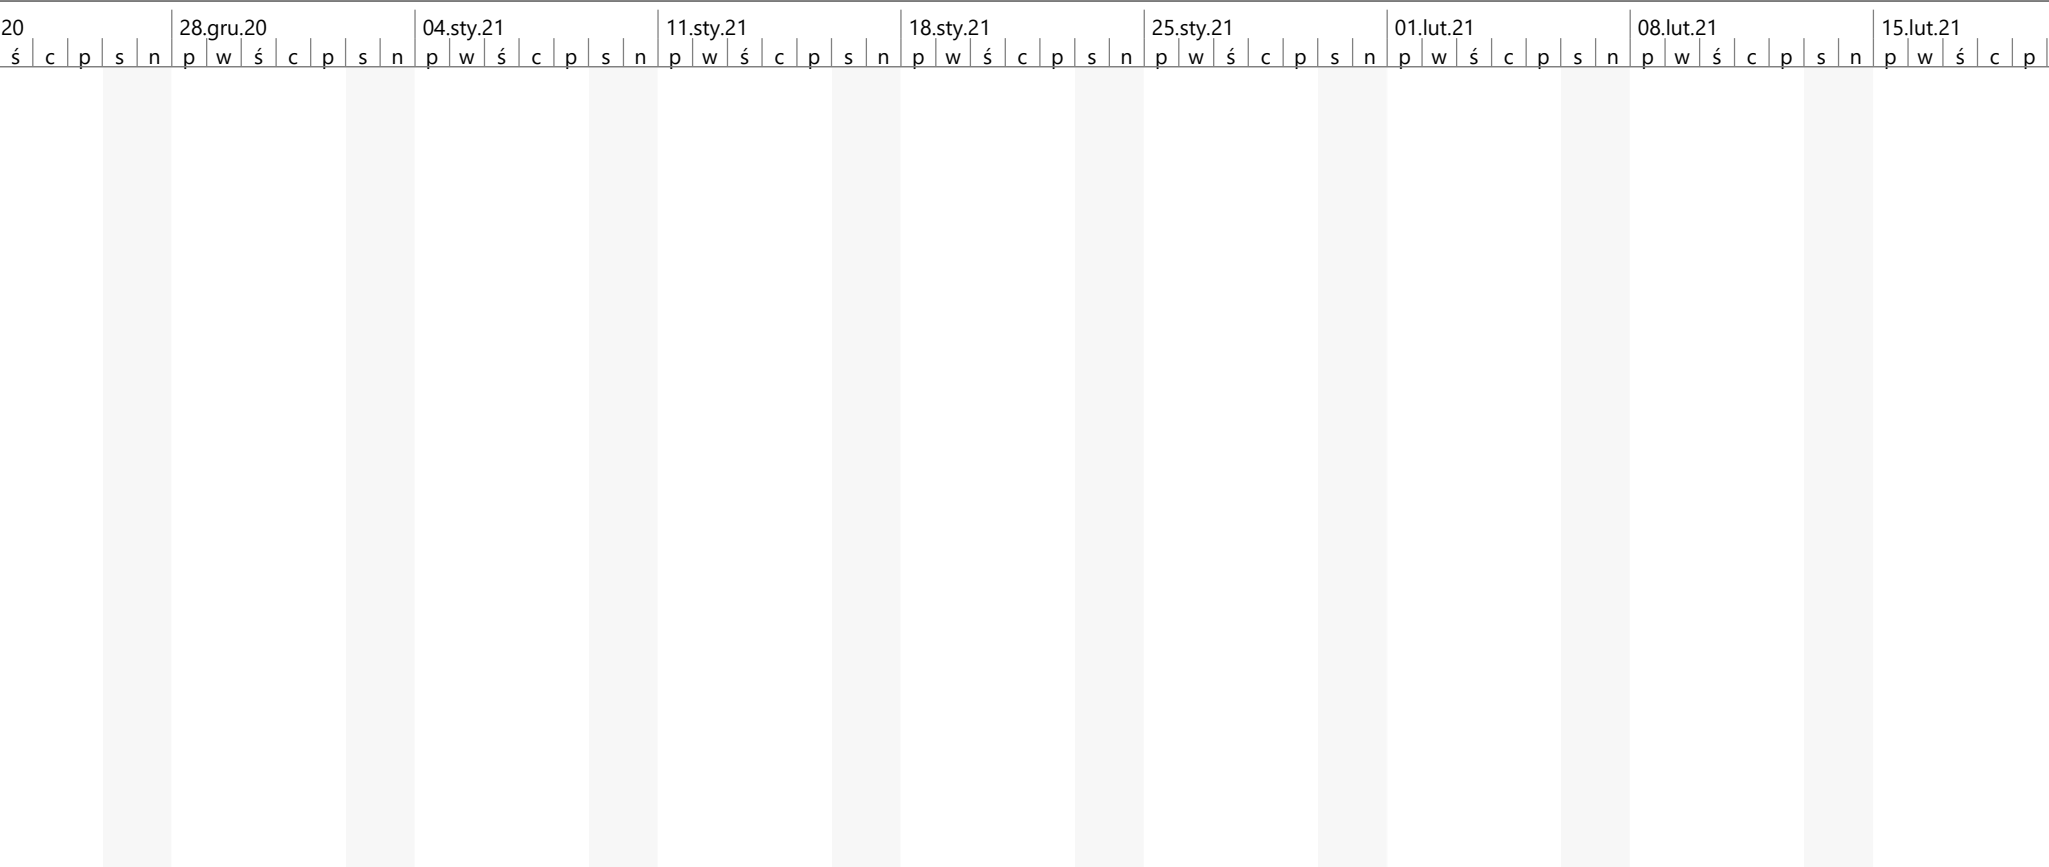


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			
























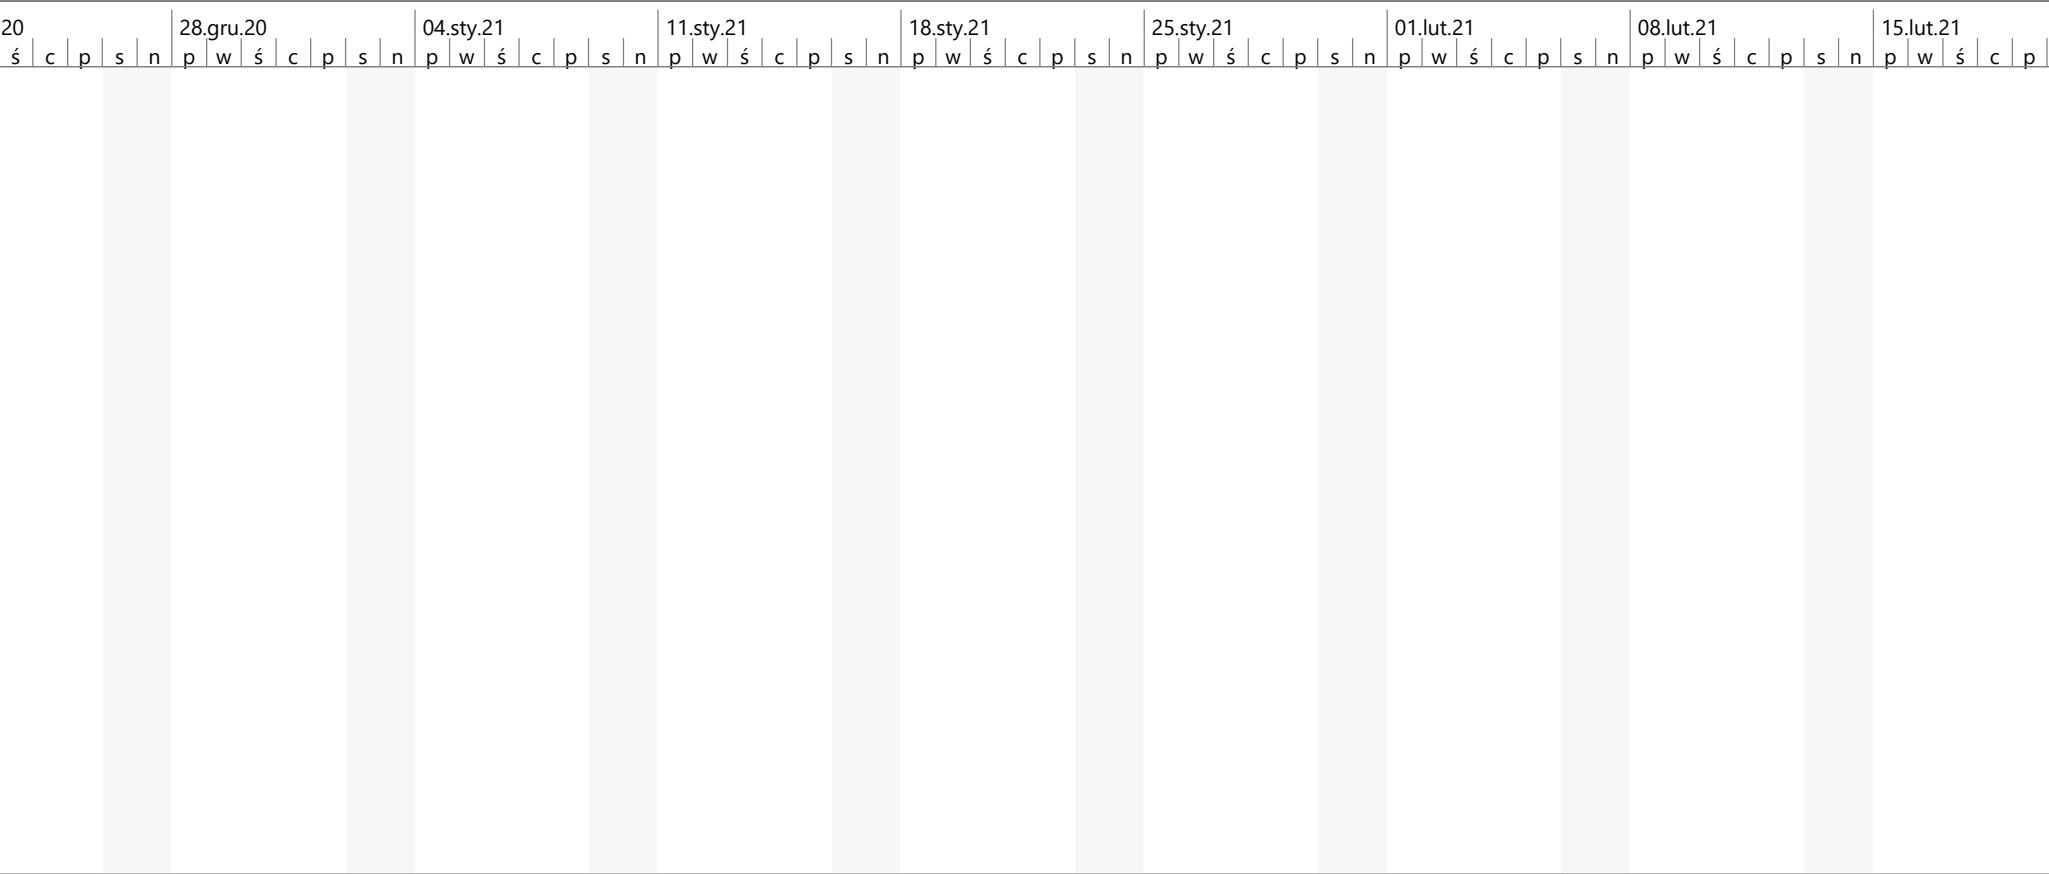




Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			






Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



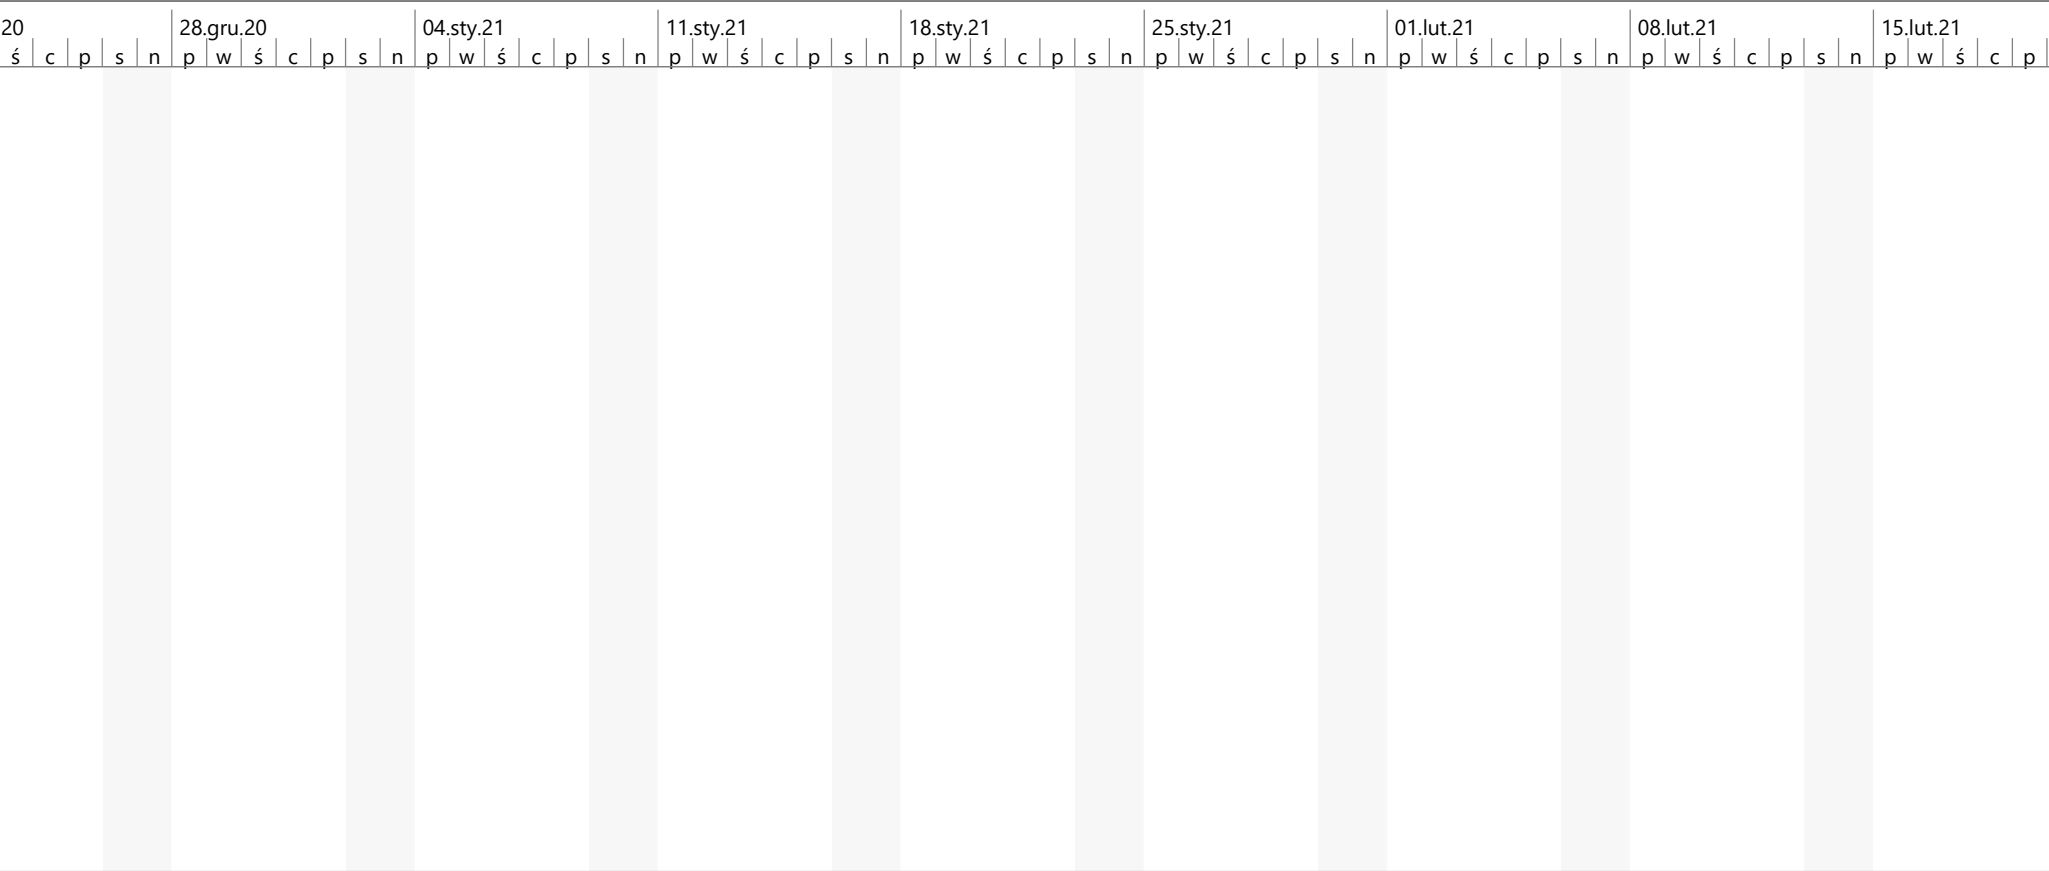


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			








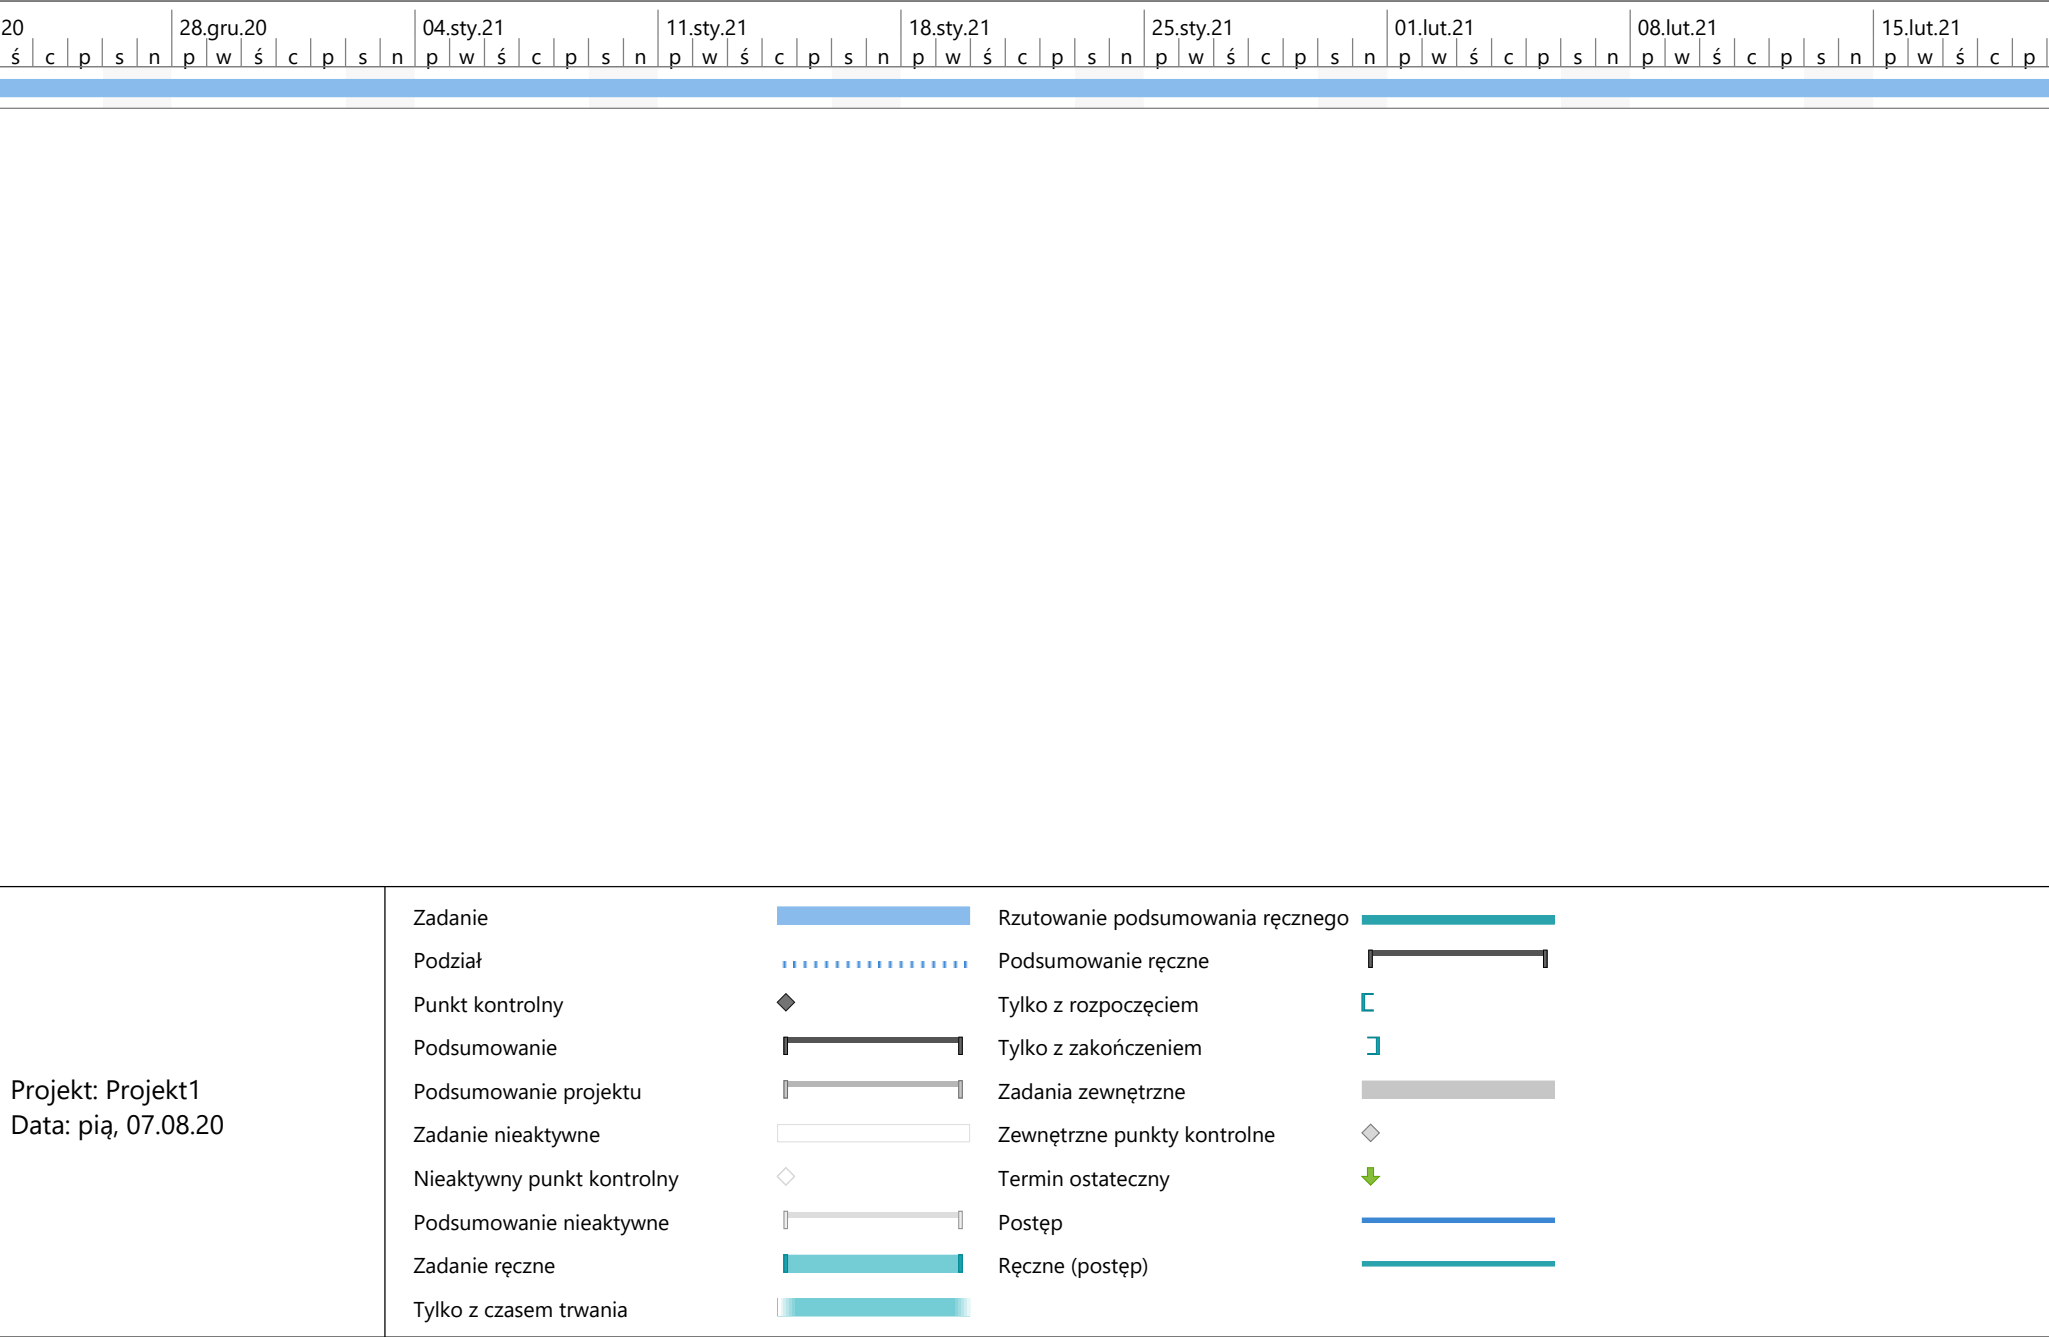







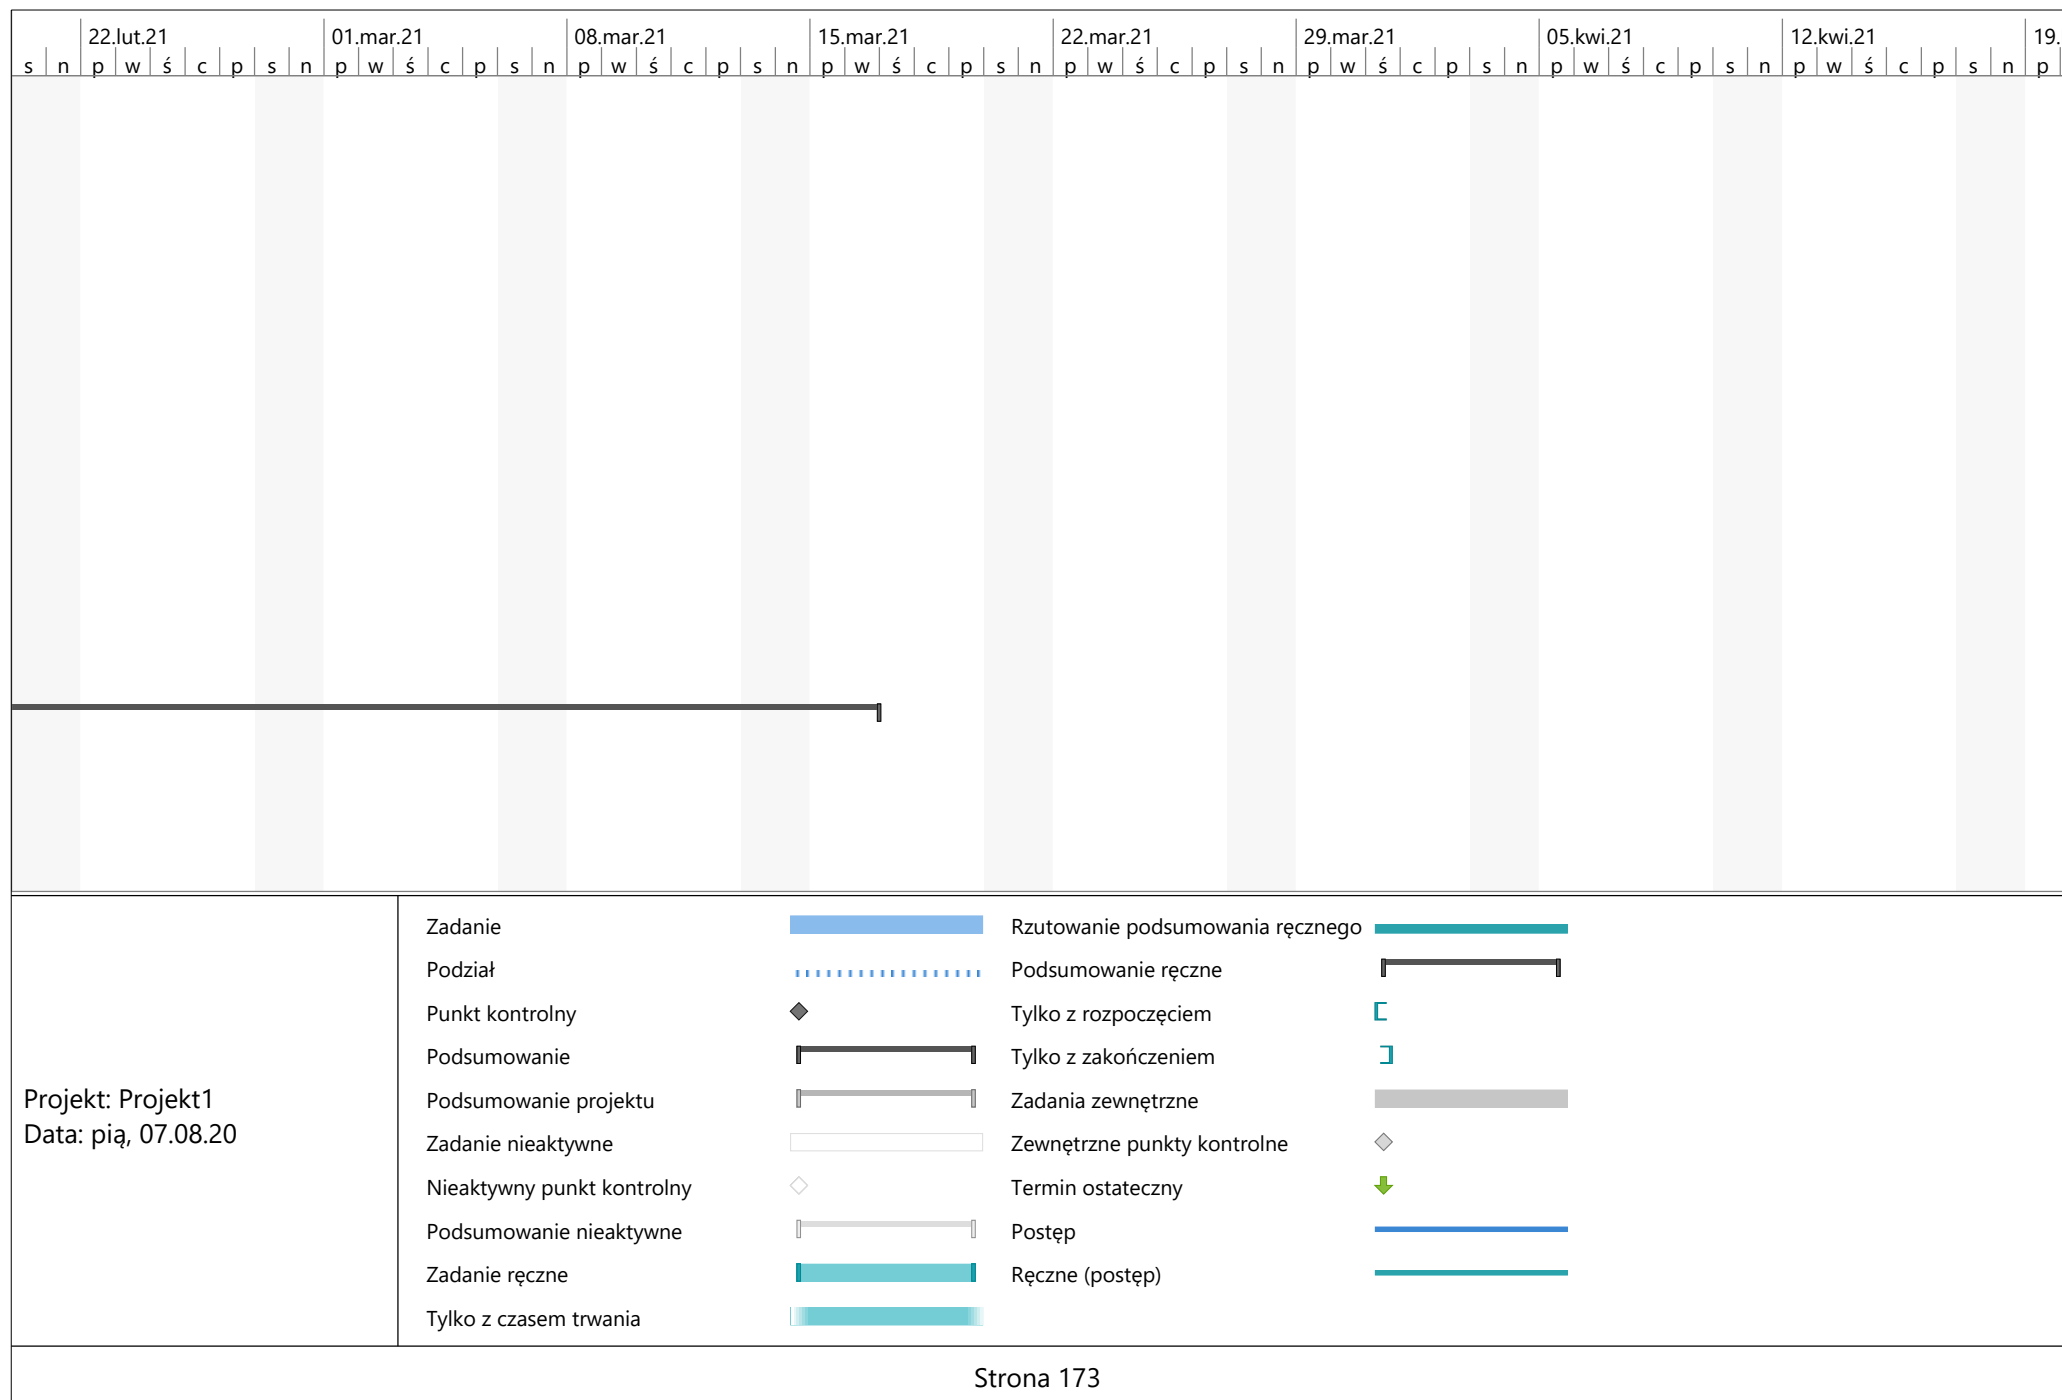



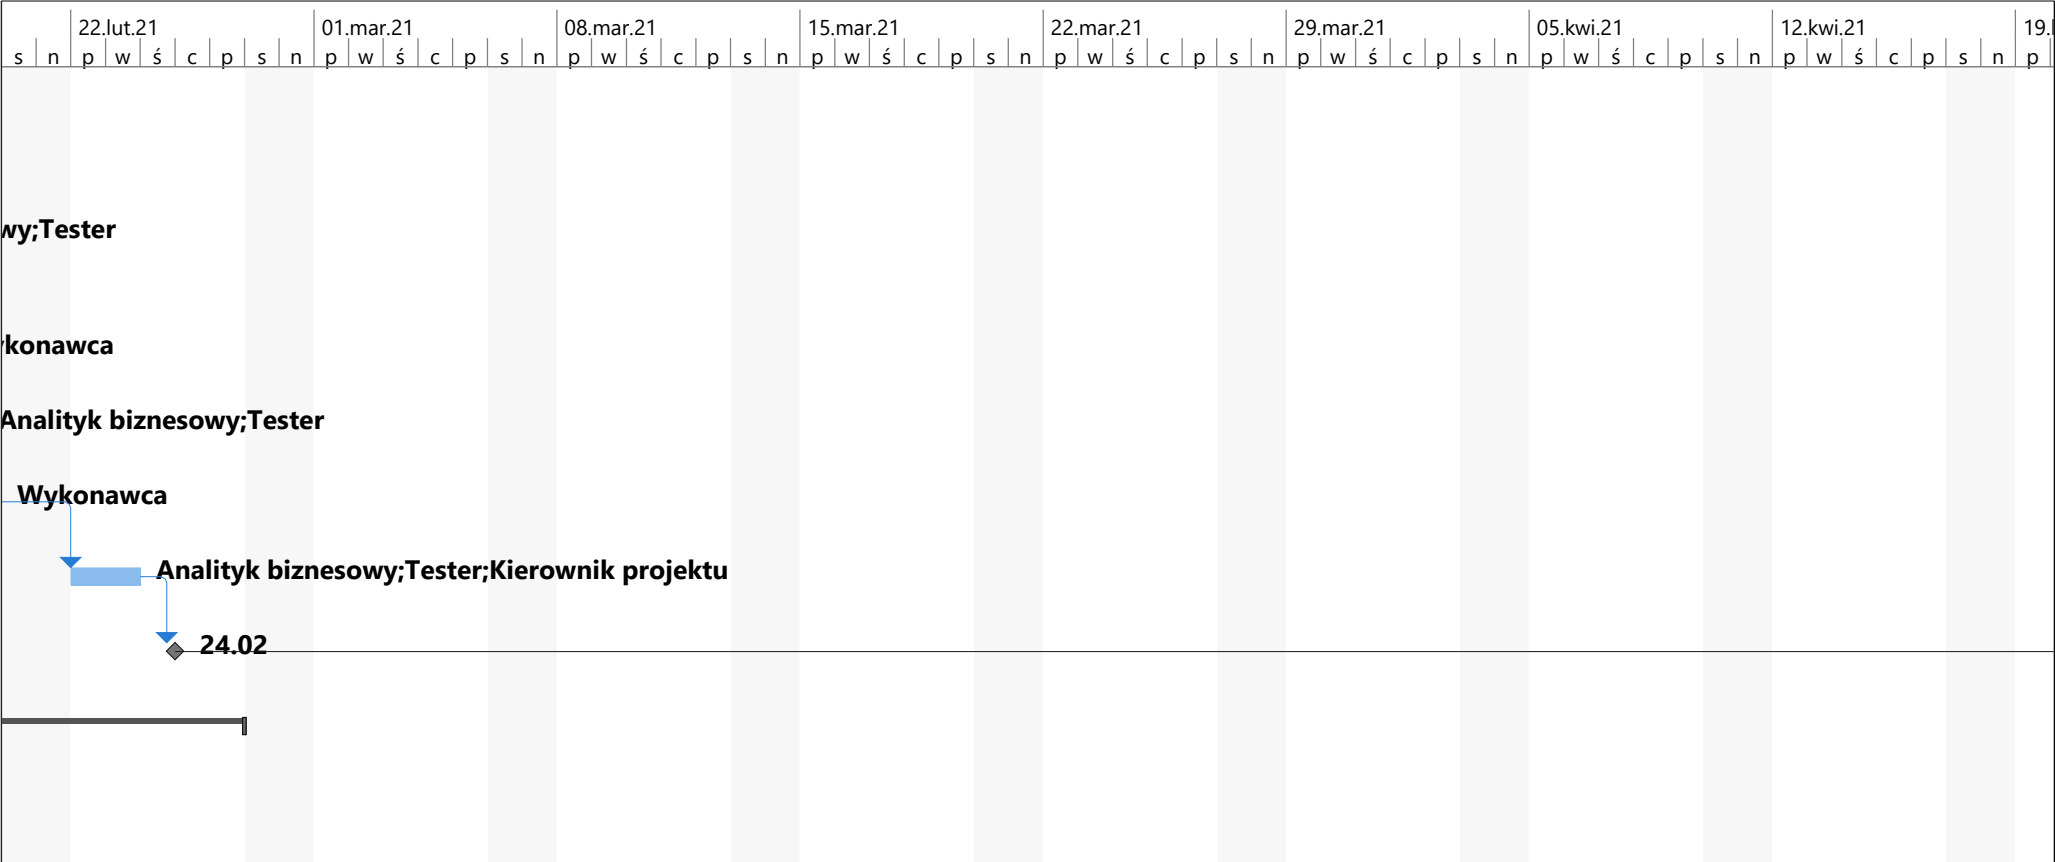



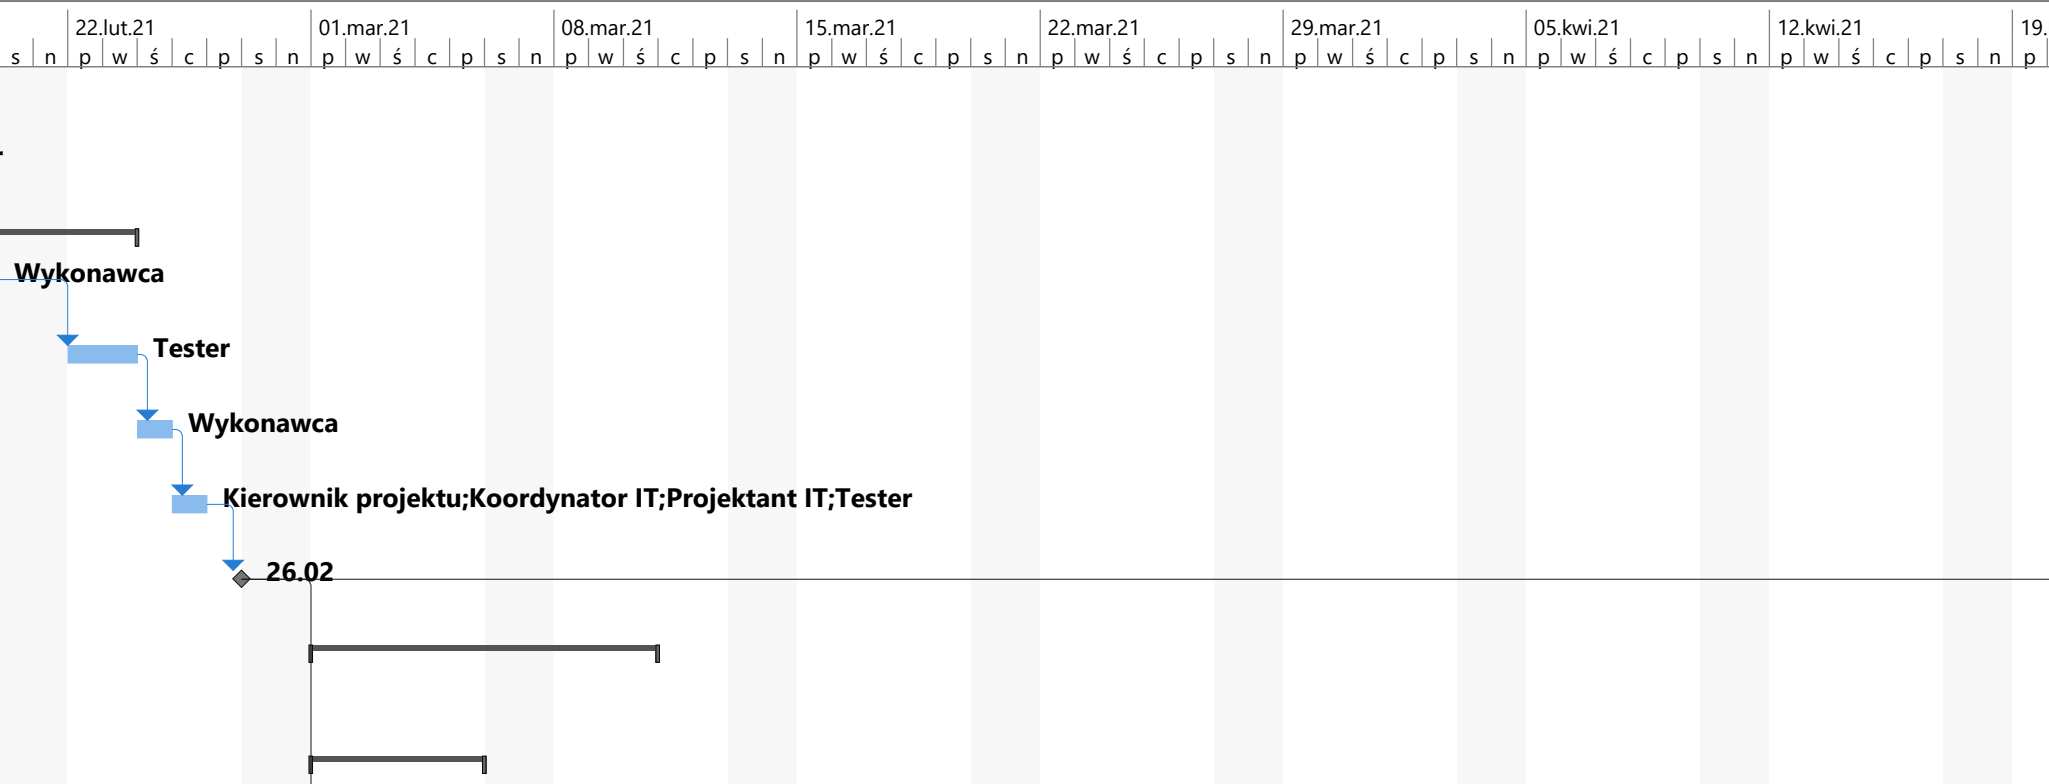
















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			






**Projekt: Projekt1**  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie	Symbol	Opis
Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego
Podział		Podsumowanie ręczne
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny
Podsumowanie nieaktywne		Postęp
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)
Tylko z czasem trwania		

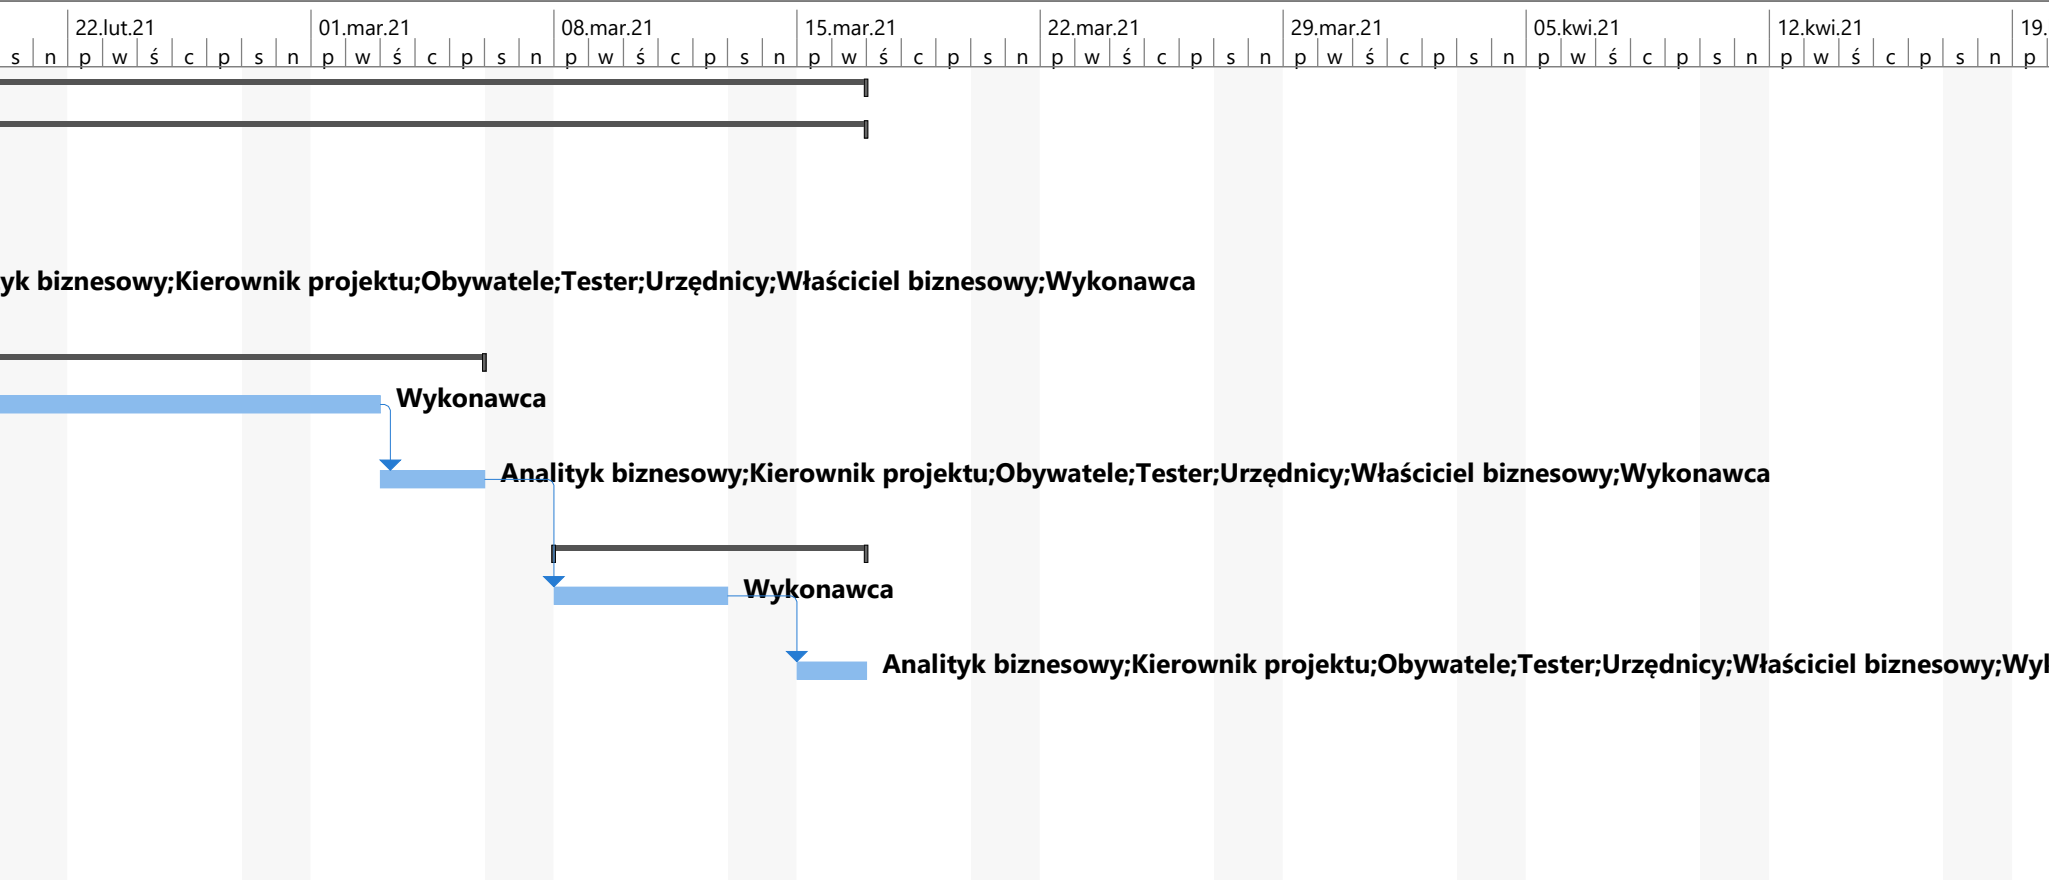

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

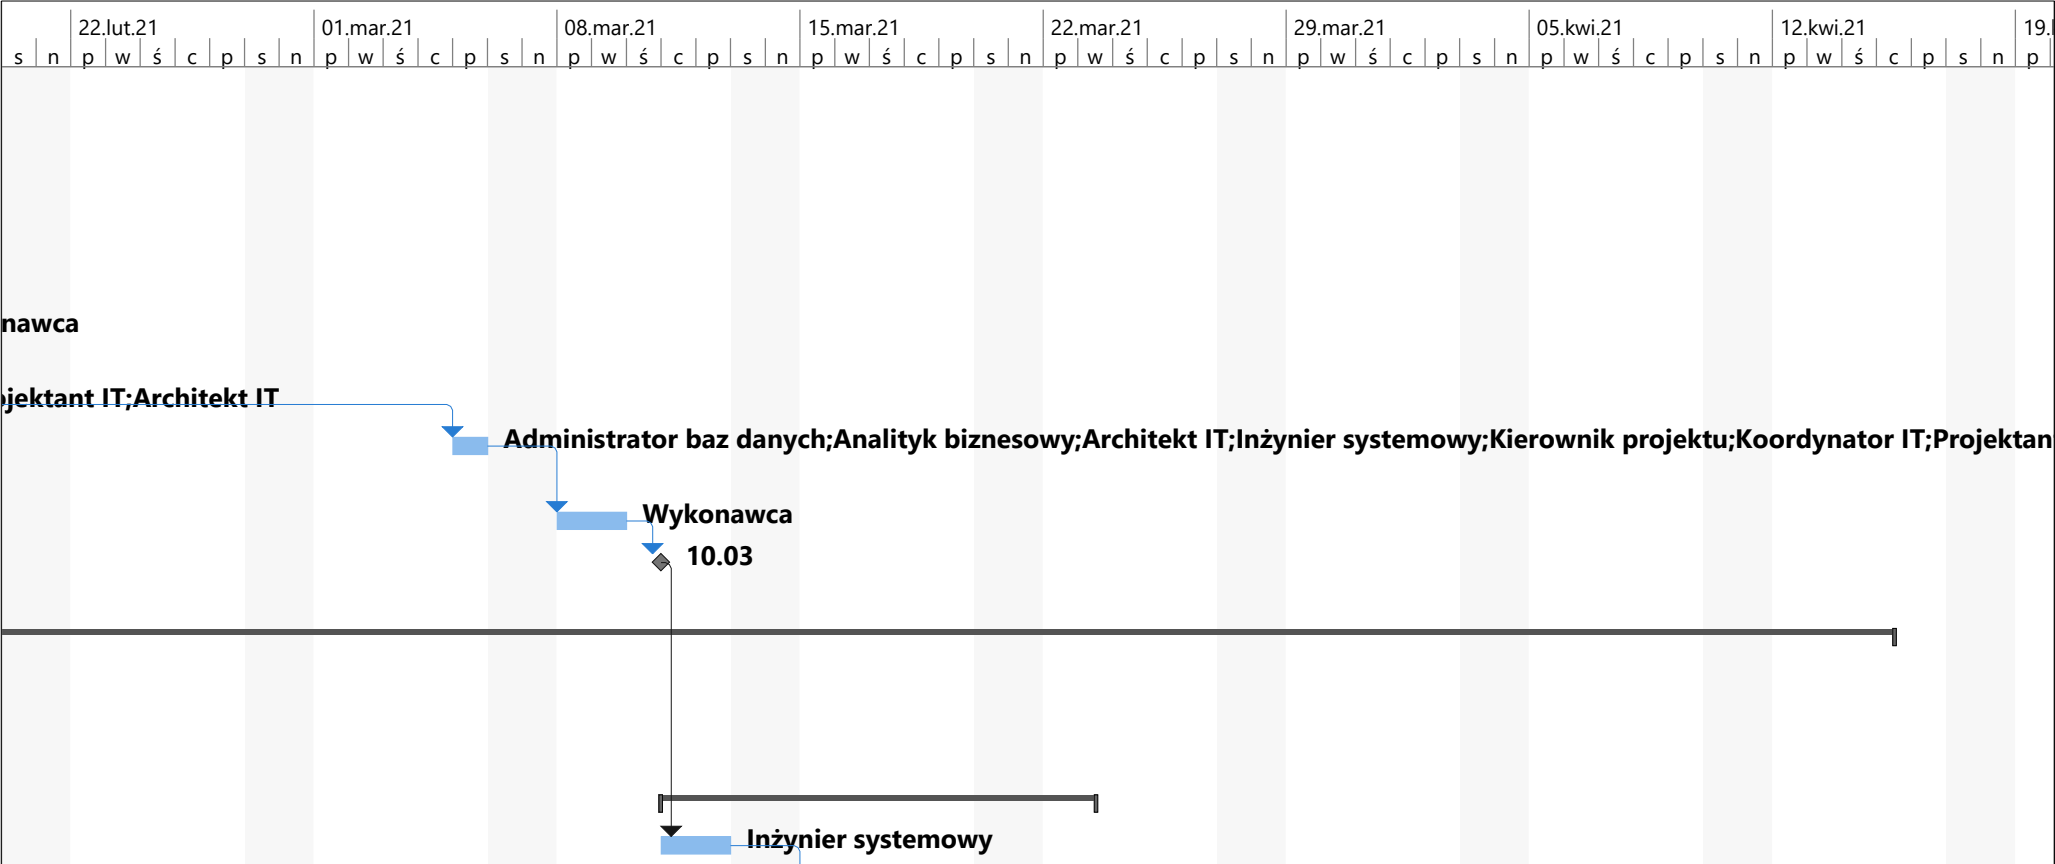


Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

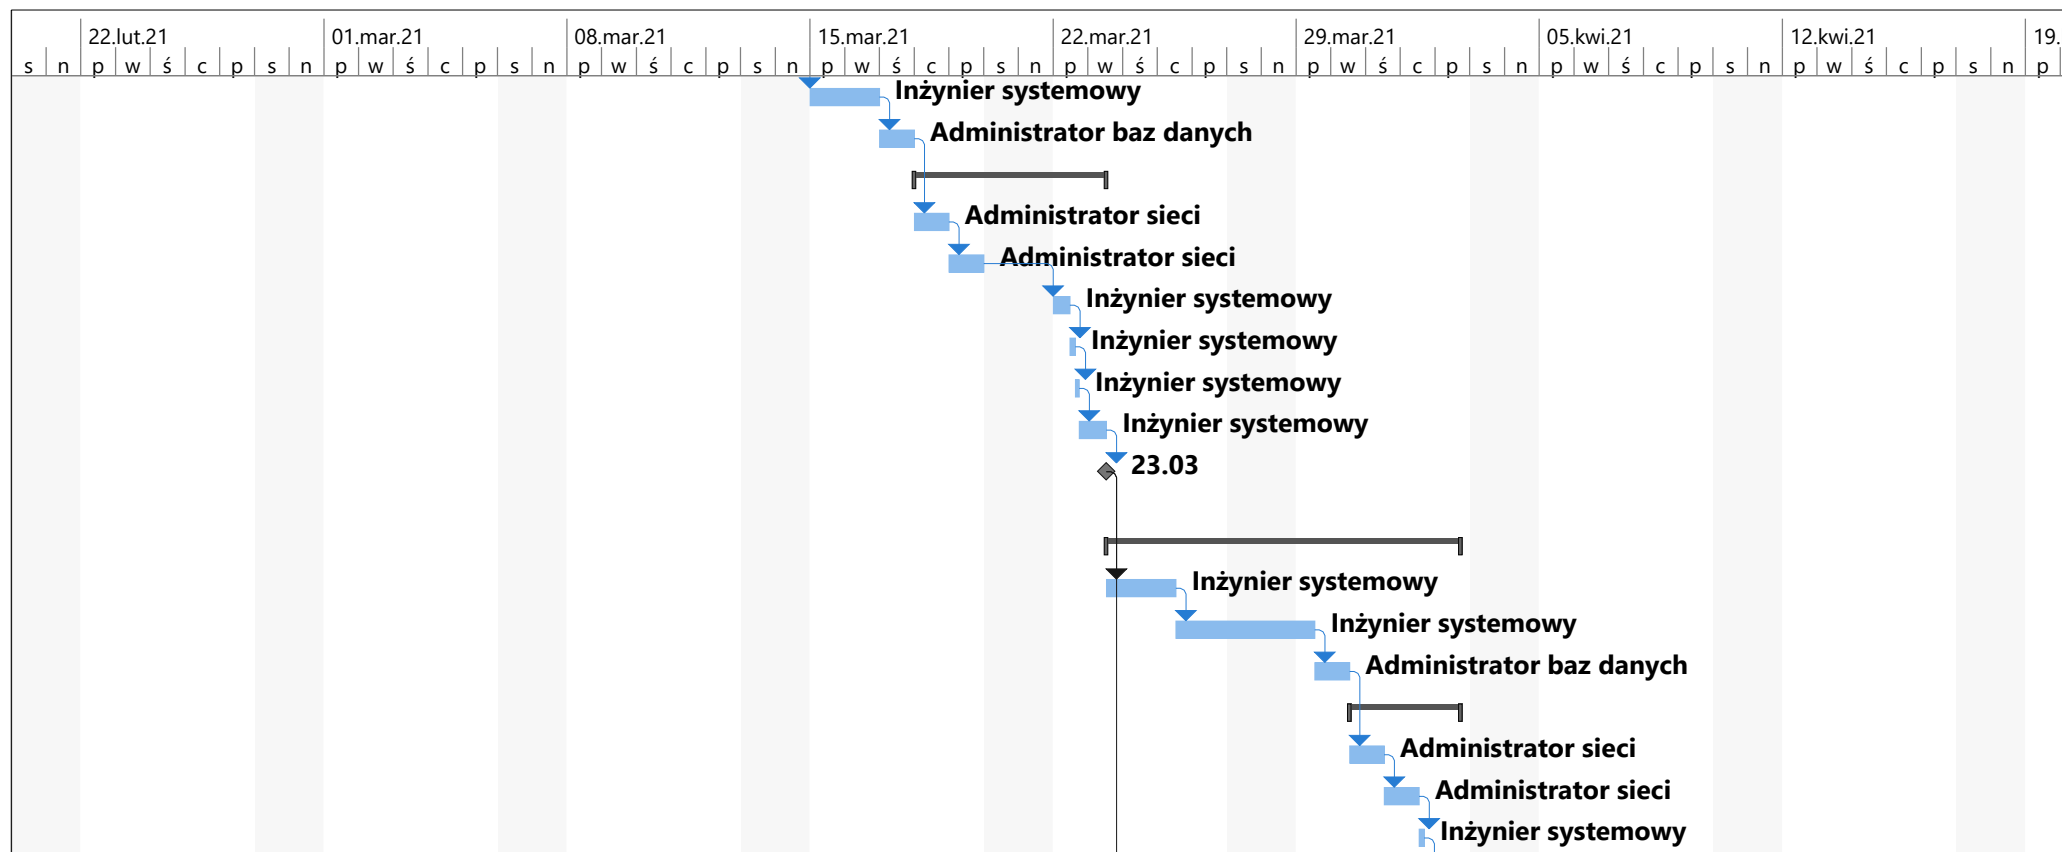


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

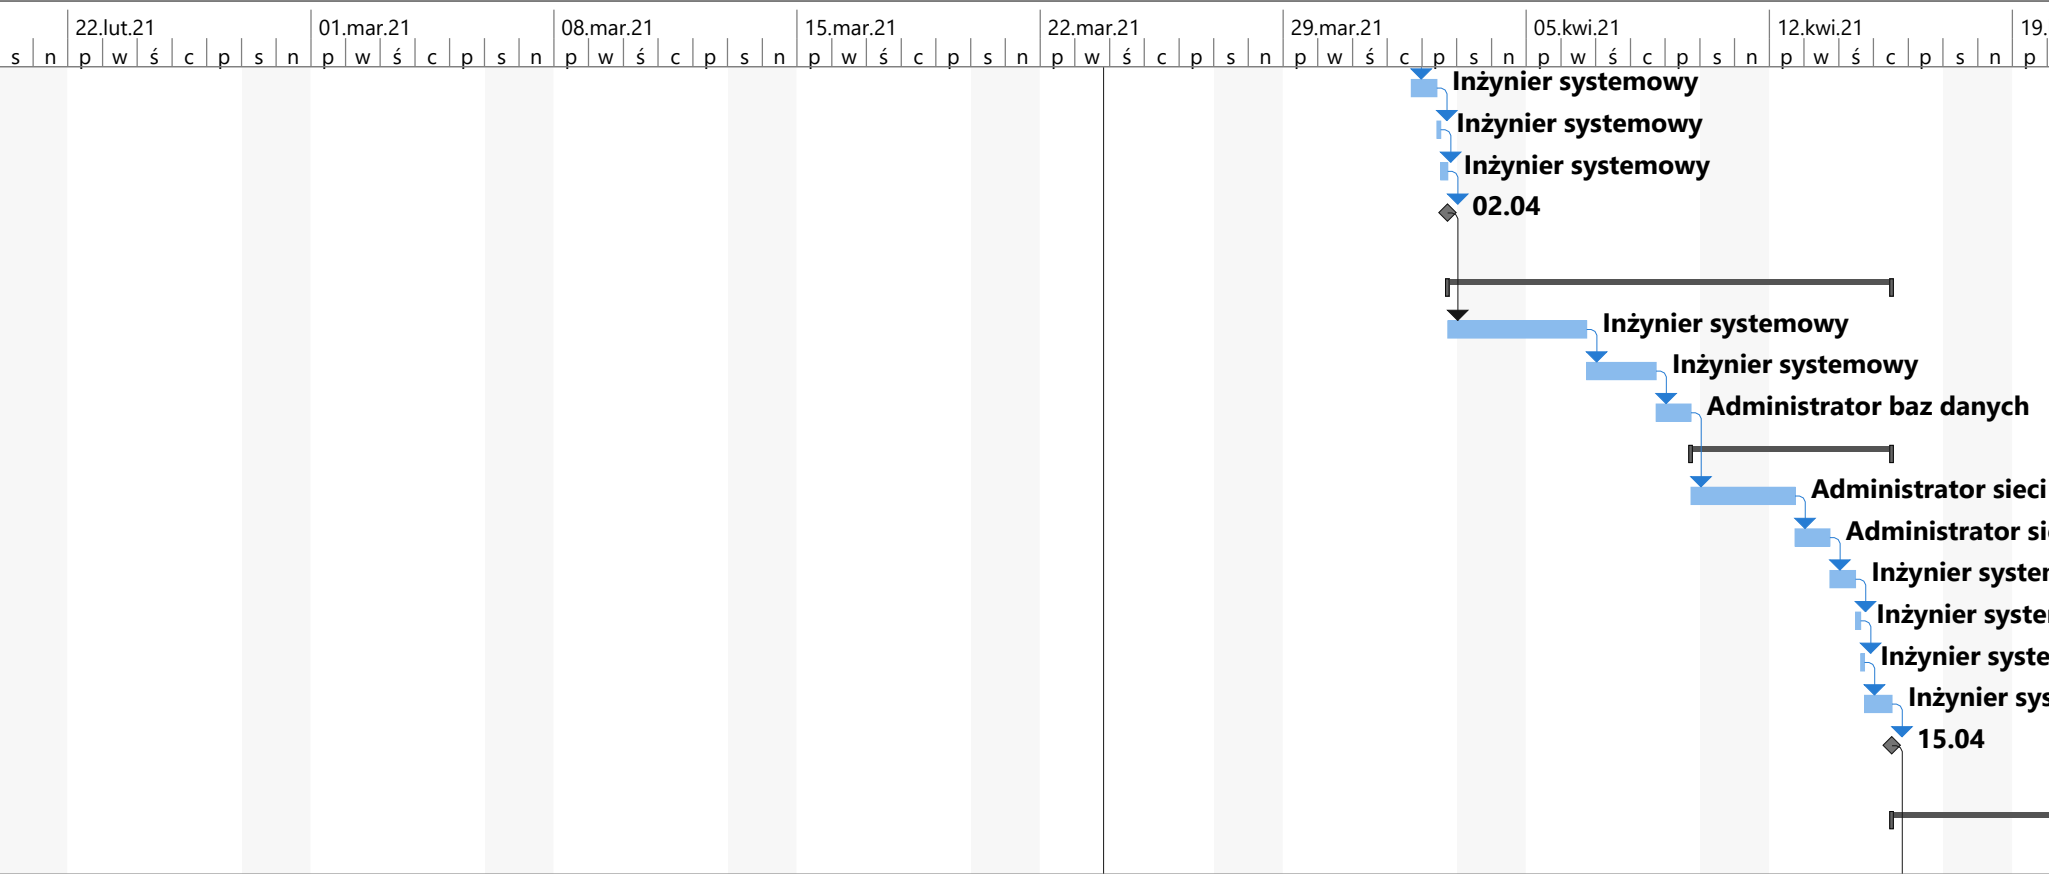


Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

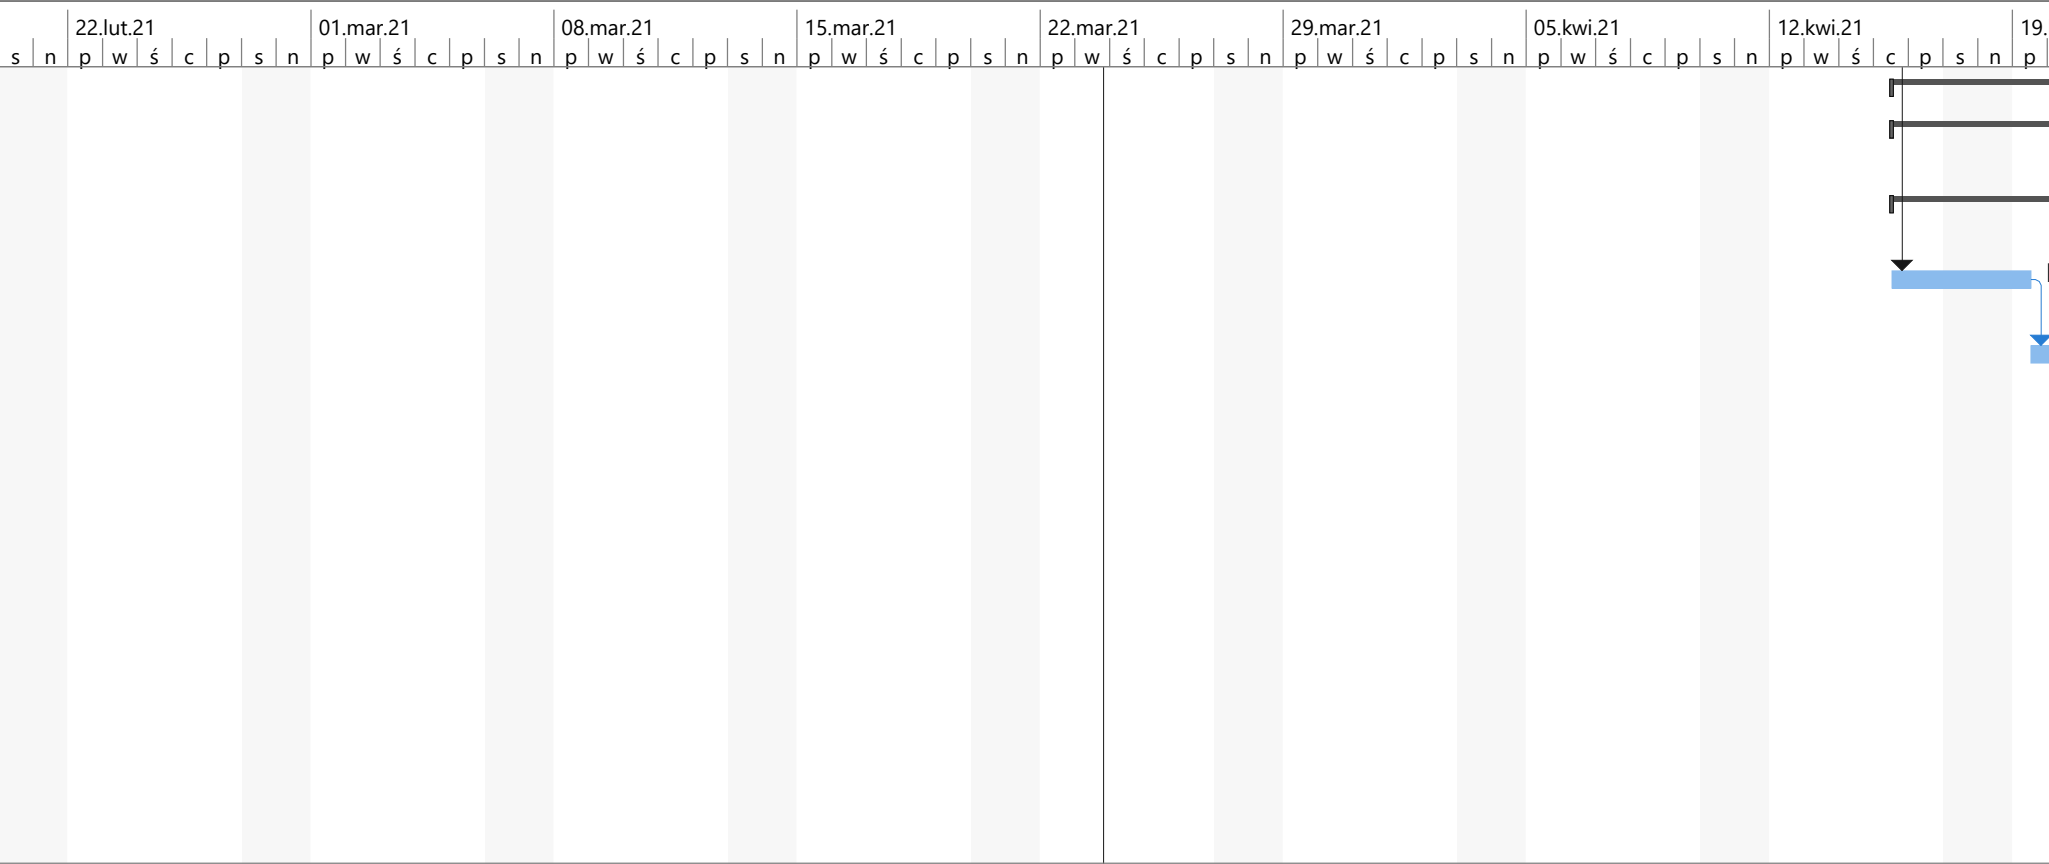

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			





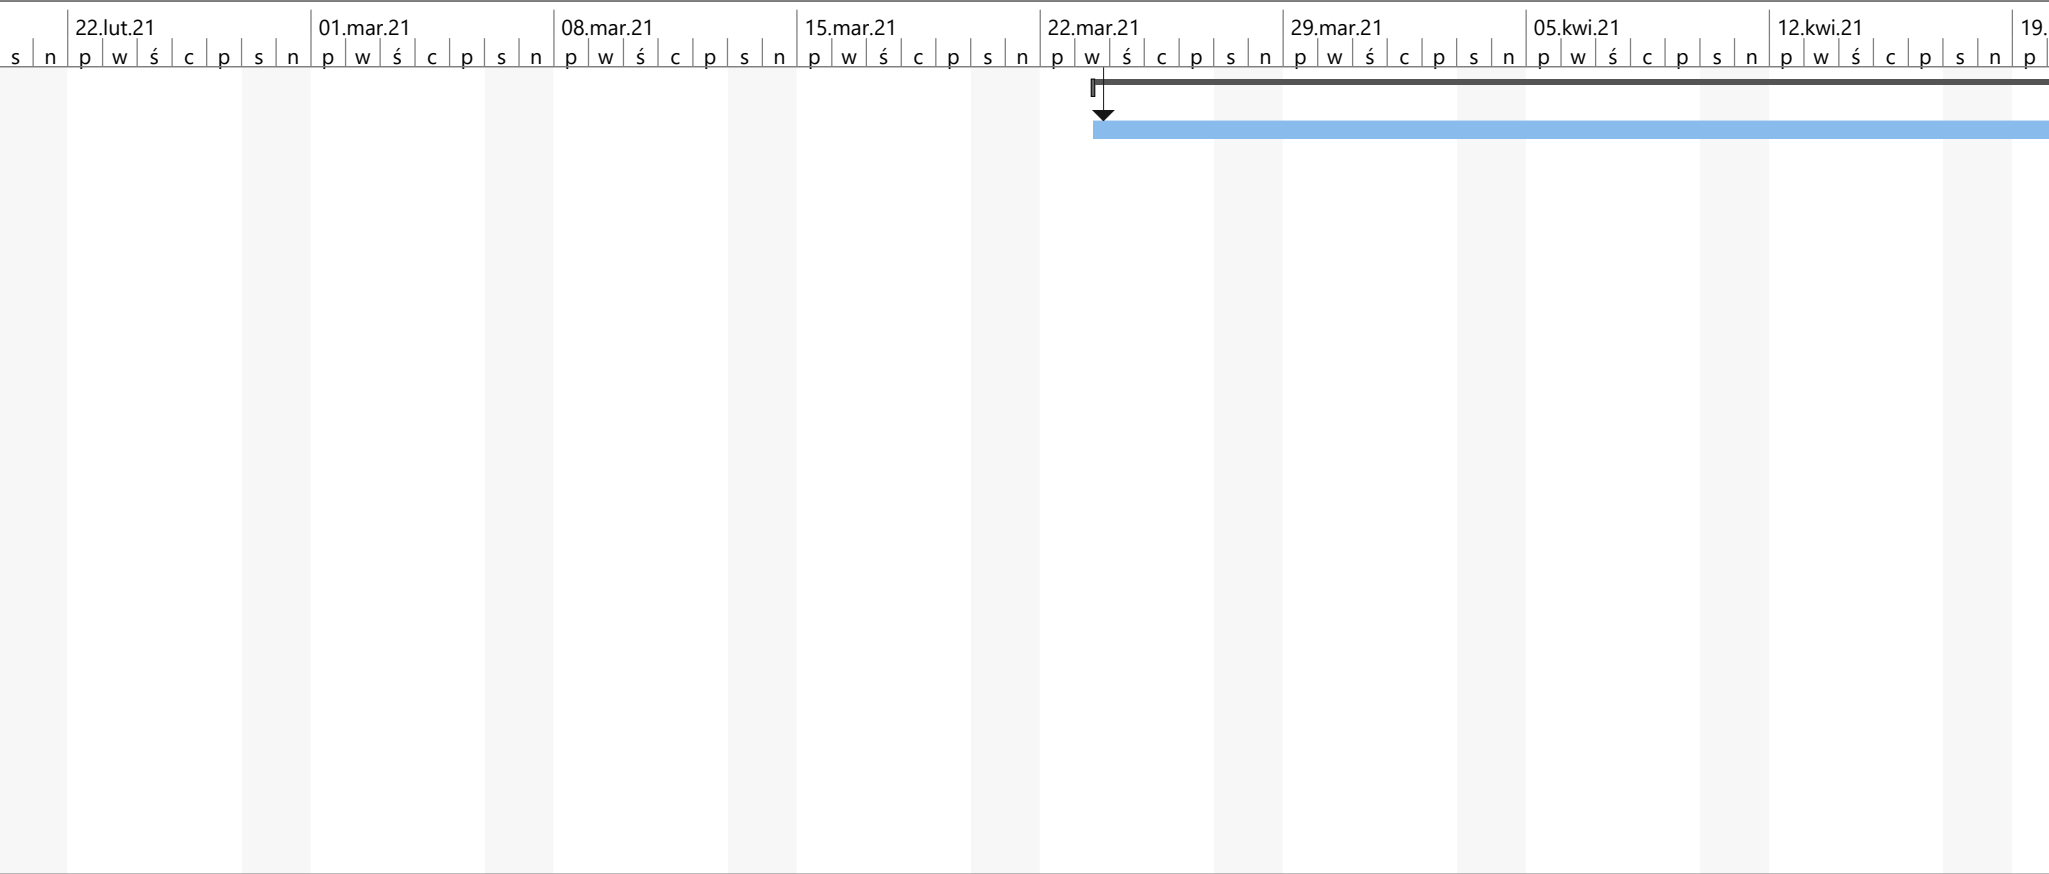



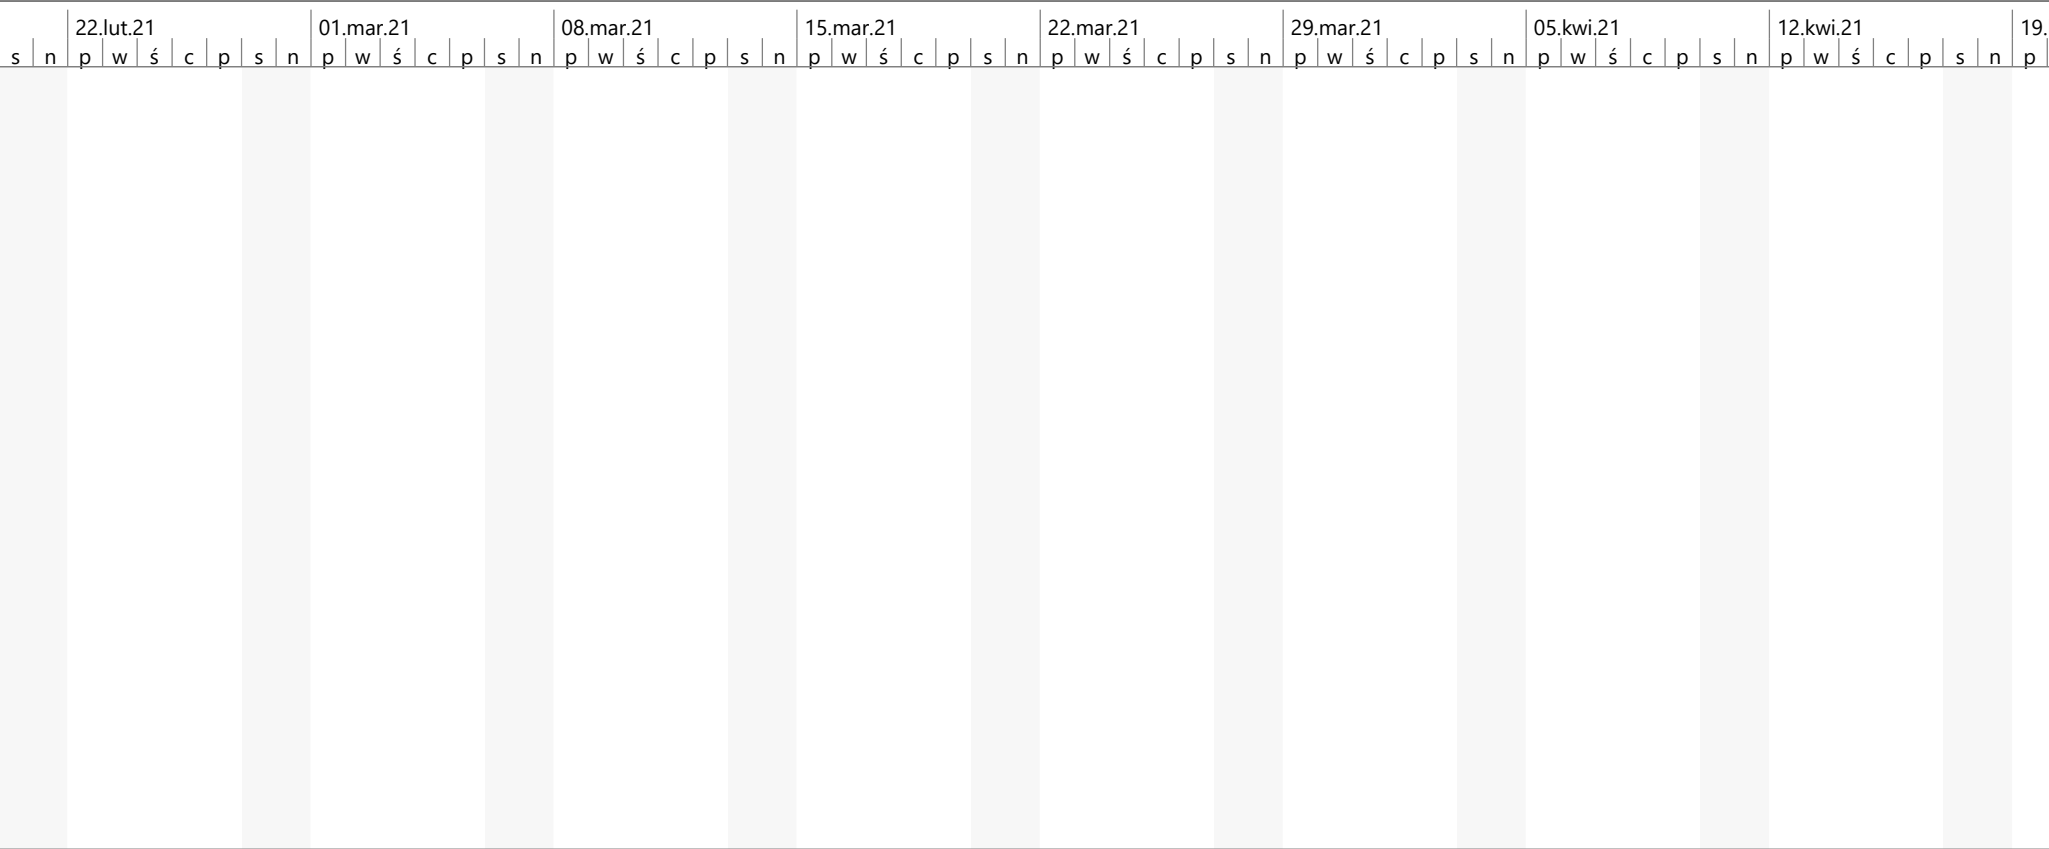
















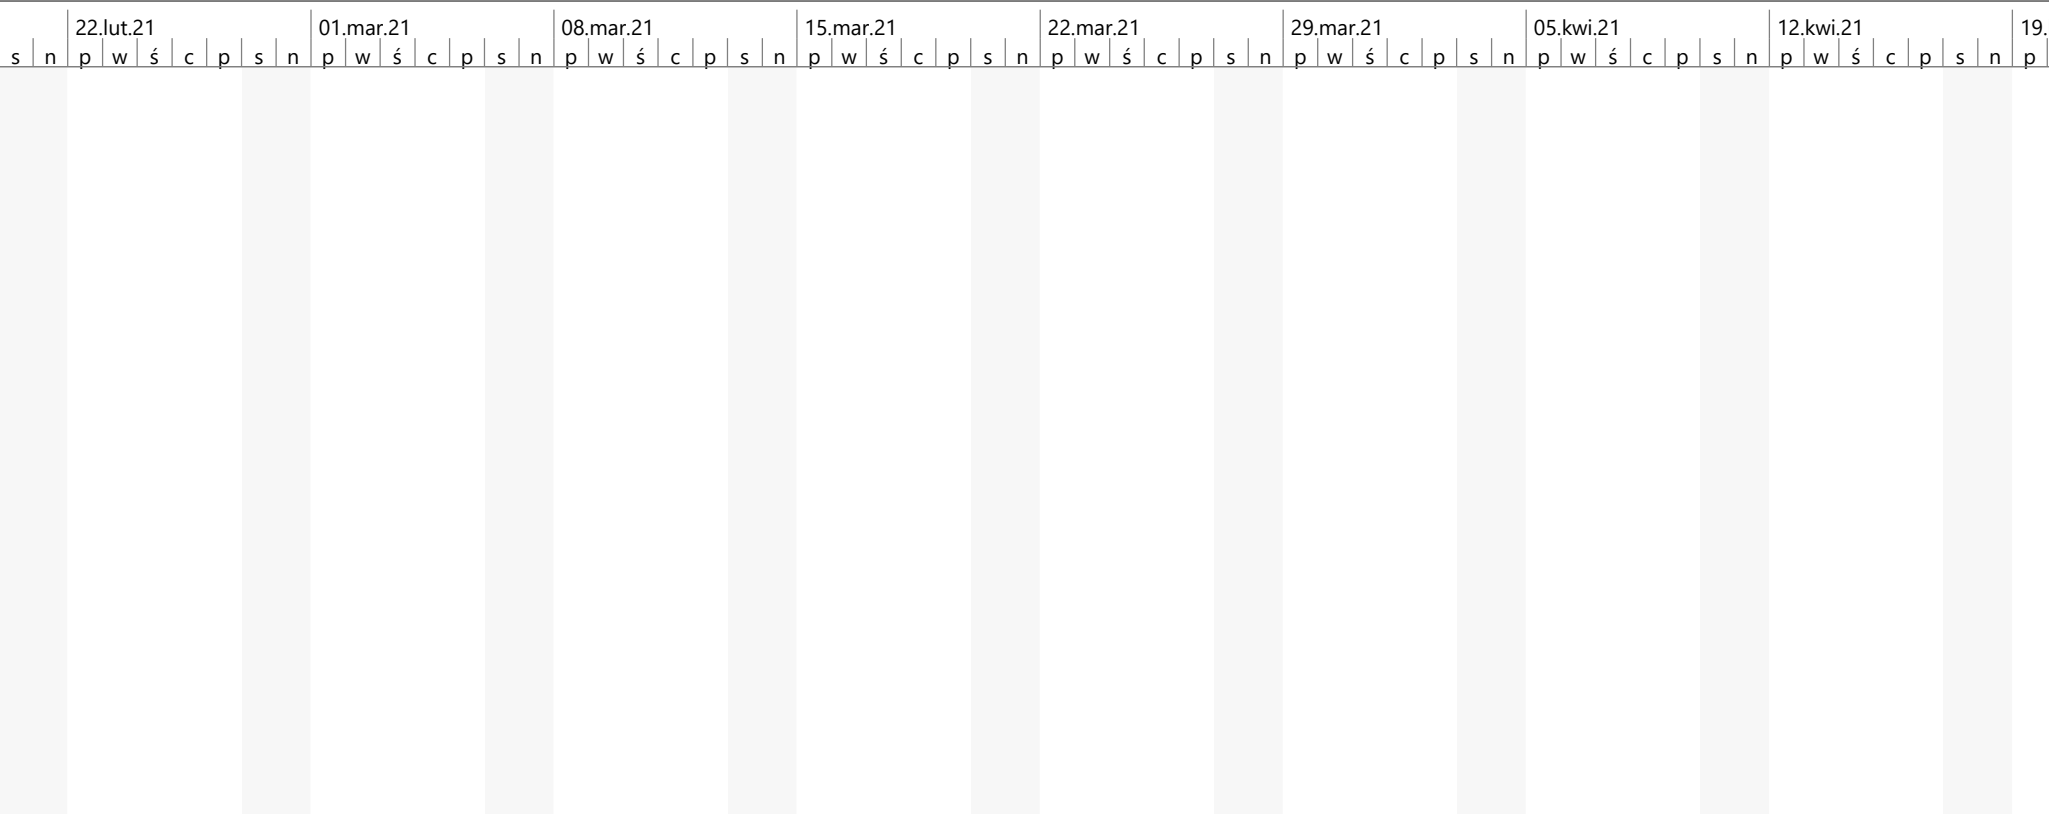
Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			







Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)

Strona 190















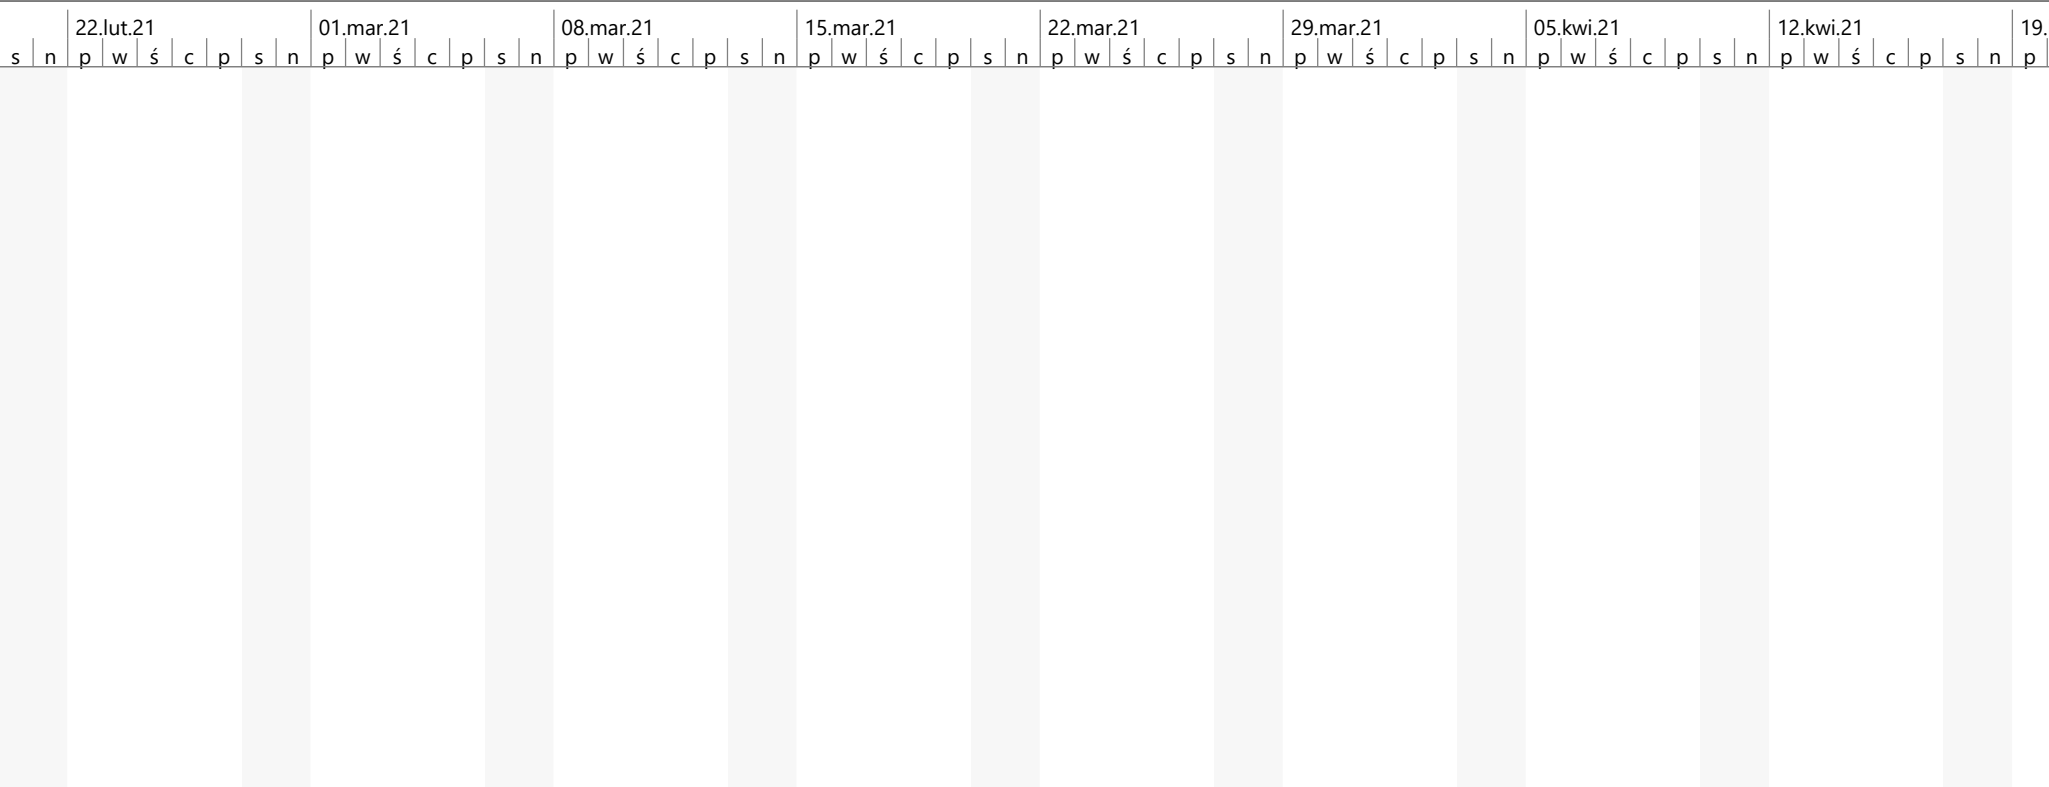




















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			














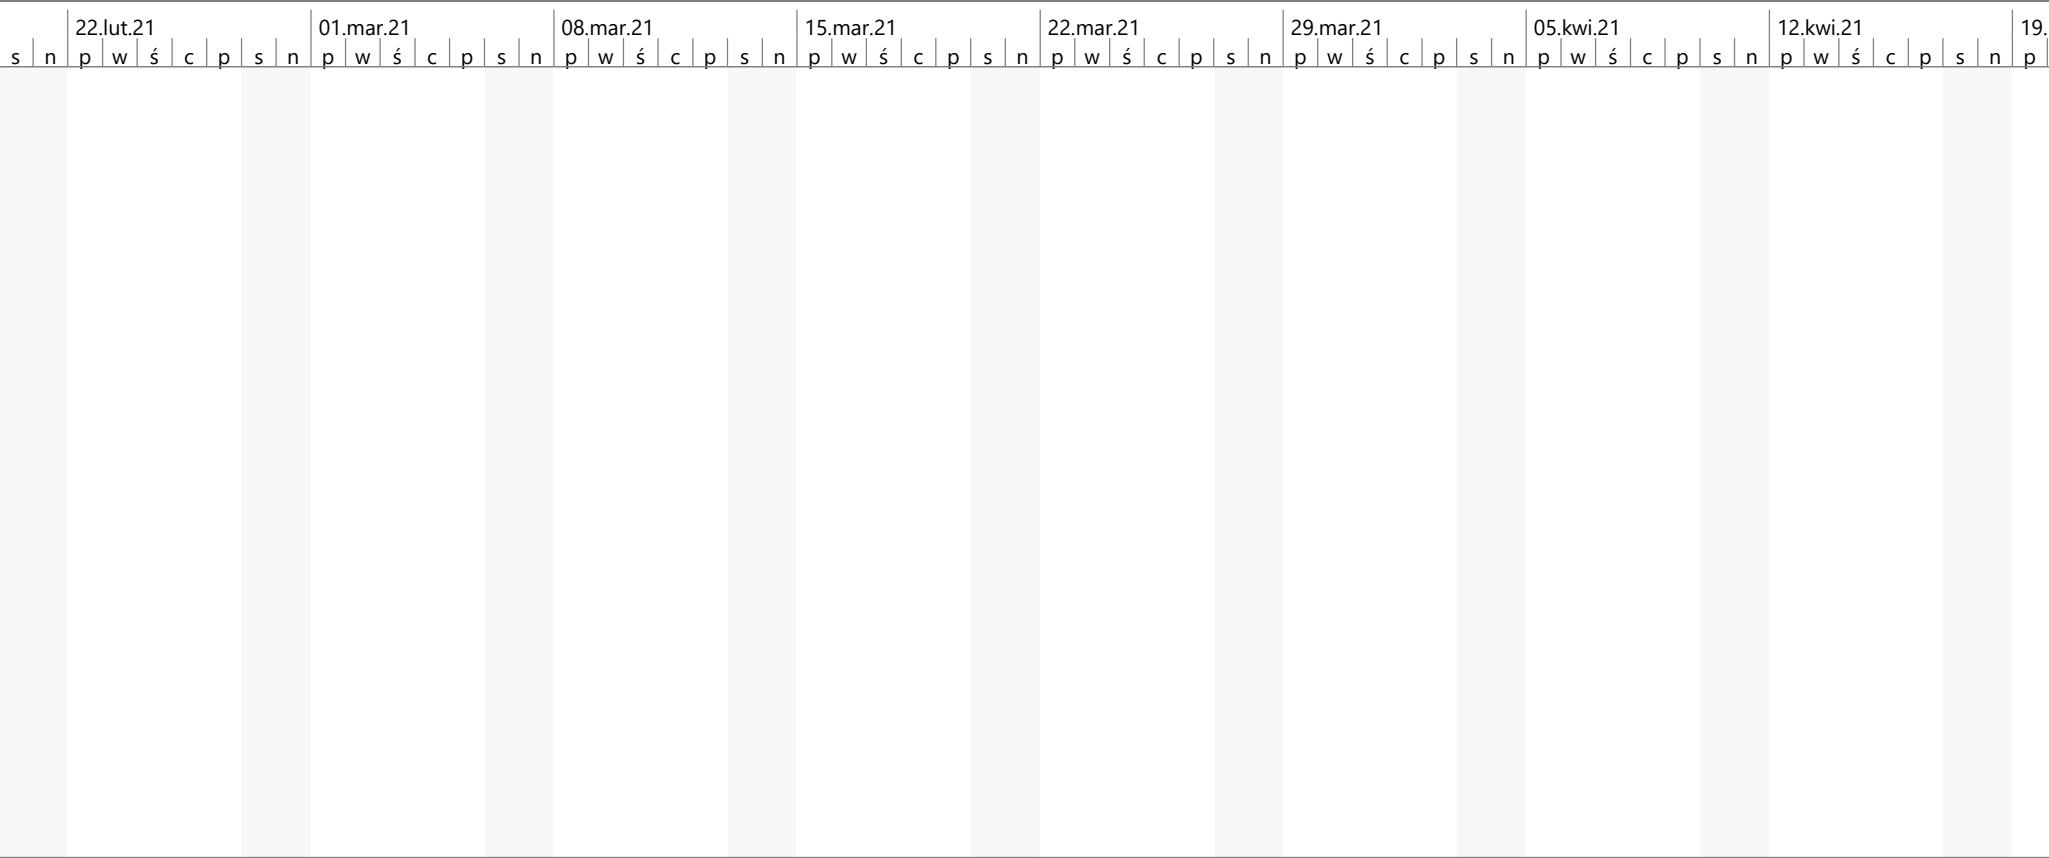







































Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



























[illegible]

Projekt: Projekt1		Data: pią, 07.08.20	
Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			









[illegible]


[illegible]



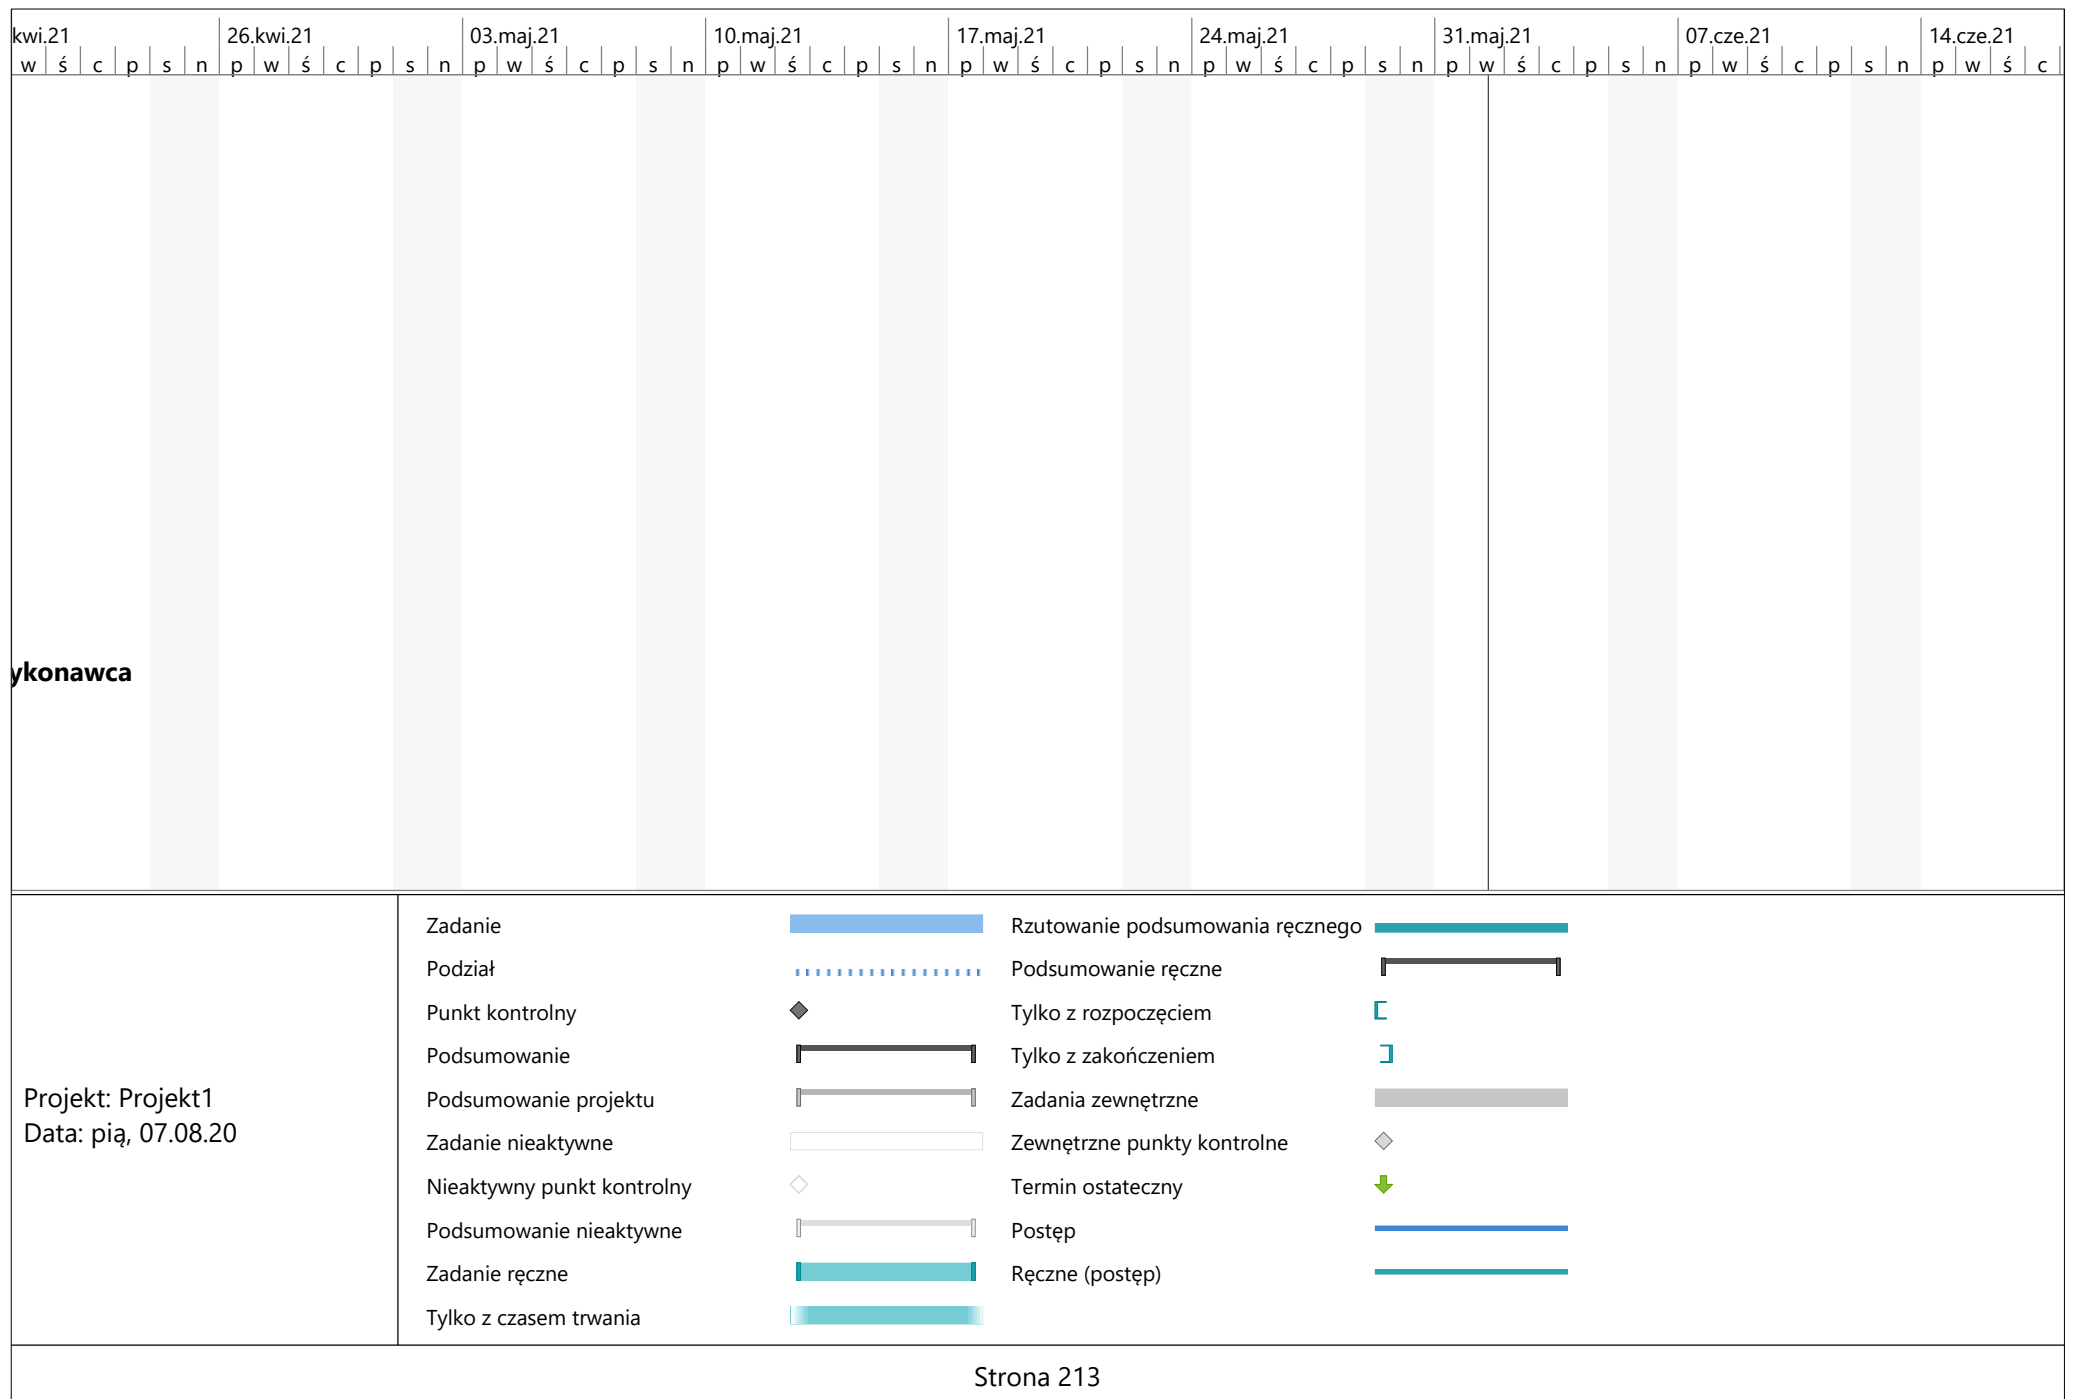


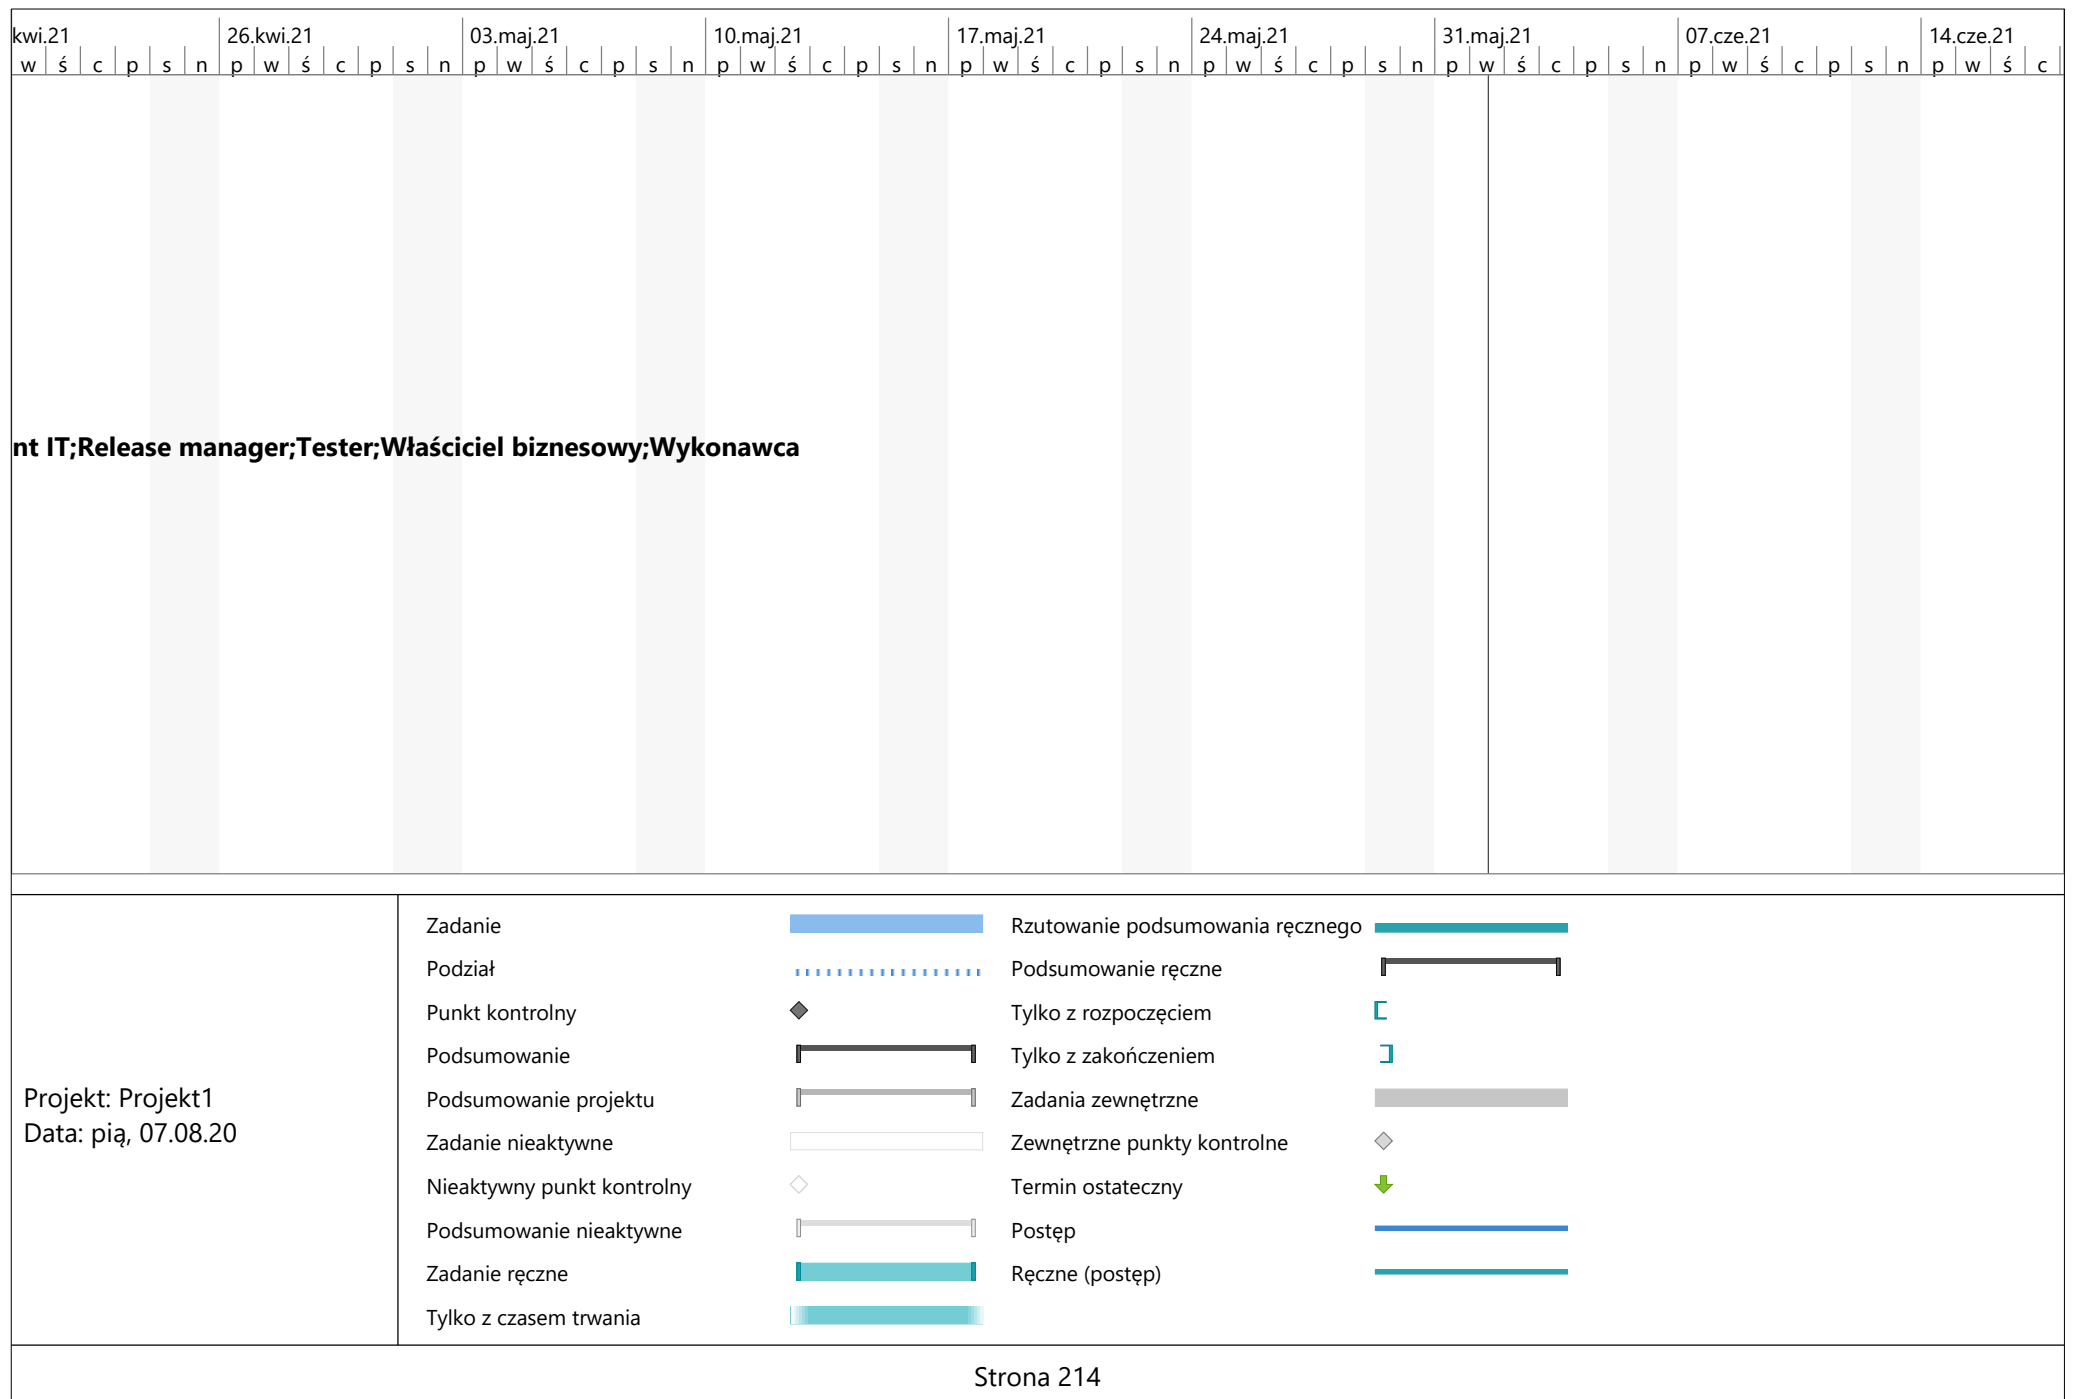




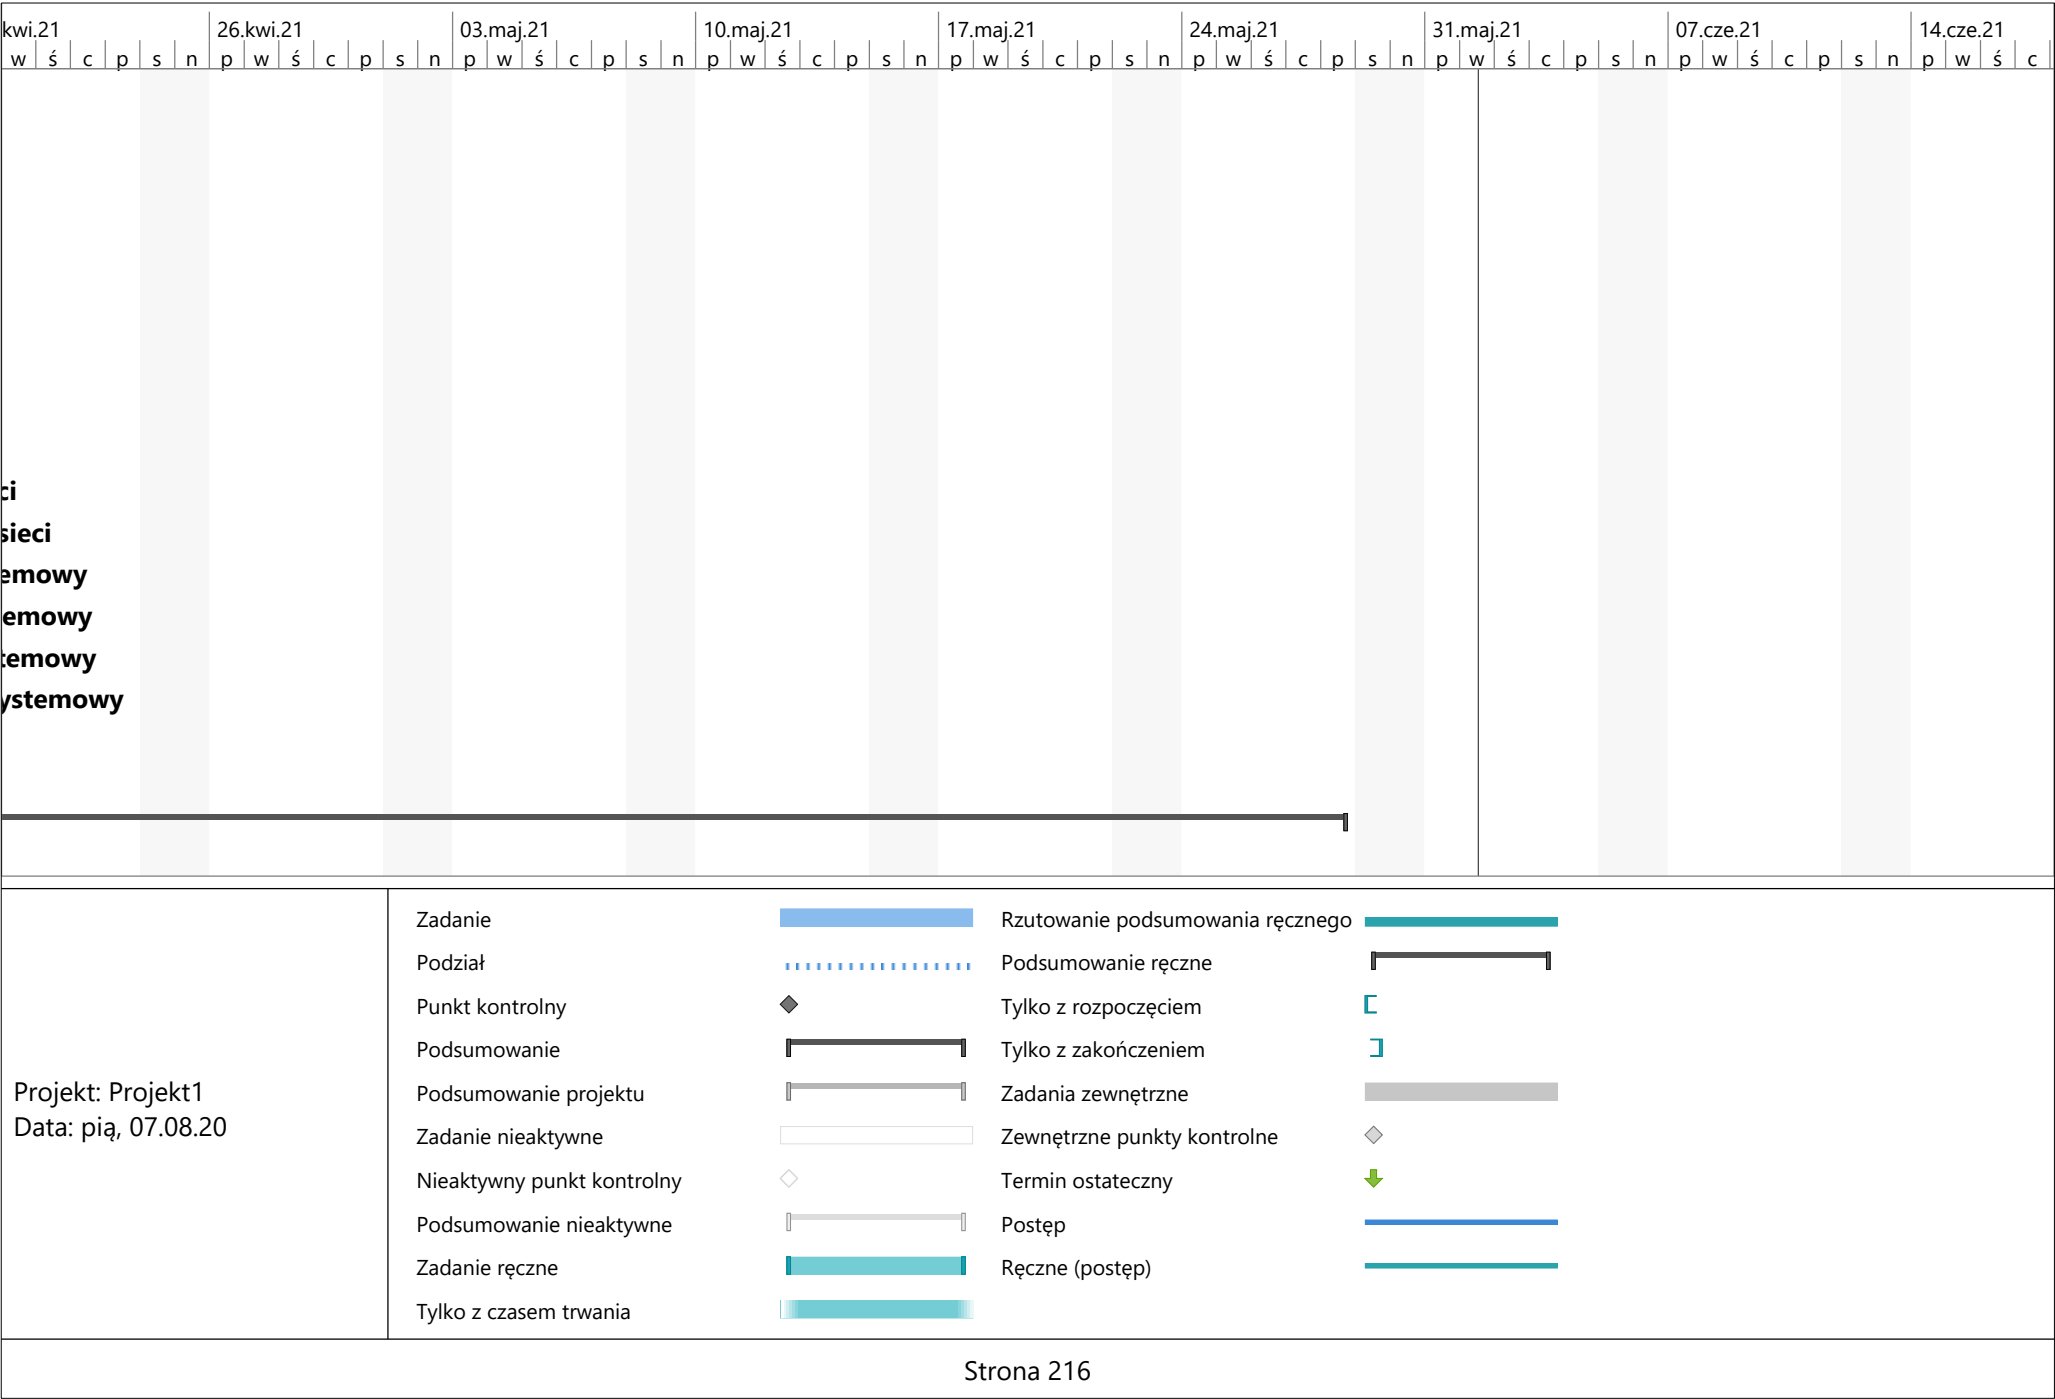



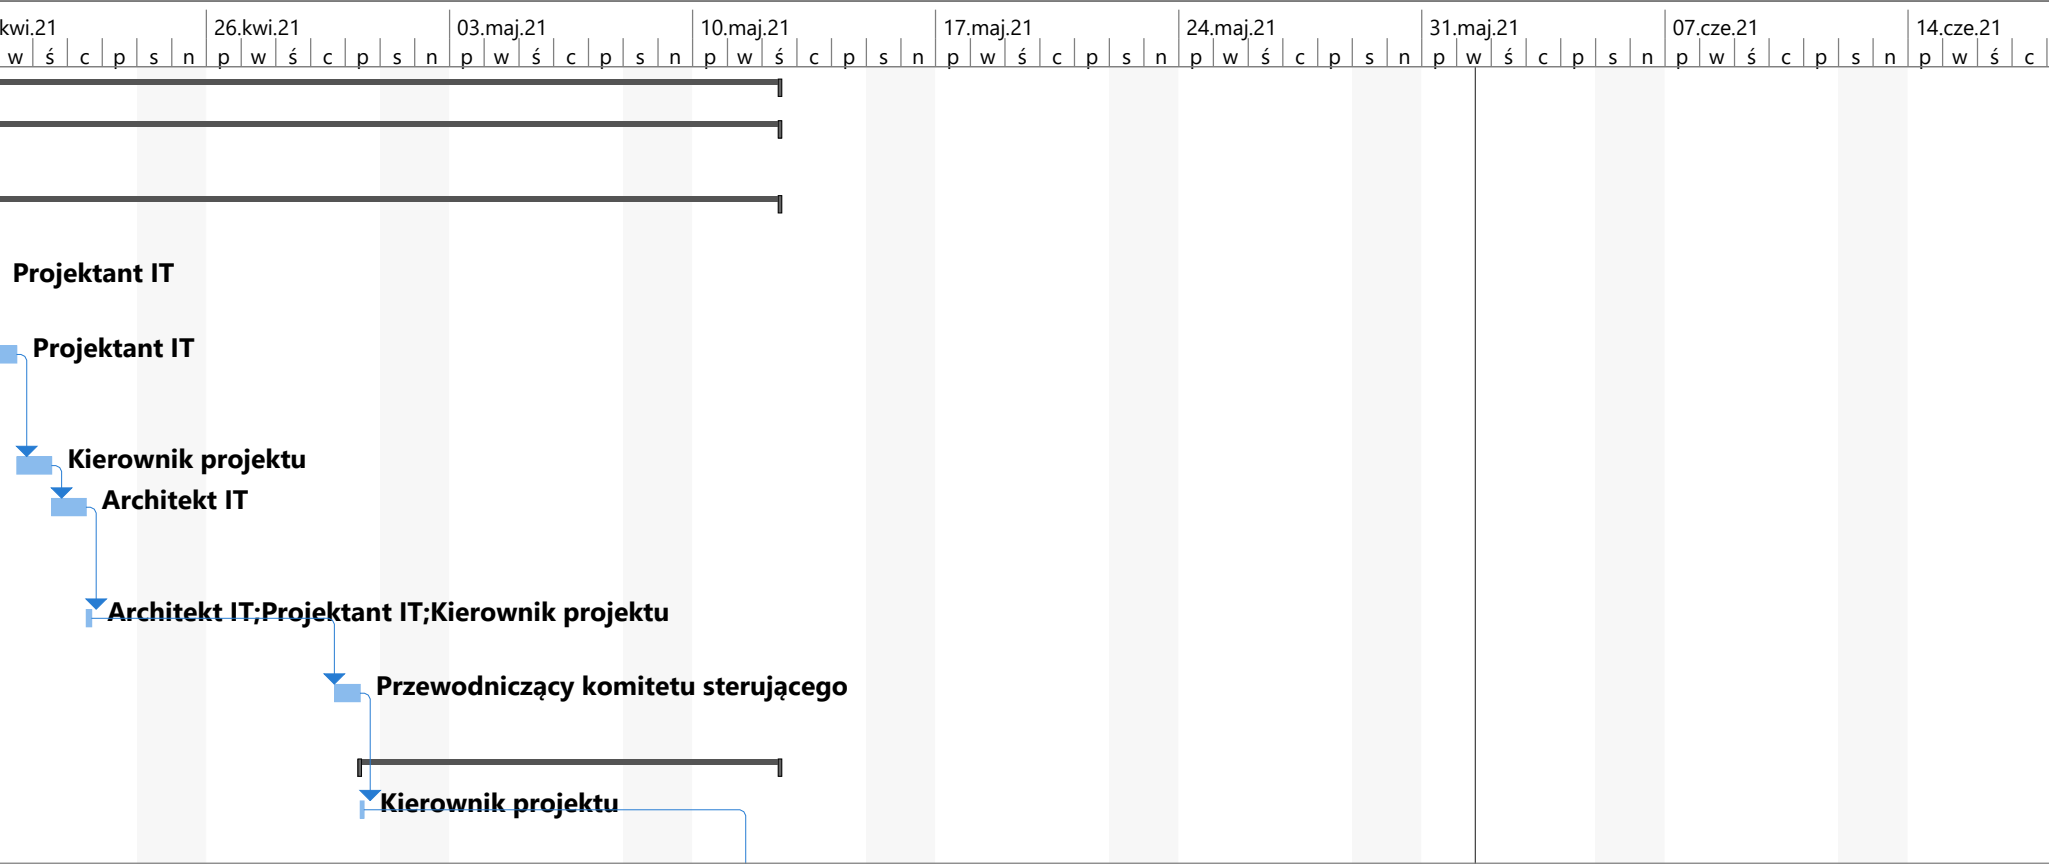


Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

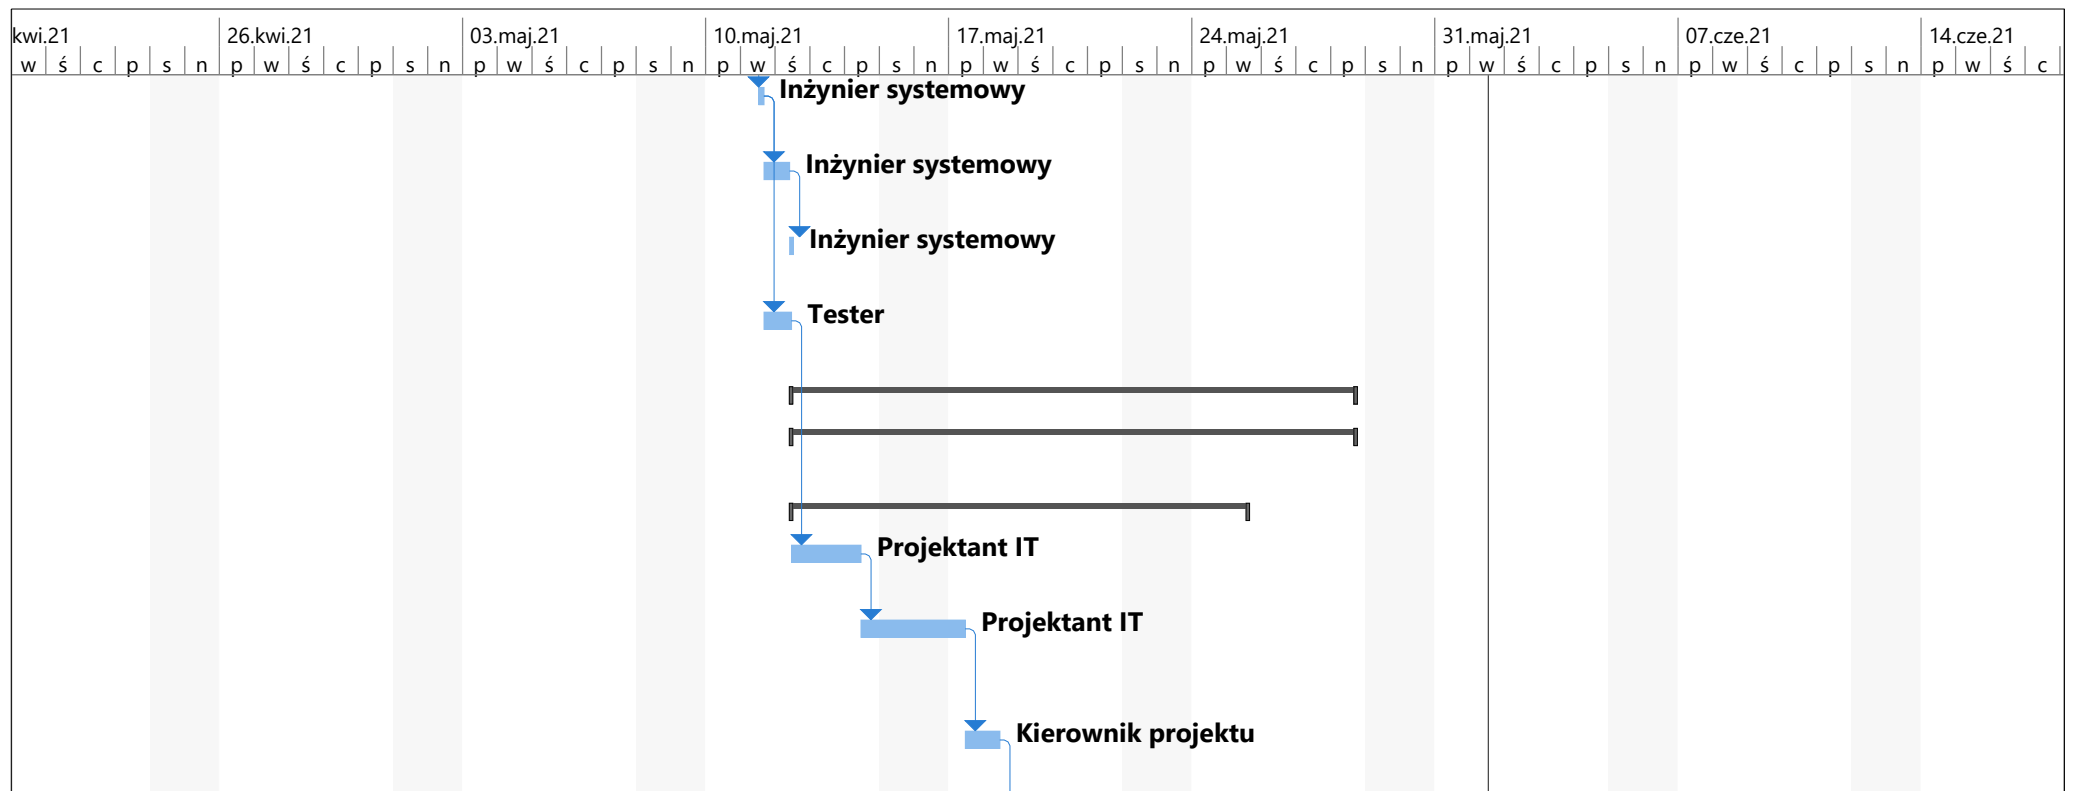


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



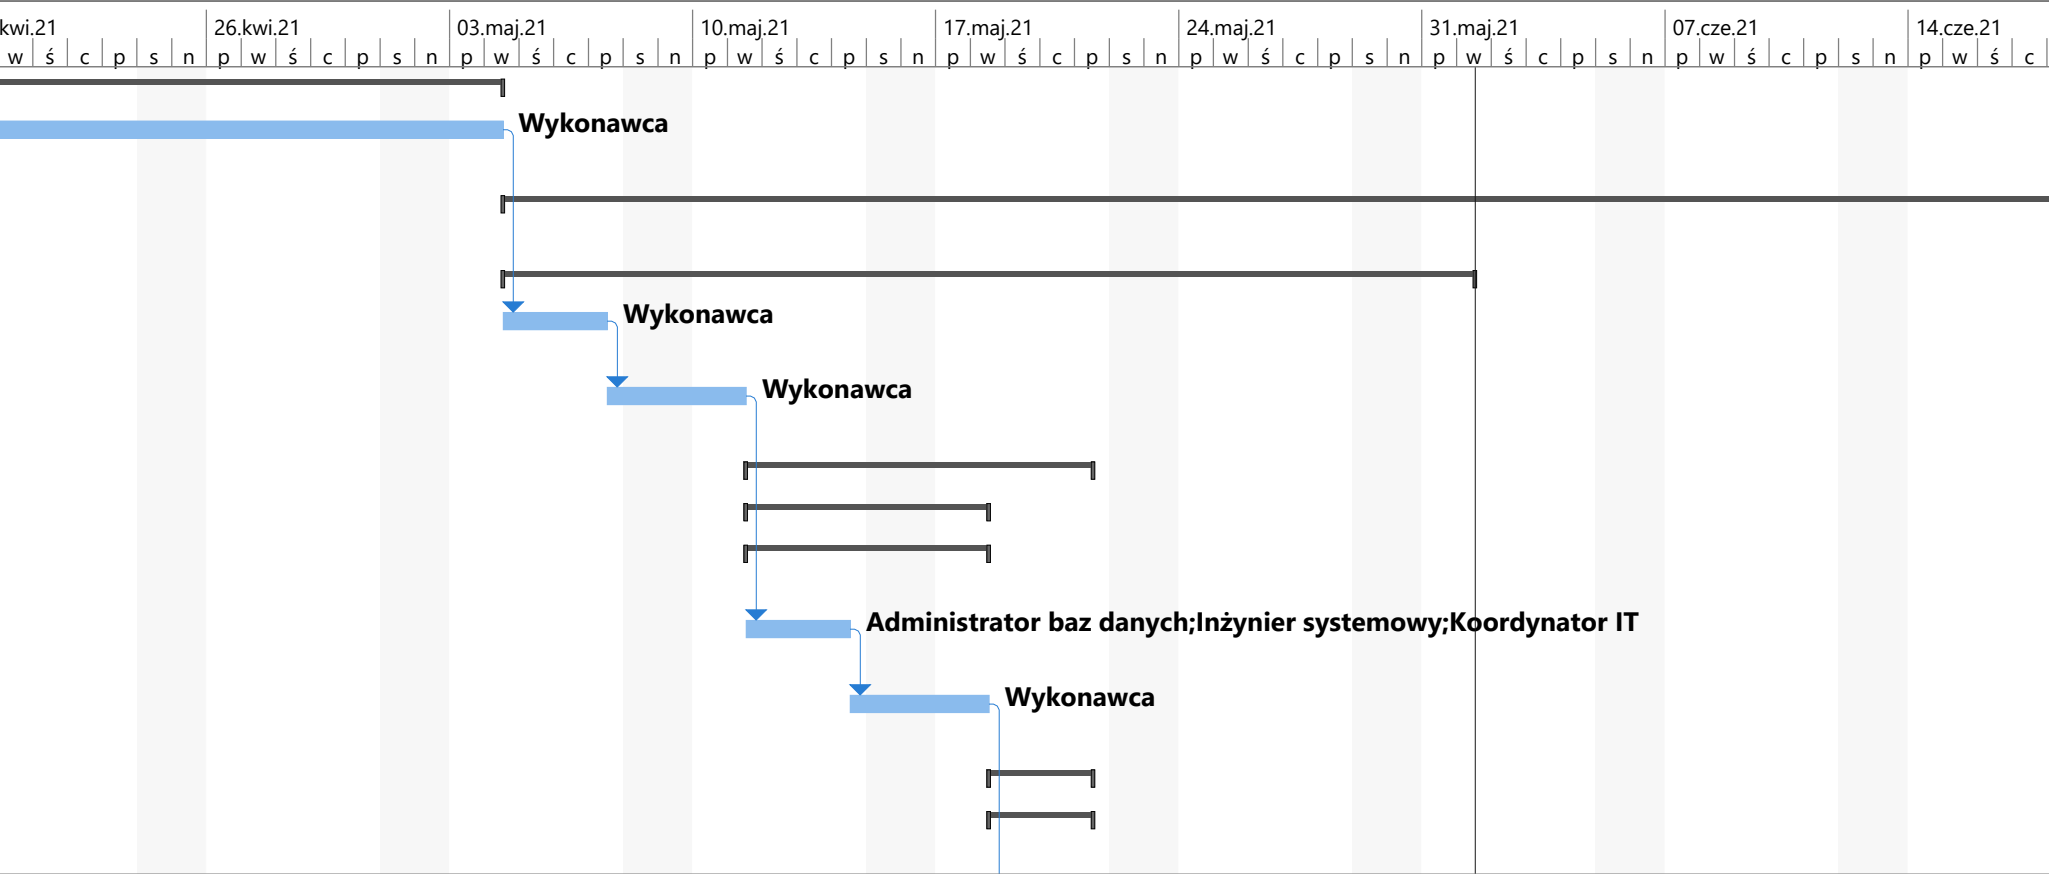


Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

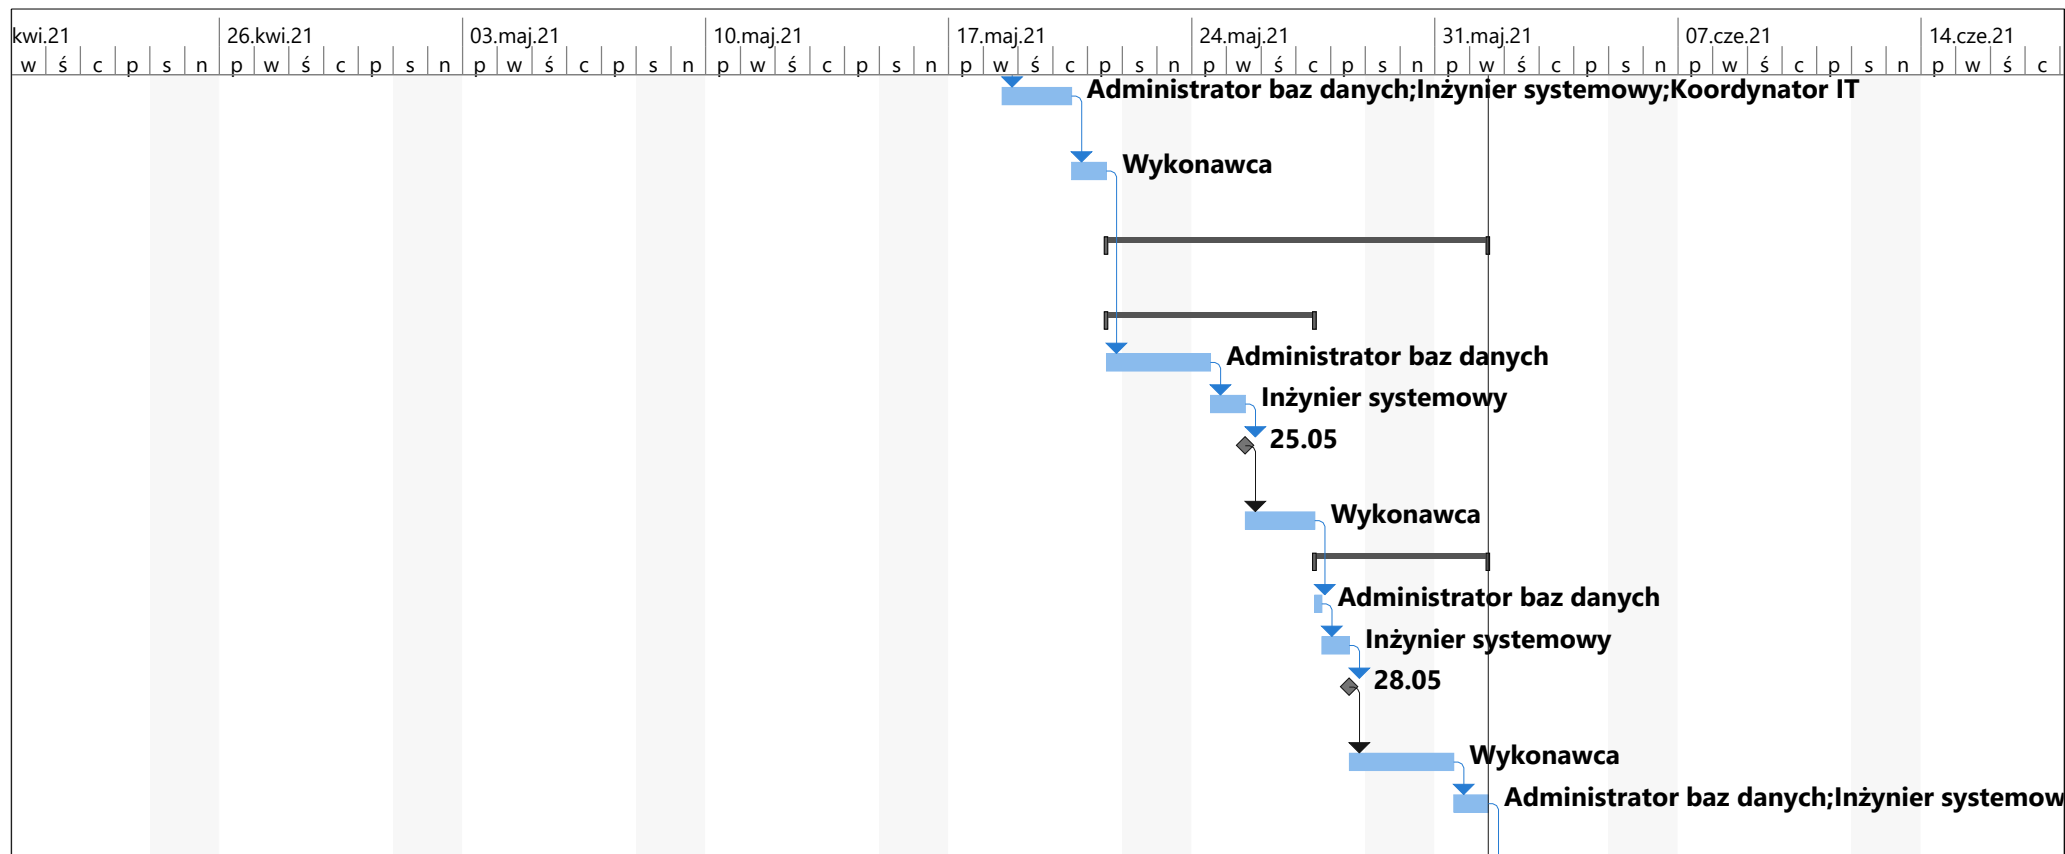


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

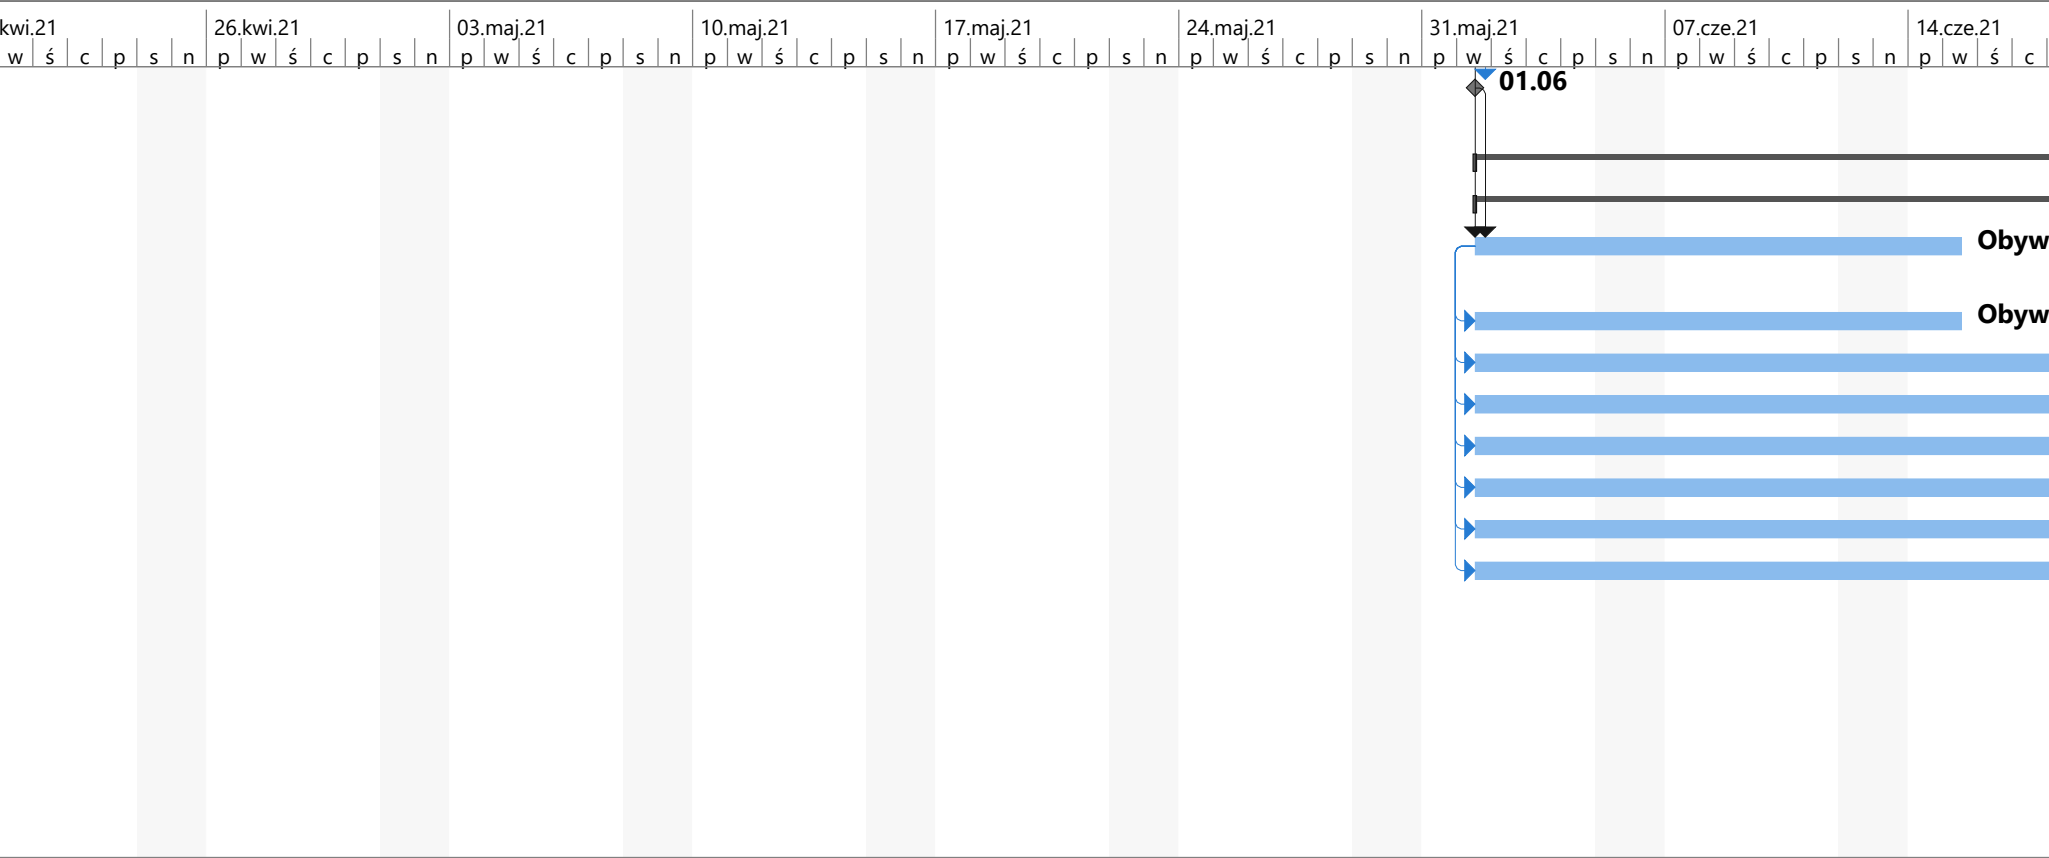

<div>Projekt: Projekt1</div> <div>Data: pią, 07.08.20</div>	Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>
	Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>
	Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>
	Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>
	Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>
	Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>
	Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>
	Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>
	Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>
	Tylko z czasem trwania	<div></div>		





Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne


Zewnętrzne punkty kontrolne









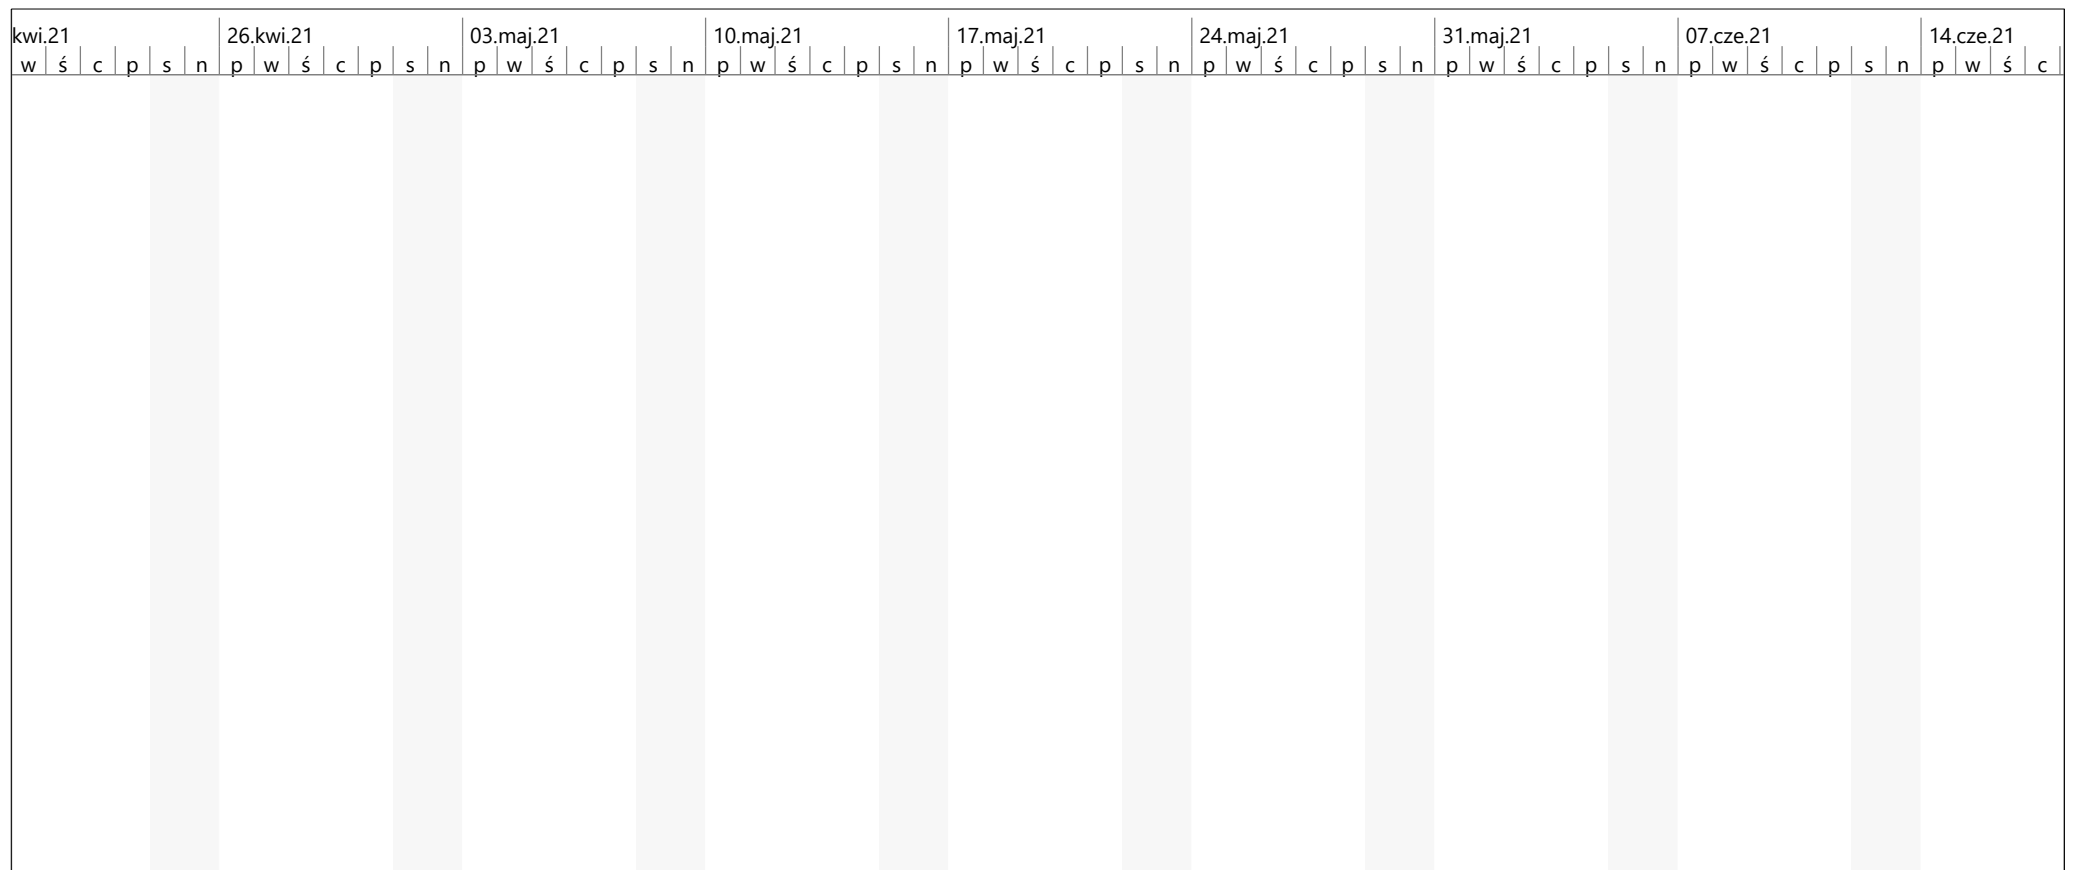










Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)

























Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




[illegible]








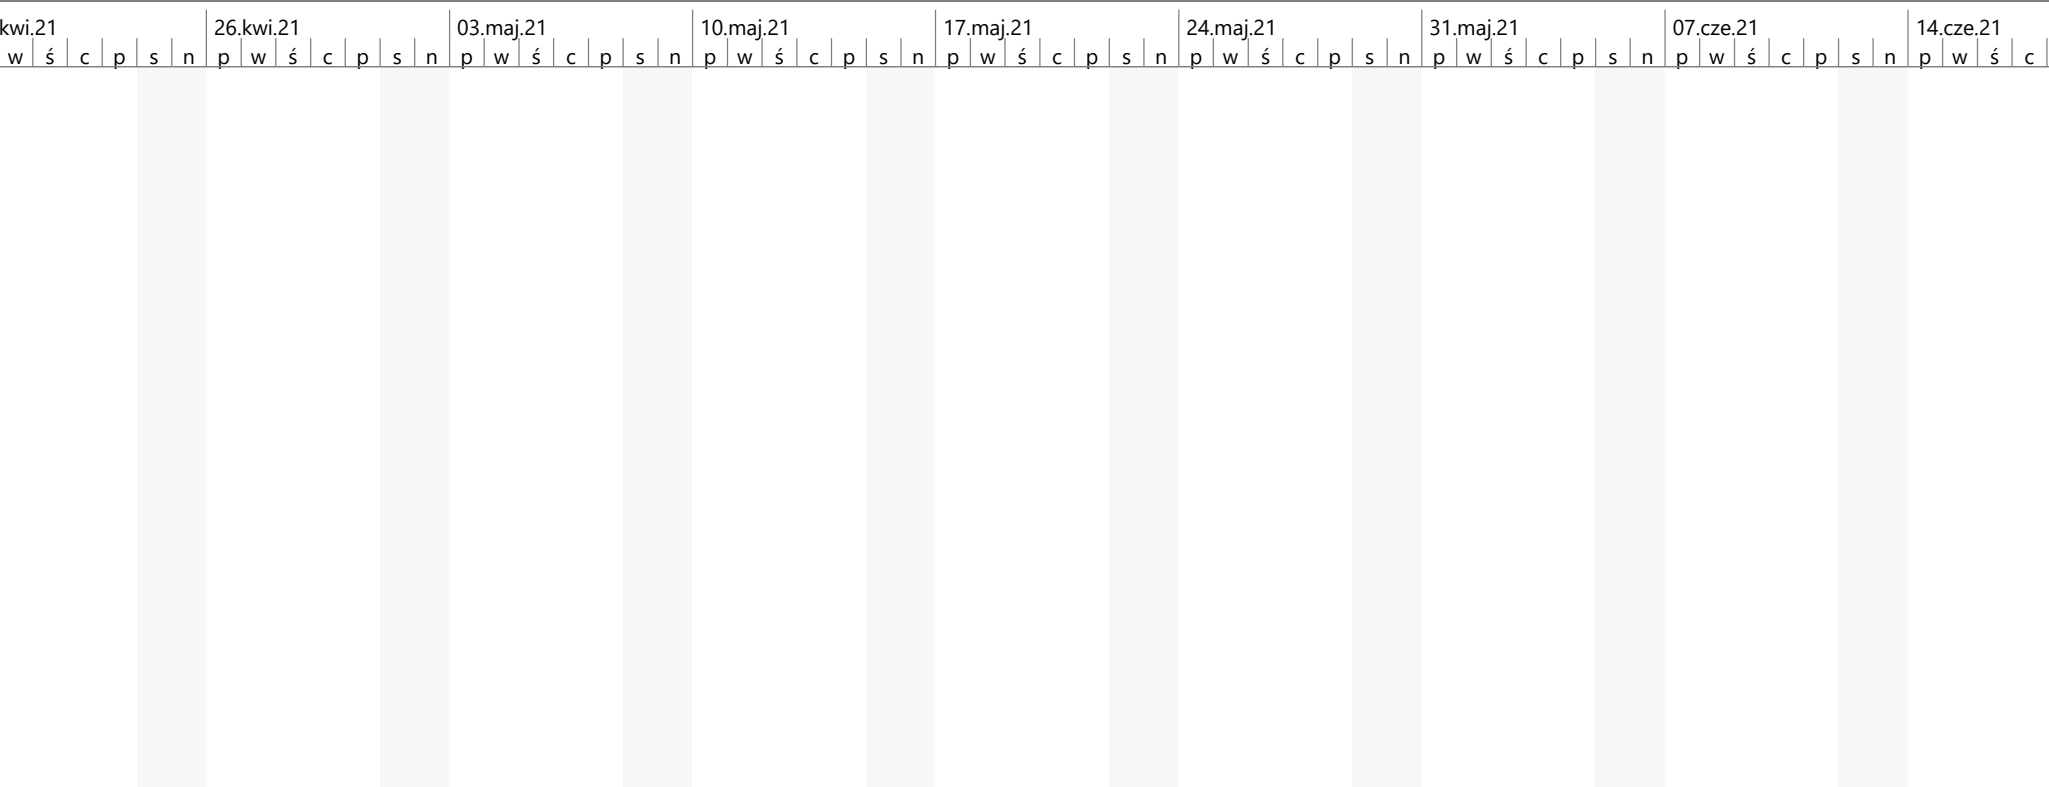



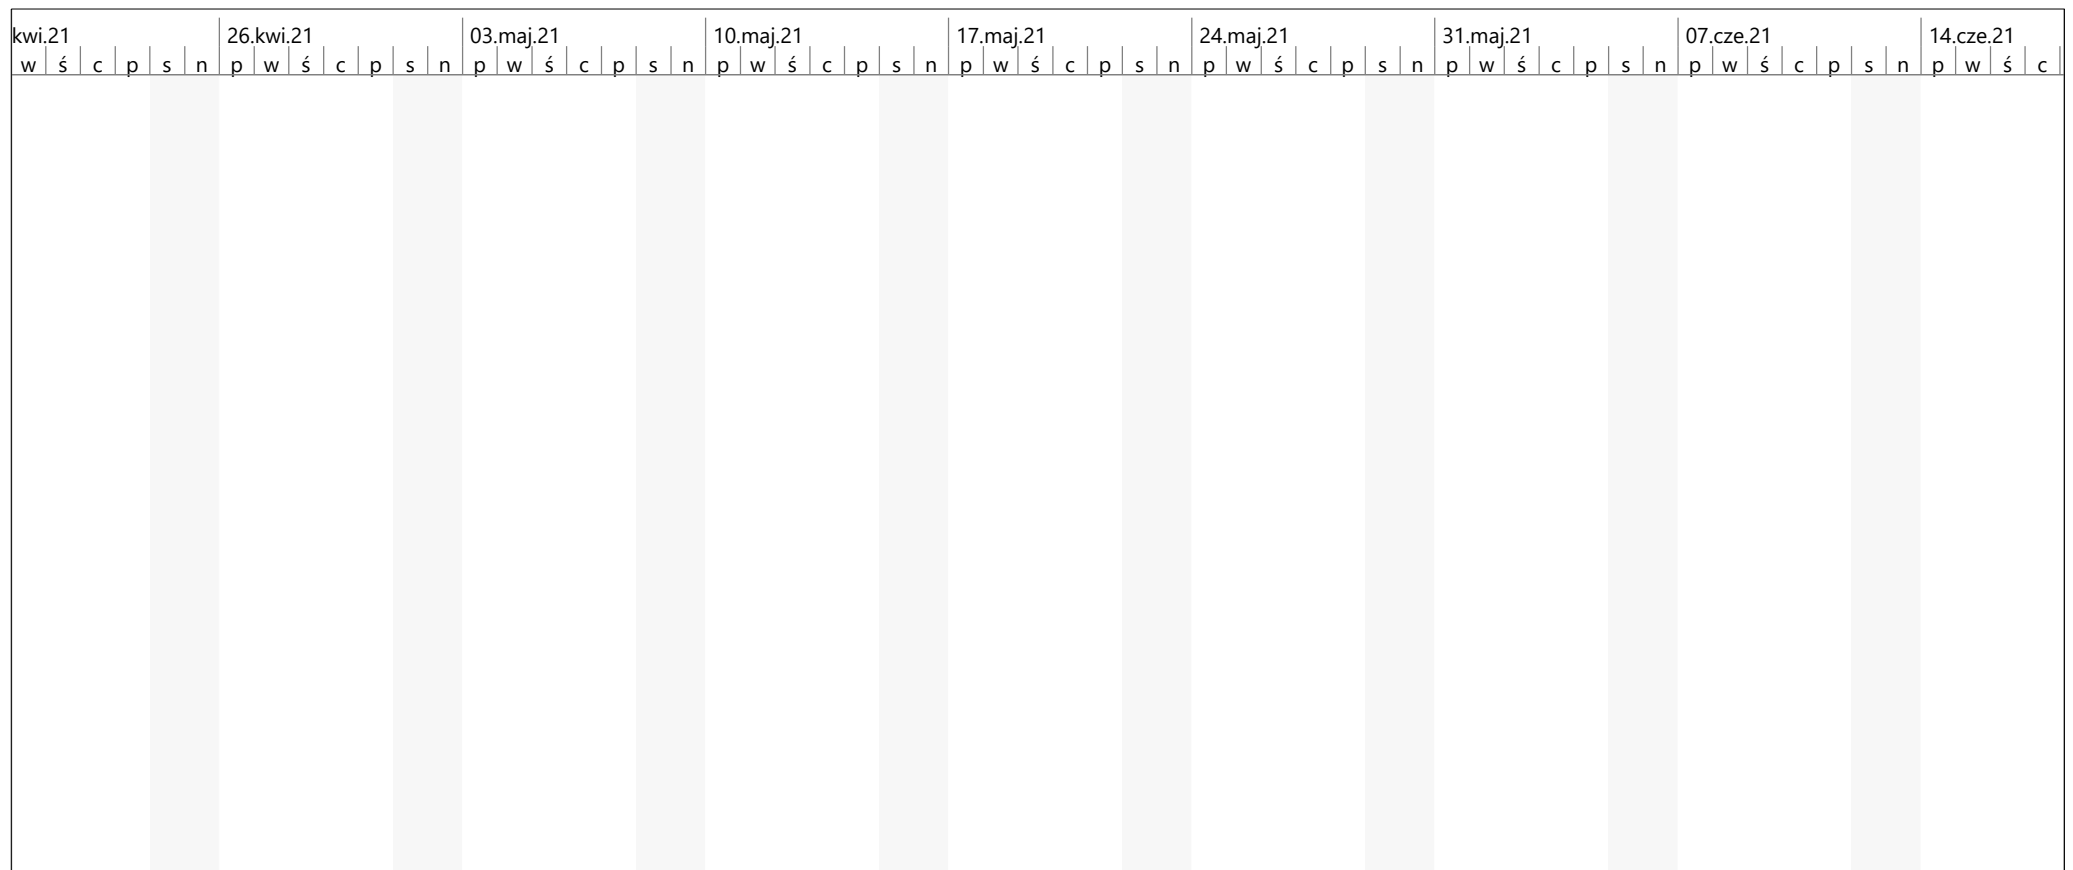










Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			












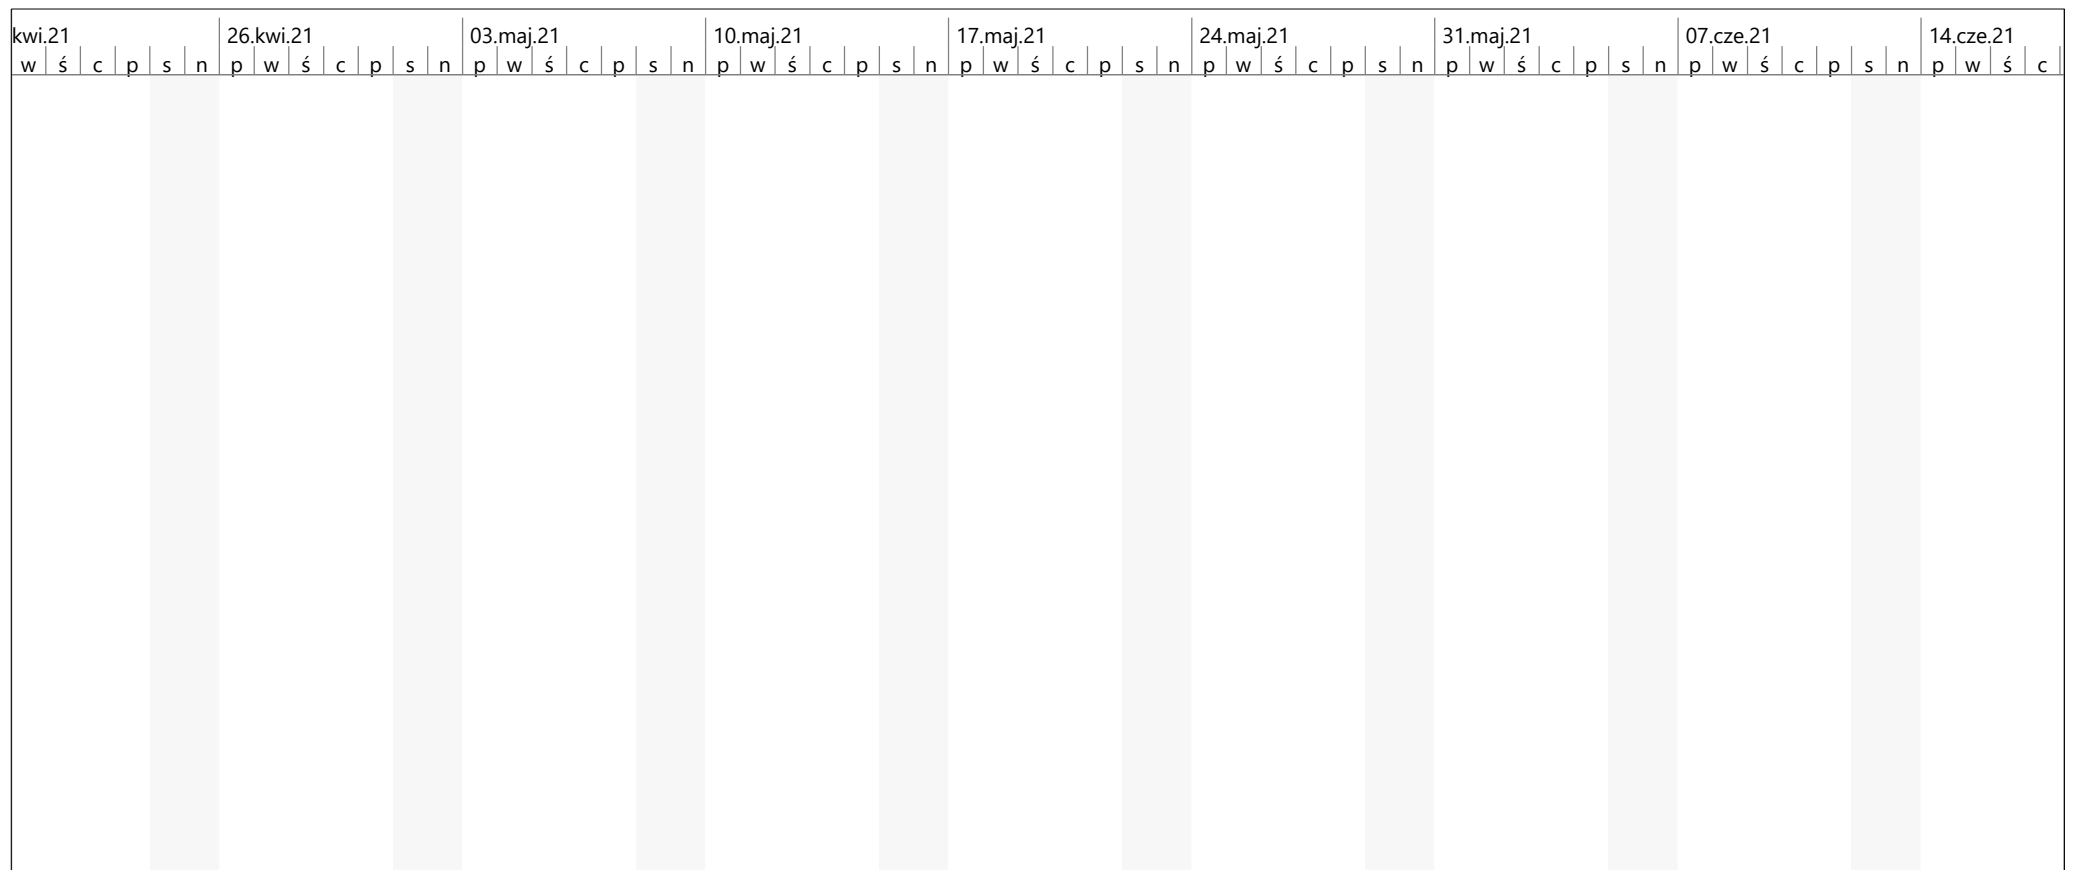












<div>Projekt: Projekt1</div> <div>Data: pią, 07.08.20</div>	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			














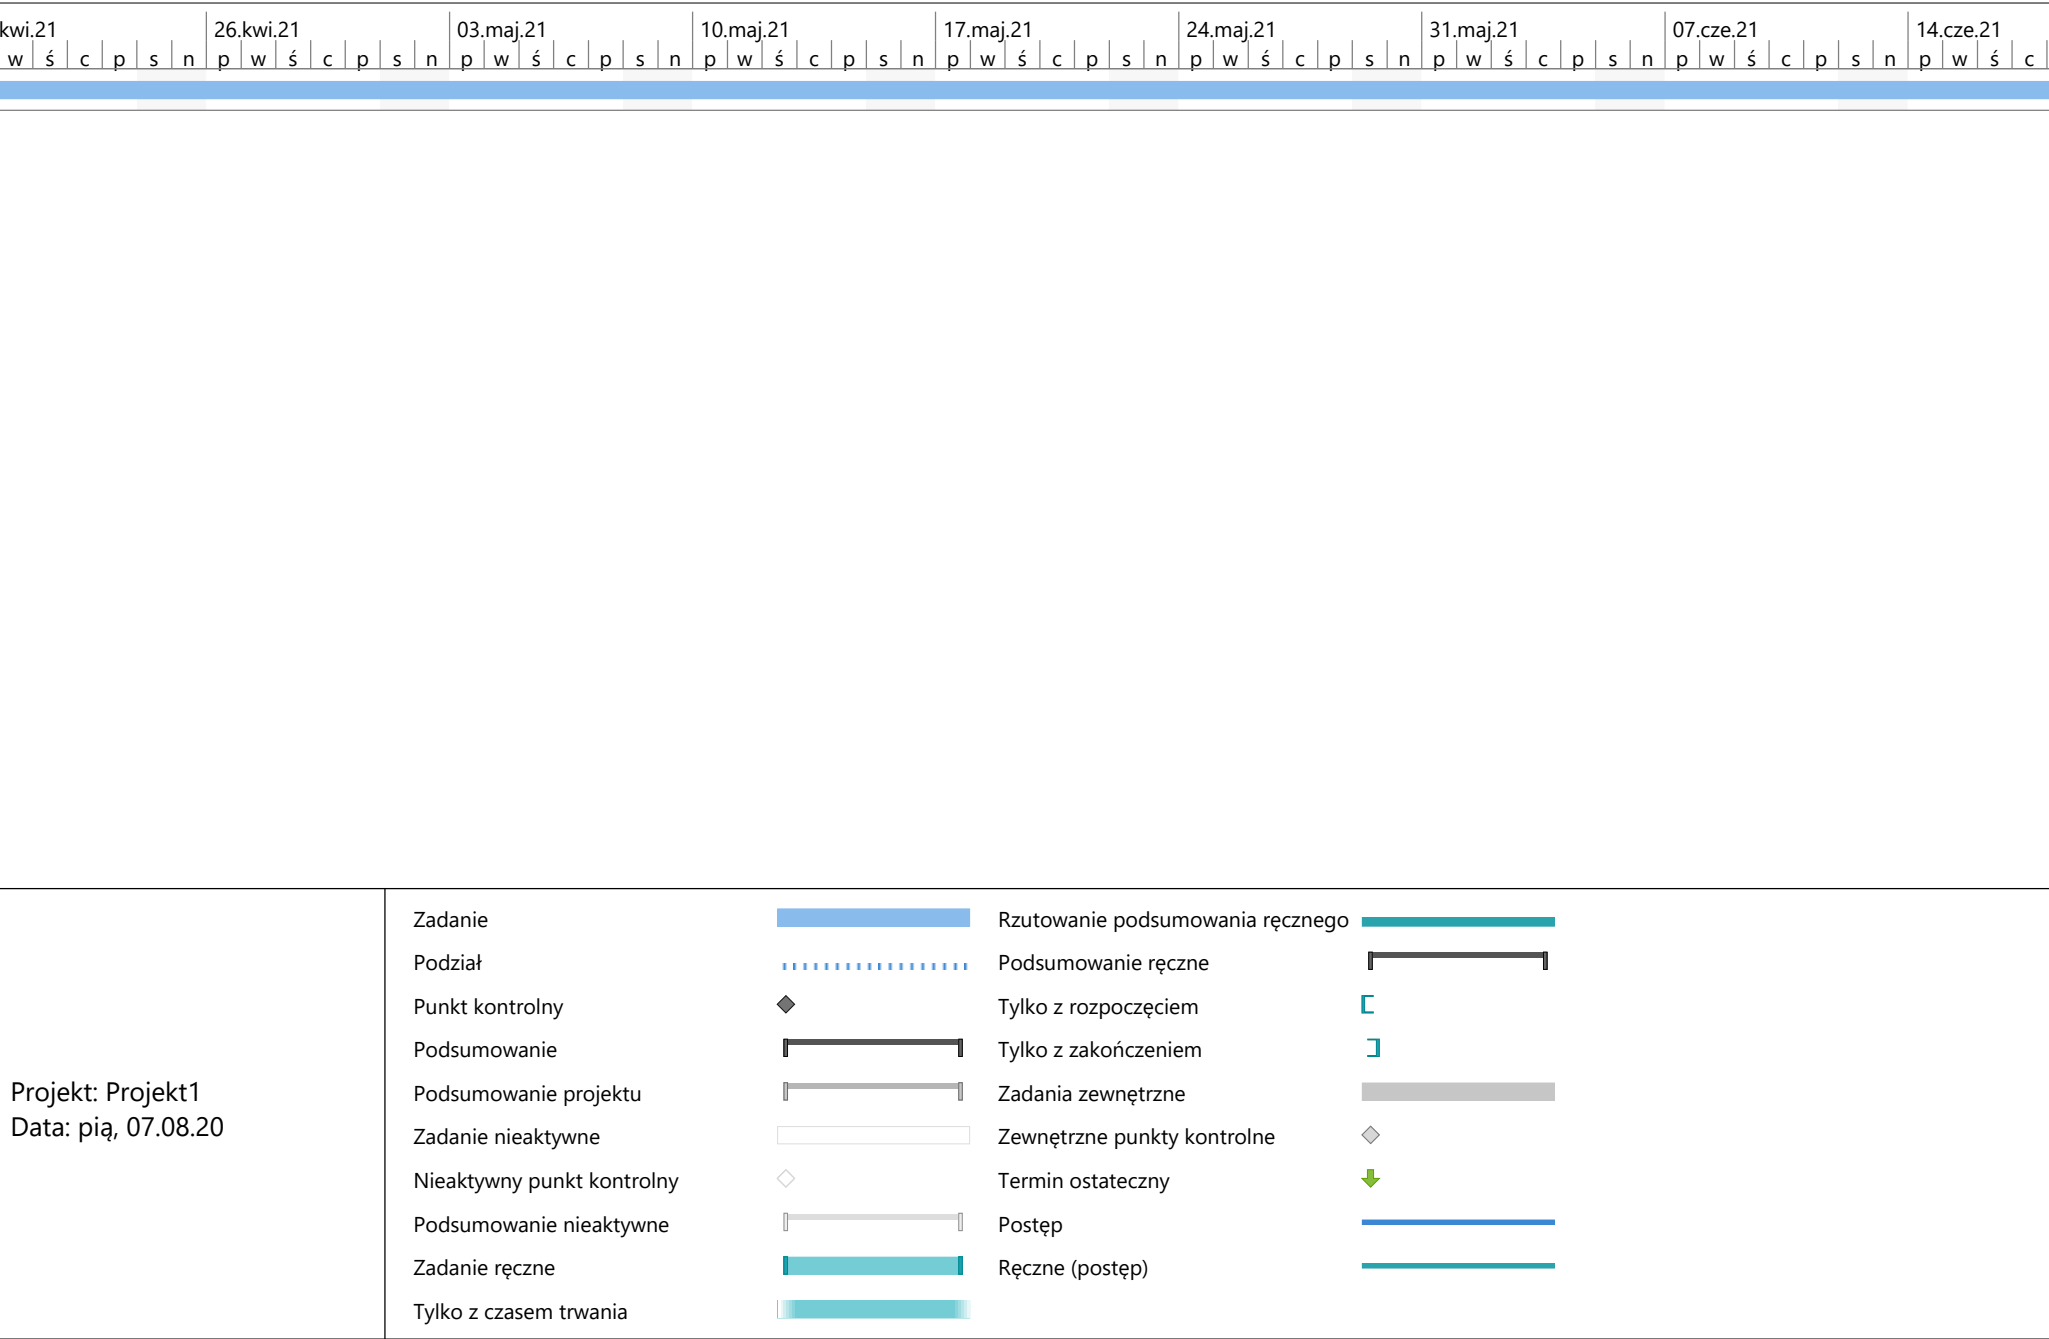

				21.cze.21				28.cze.21				05.lip.21				12.lip.21				19.lip.21				26.lip.21				02.sie.21				09.sie.21										
p	s	n		p	w	ś	c	p	s	n		p	w	ś	c	p	s	n		p	w	ś	c	p	s	n		p	w	ś	c	p	s	n		p	w	ś	c	p	s	n

Projekt: Projekt1


Data: pią, 07.08.20









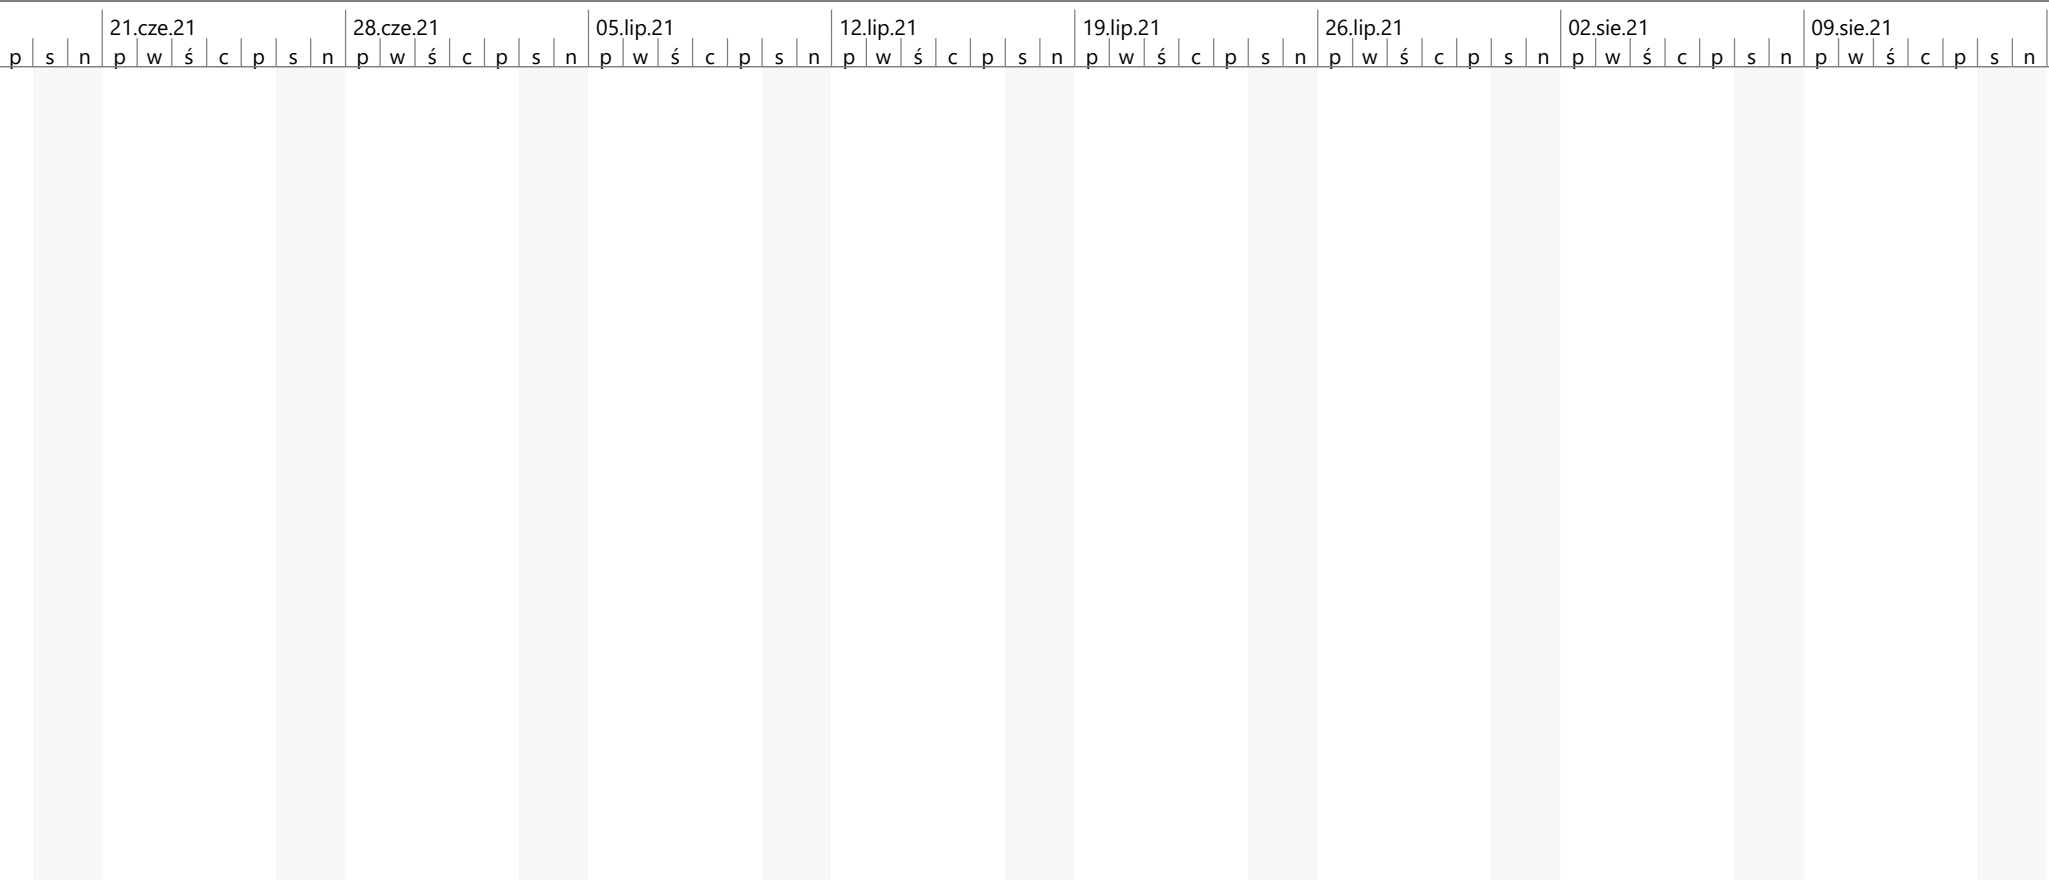










Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Strona 239


























Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			






















[illegible]

Legenda	
Zadanie	 Rzutowanie podsumowania ręcznego 
Podział	 Podsumowanie ręczne 
Punkt kontrolny	 Tylko z rozpoczęciem 
Podsumowanie	 Tylko z zakończeniem 
Podsumowanie projektu	 Zadania zewnętrzne 
Zadanie nieaktywne	 Zewnętrzne punkty kontrolne 
Nieaktywny punkt kontrolny	 Termin ostateczny 
Podsumowanie nieaktywne	 Postęp 
Zadanie ręczne	 Ręczne (postęp) 
Tylko z czasem trwania	

[illegible]

[illegible]

Legenda	
Zadanie	 Rzutowanie podsumowania ręcznego 
Podział	 Podsumowanie ręczne 
Punkt kontrolny	 Tylko z rozpoczęciem 
Podsumowanie	 Tylko z zakończeniem 
Podsumowanie projektu	 Zadania zewnętrzne 
Zadanie nieaktywne	 Zewnętrzne punkty kontrolne 
Nieaktywny punkt kontrolny	 Termin ostateczny 
Podsumowanie nieaktywne	 Postęp 
Zadanie ręczne	 Ręczne (postęp) 
Tylko z czasem trwania	























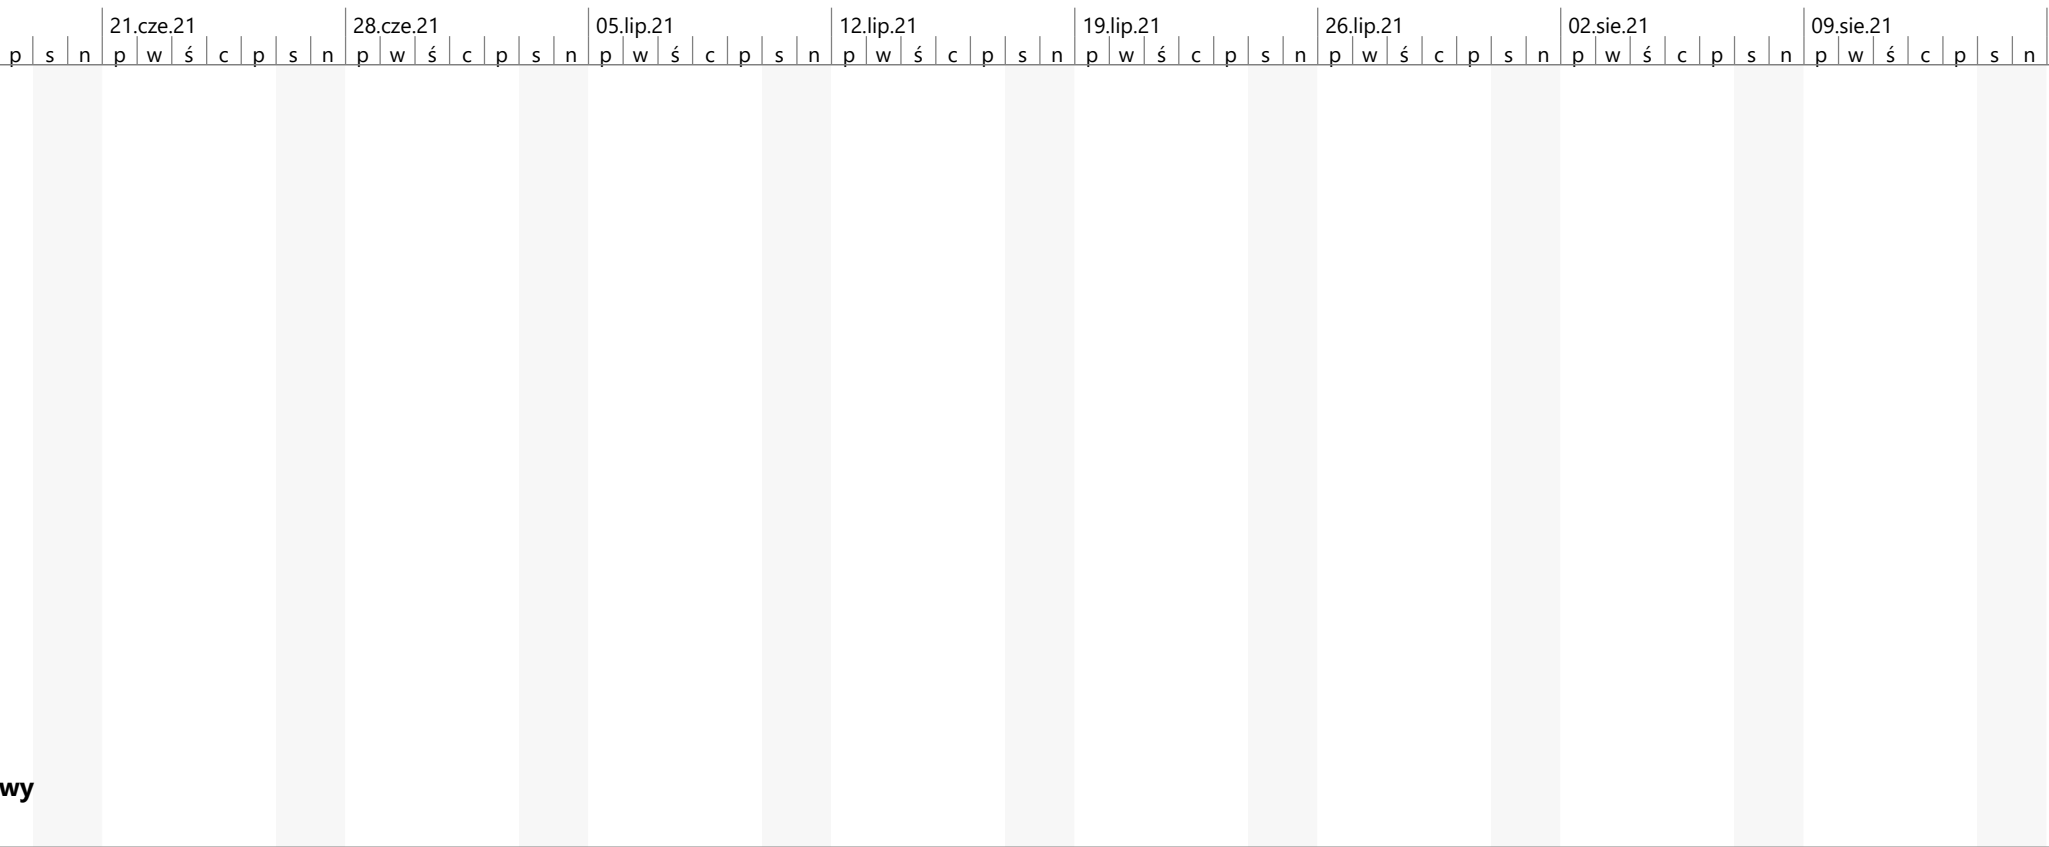

<div>Projekt: Projekt1</div> <div>Data: pią, 07.08.20</div>	Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>
	Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>
	Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>
	Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>
	Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>
	Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>
	Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>
	Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>
	Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>
	Tylko z czasem trwania	<div></div>		





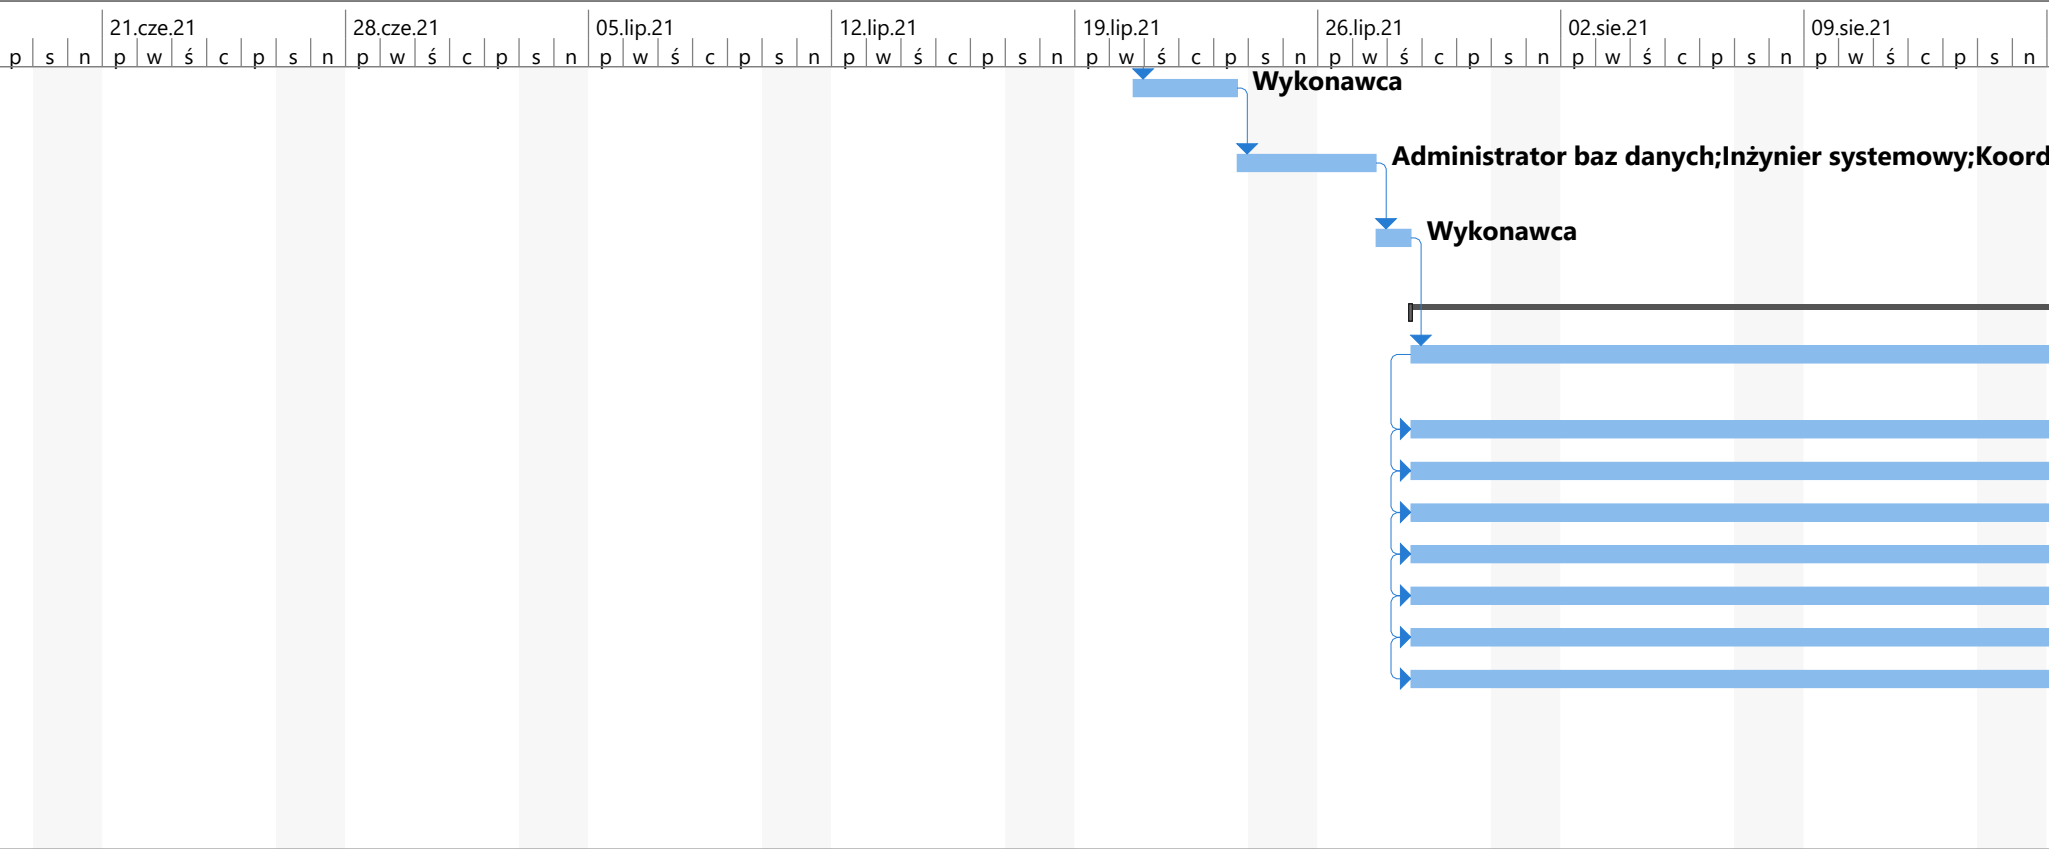




















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			








p	s	n	21.cze.21				28.cze.21				05.lip.21				12.lip.21				19.lip.21				26.lip.21				02.sie.21				09.sie.21			
p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n

Projekt: Projekt1		Data: pią, 07.08.20	
Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

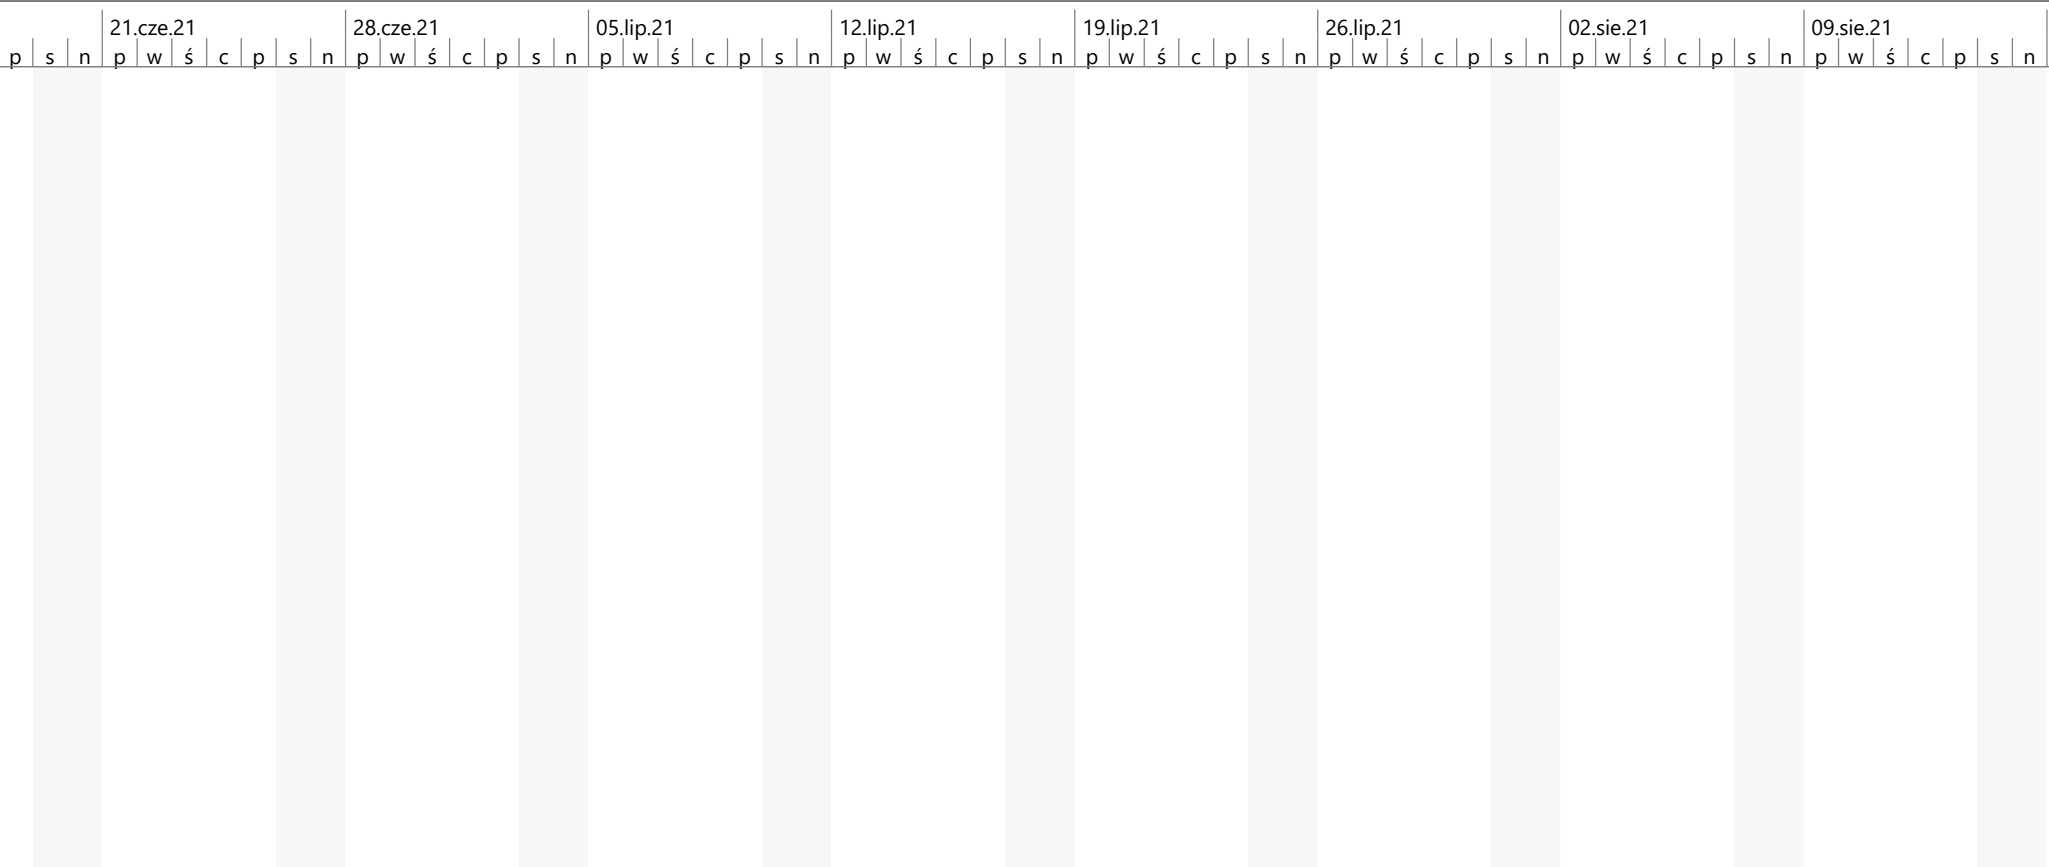




















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			








[illegible]

Legenda	
Zadanie	 Rzutowanie podsumowania ręcznego 
Podział	 Podsumowanie ręczne 
Punkt kontrolny	 Tylko z rozpoczęciem 
Podsumowanie	 Tylko z zakończeniem 
Podsumowanie projektu	 Zadania zewnętrzne 
Zadanie nieaktywne	 Zewnętrzne punkty kontrolne 
Nieaktywny punkt kontrolny	 Termin ostateczny 
Podsumowanie nieaktywne	 Postęp 
Zadanie ręczne	 Ręczne (postęp) 
Tylko z czasem trwania	
























Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

[illegible]

Legenda	
Zadanie	 Rzutowanie podsumowania ręcznego 
Podział	 Podsumowanie ręczne 
Punkt kontrolny	 Tylko z rozpoczęciem 
Podsumowanie	 Tylko z zakończeniem 
Podsumowanie projektu	 Zadania zewnętrzne 
Zadanie nieaktywne	 Zewnętrzne punkty kontrolne 
Nieaktywny punkt kontrolny	 Termin ostateczny 
Podsumowanie nieaktywne	 Postęp 
Zadanie ręczne	 Ręczne (postęp) 
Tylko z czasem trwania	








Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

[illegible]



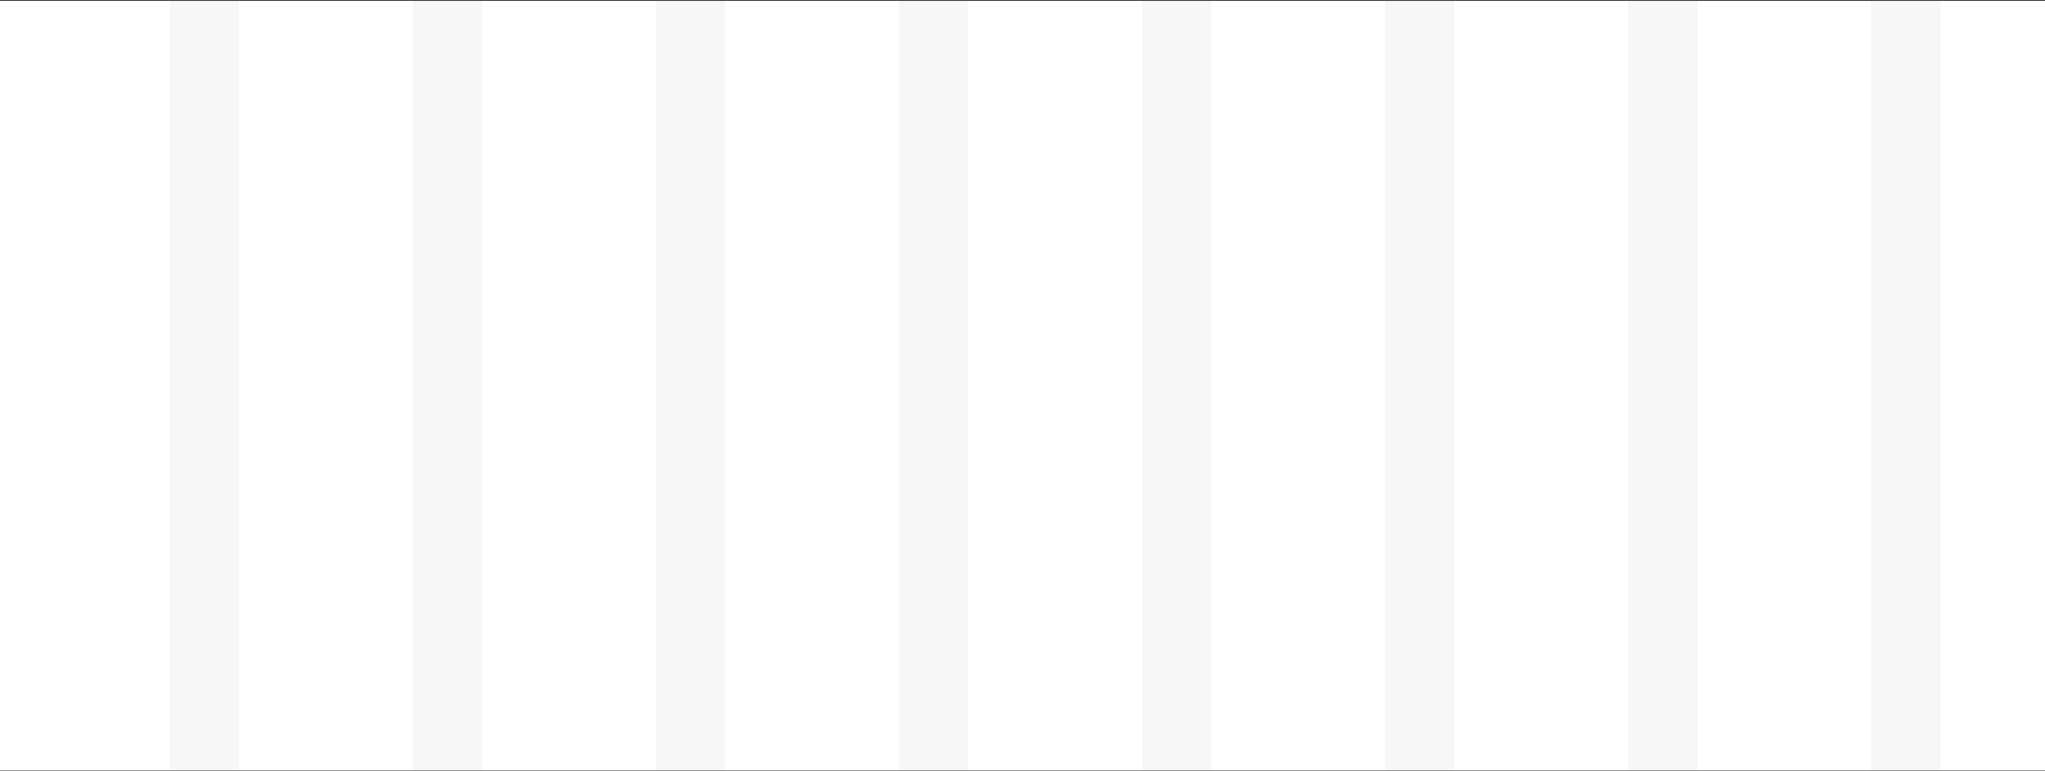


Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

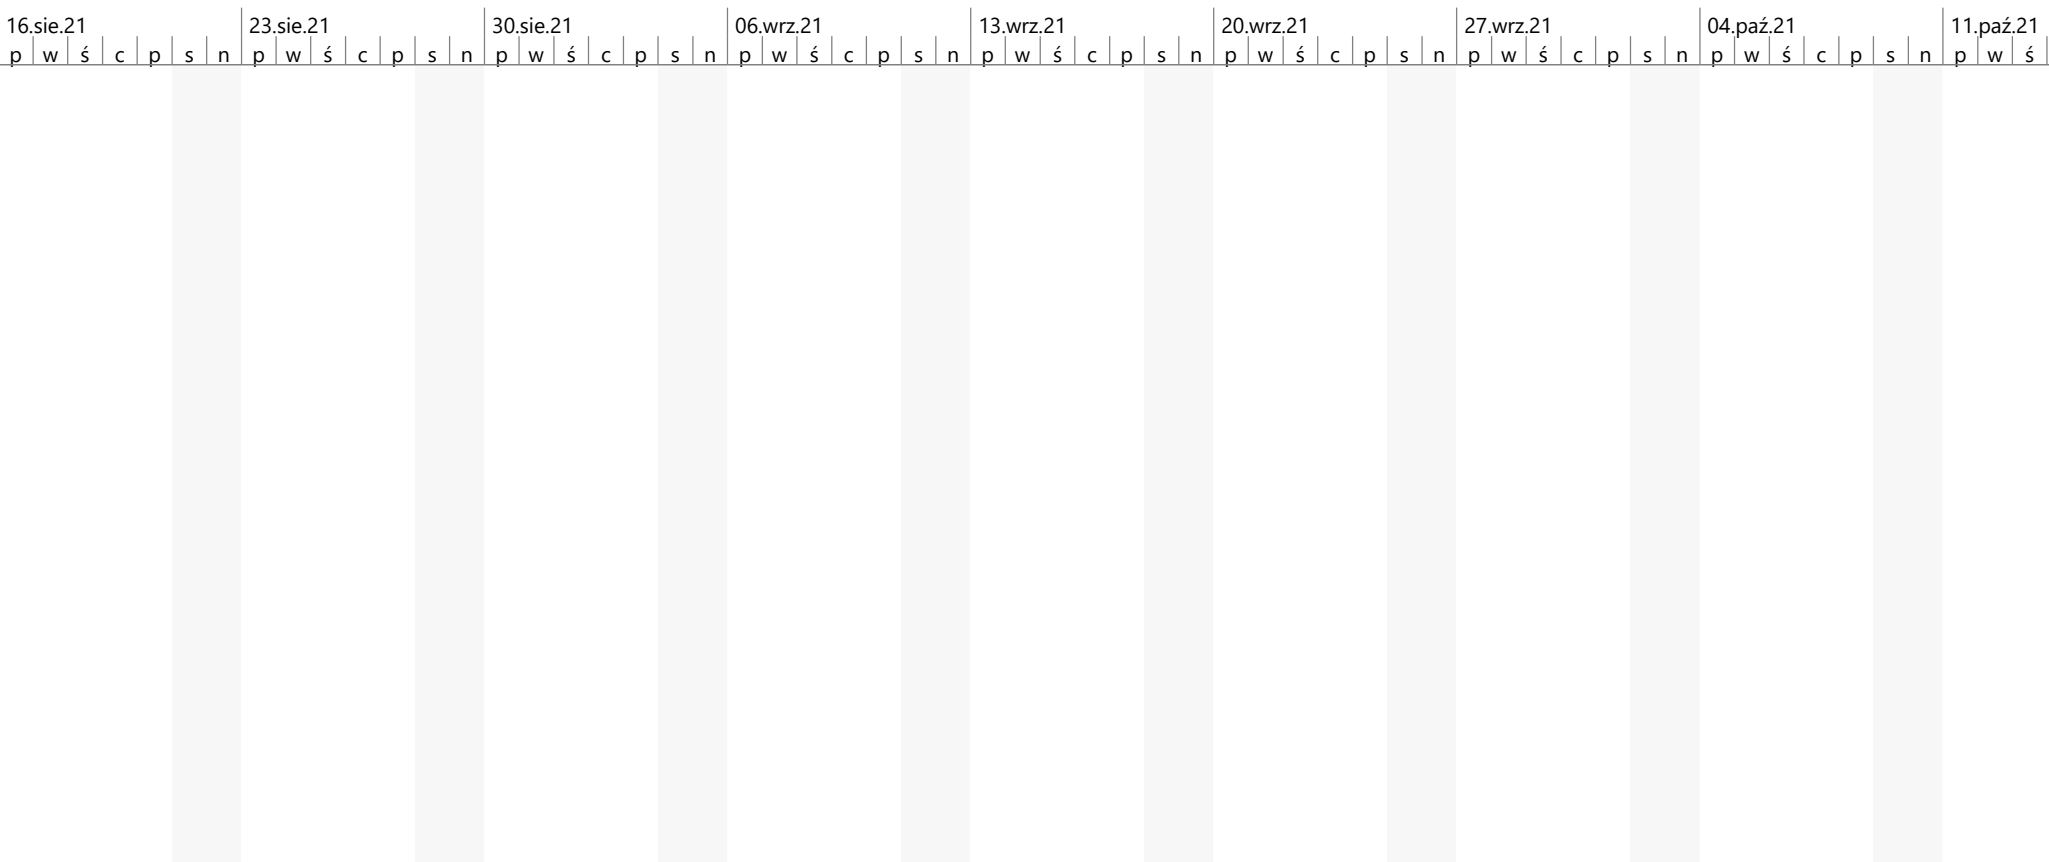

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

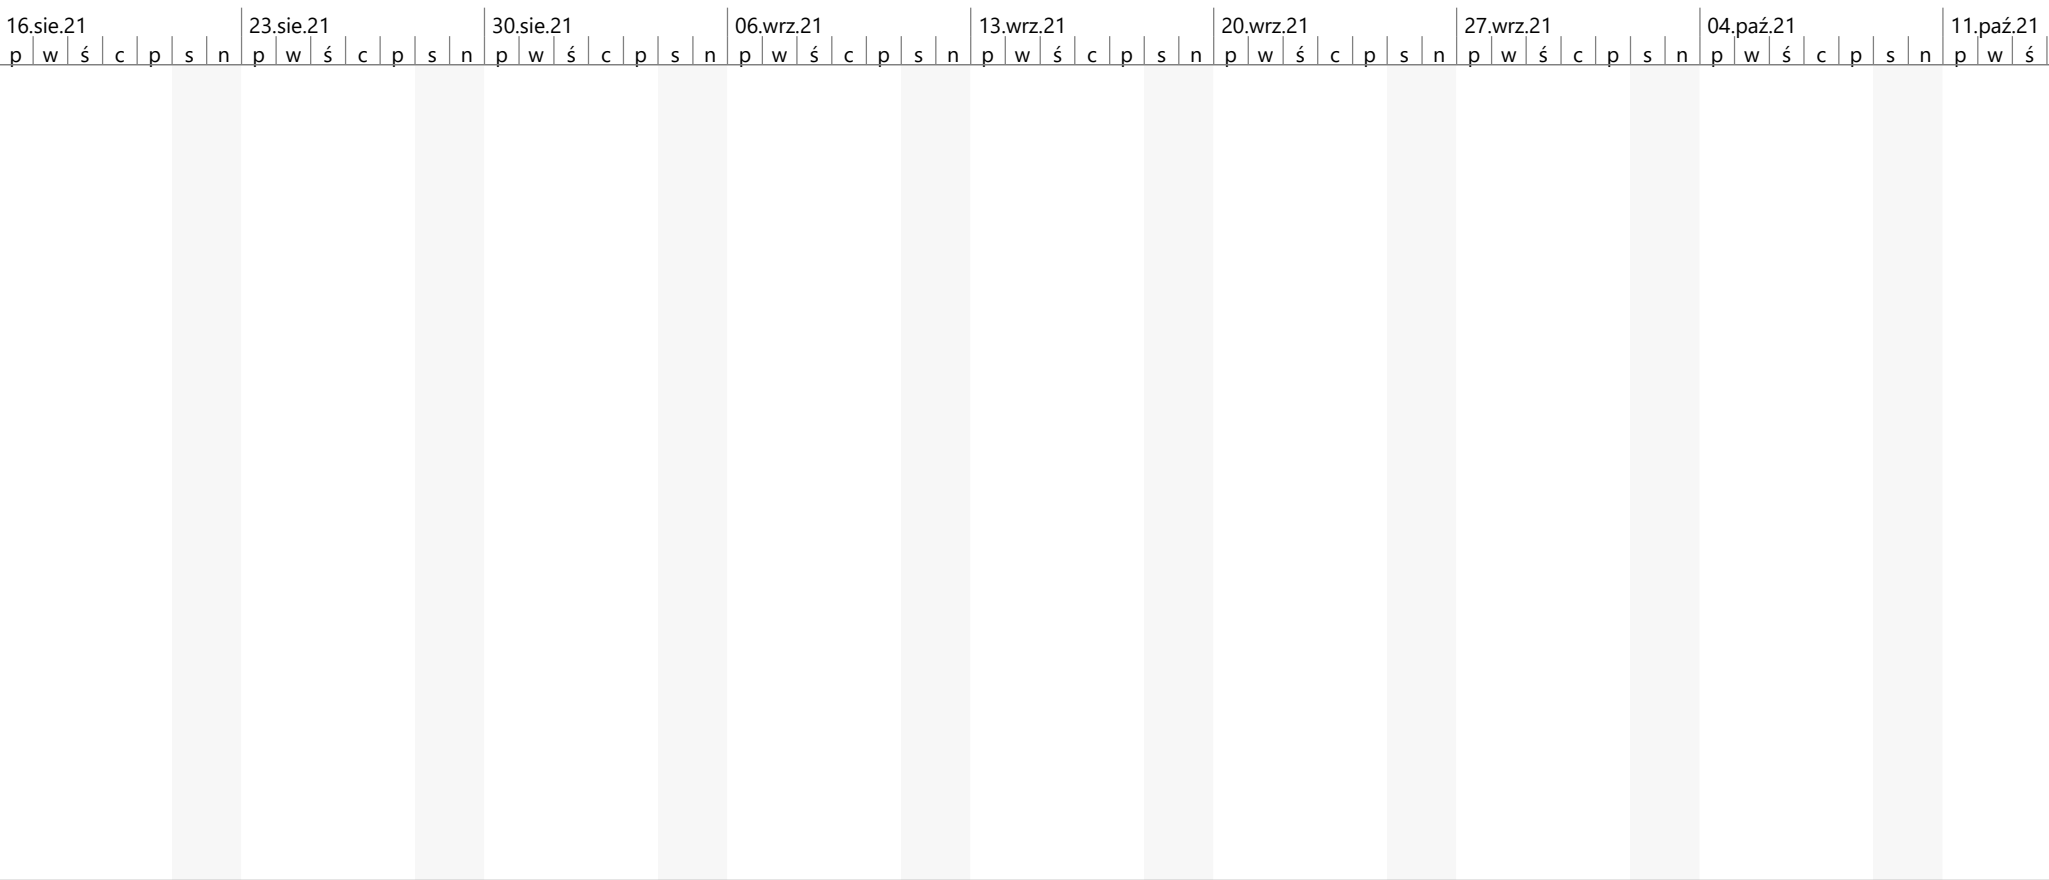

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



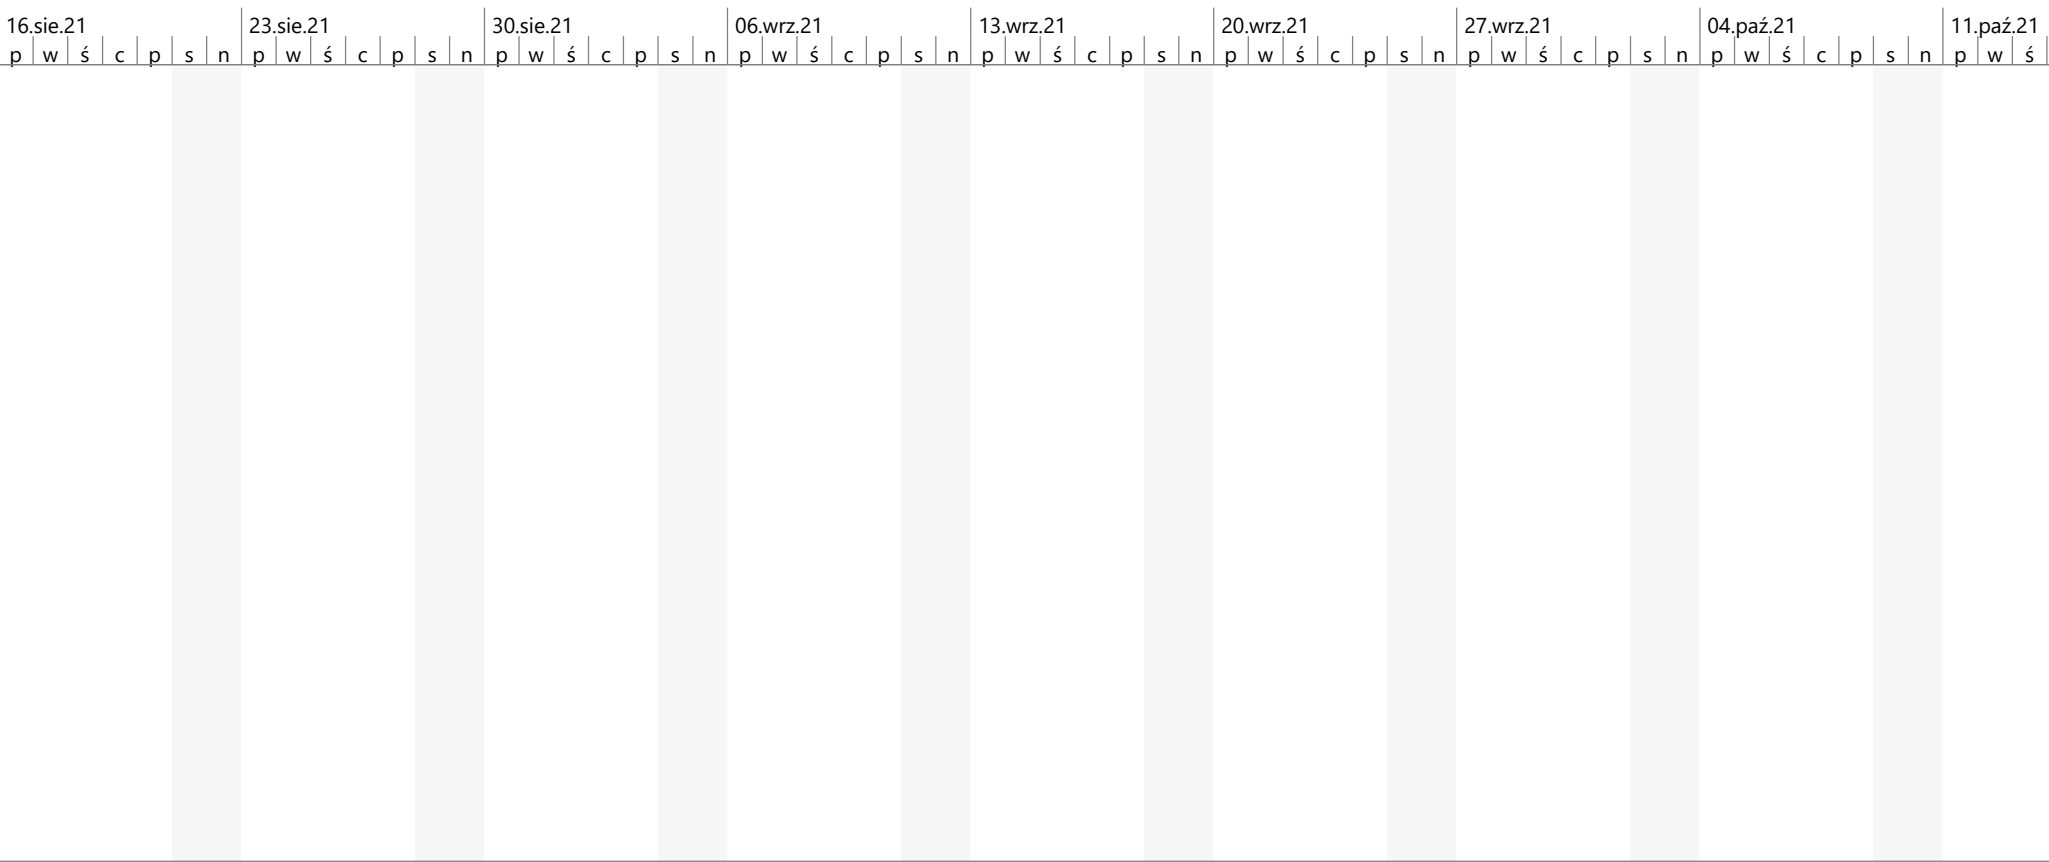

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

◆

◇

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny


Postęp

Ręczne (postęp)

Strona 277

[illegible]




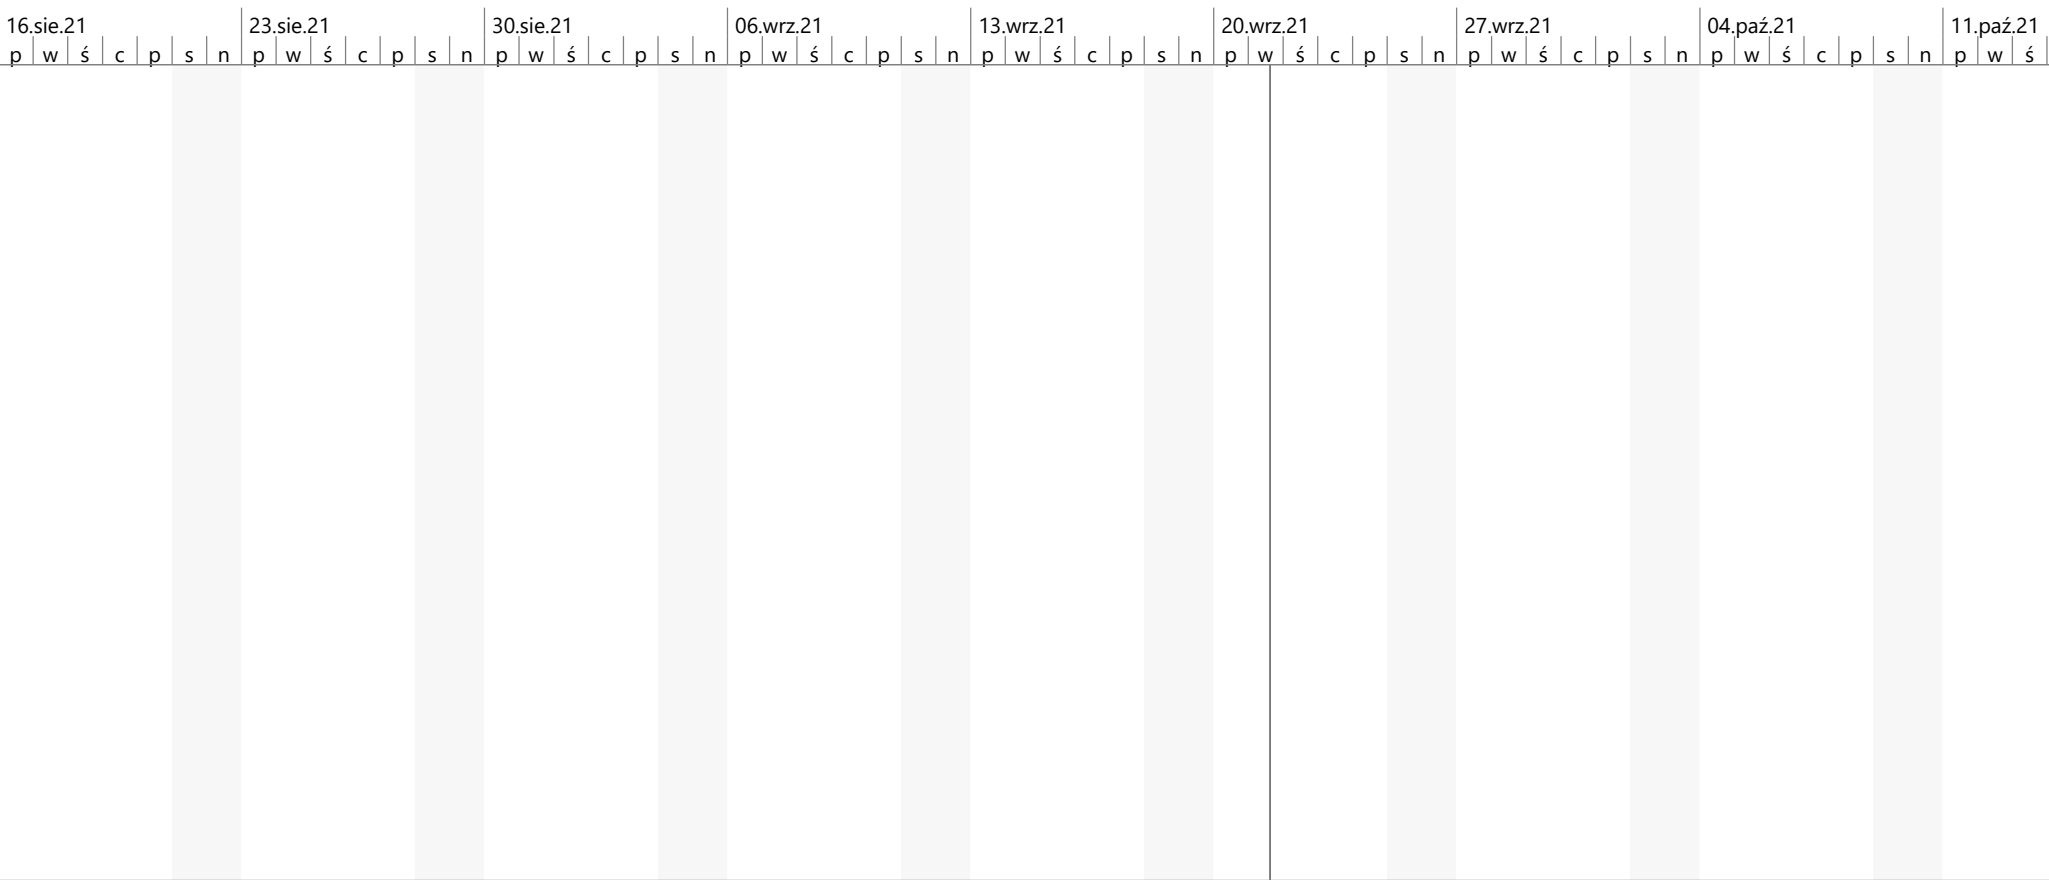







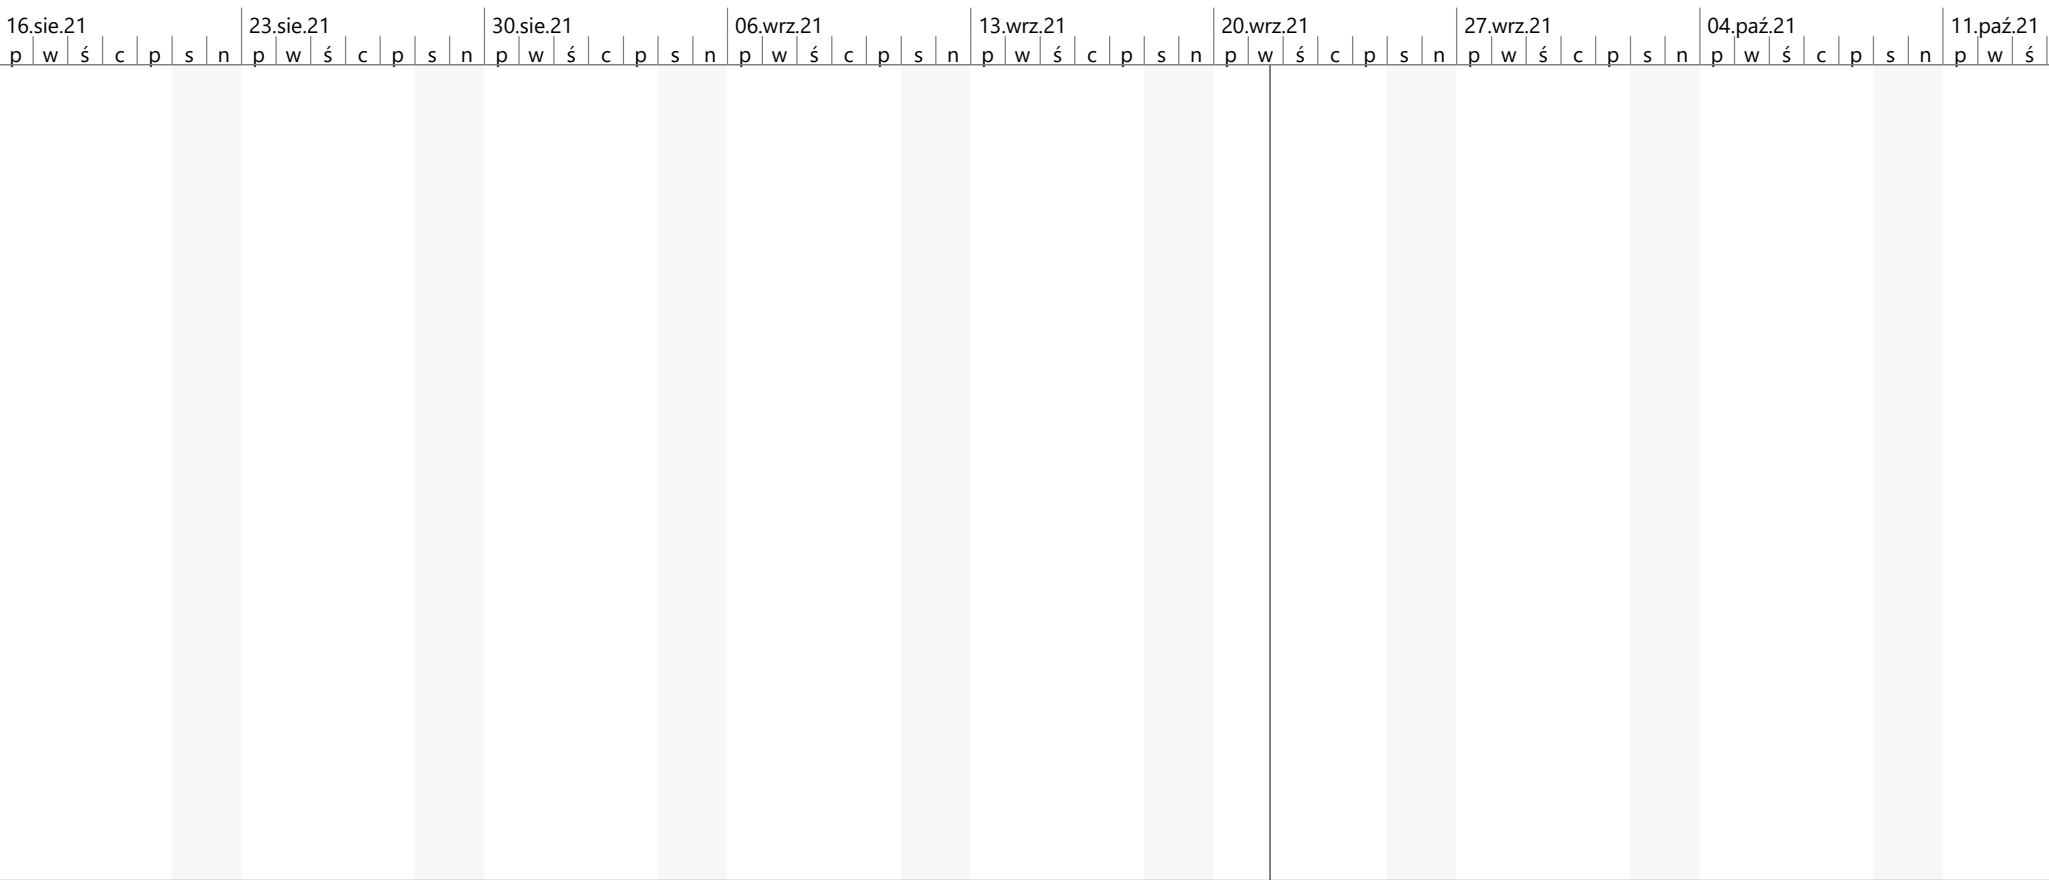












Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			





Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

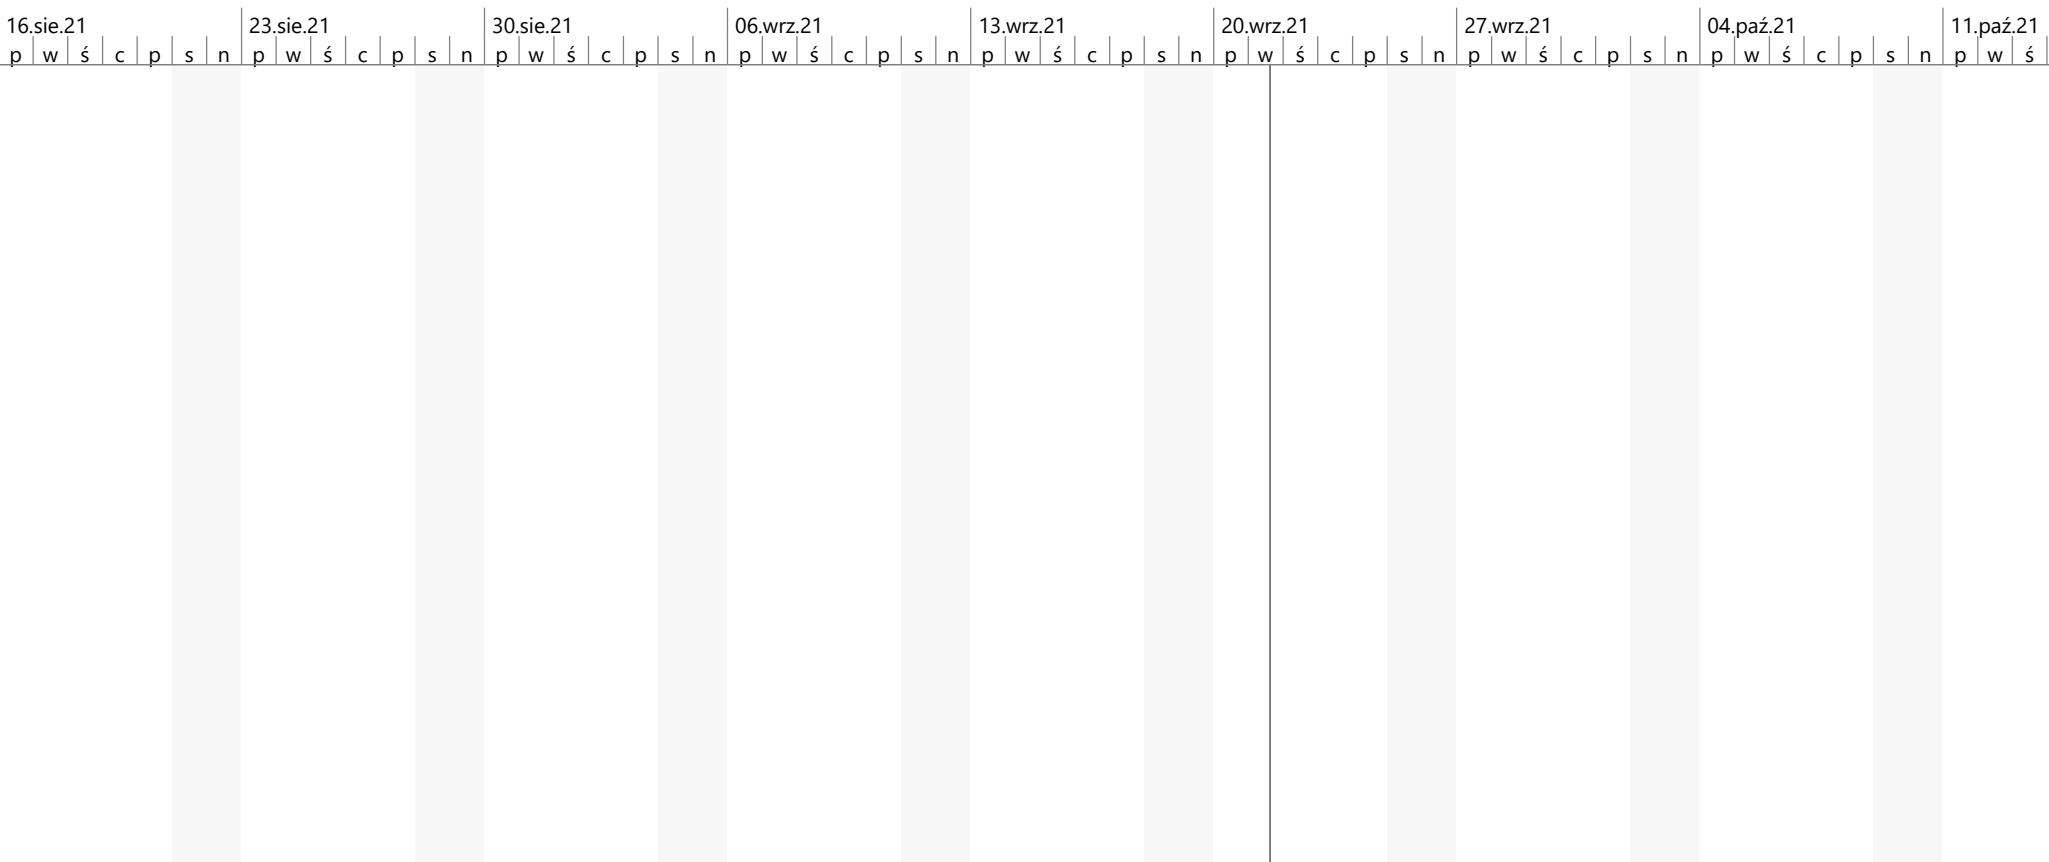

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




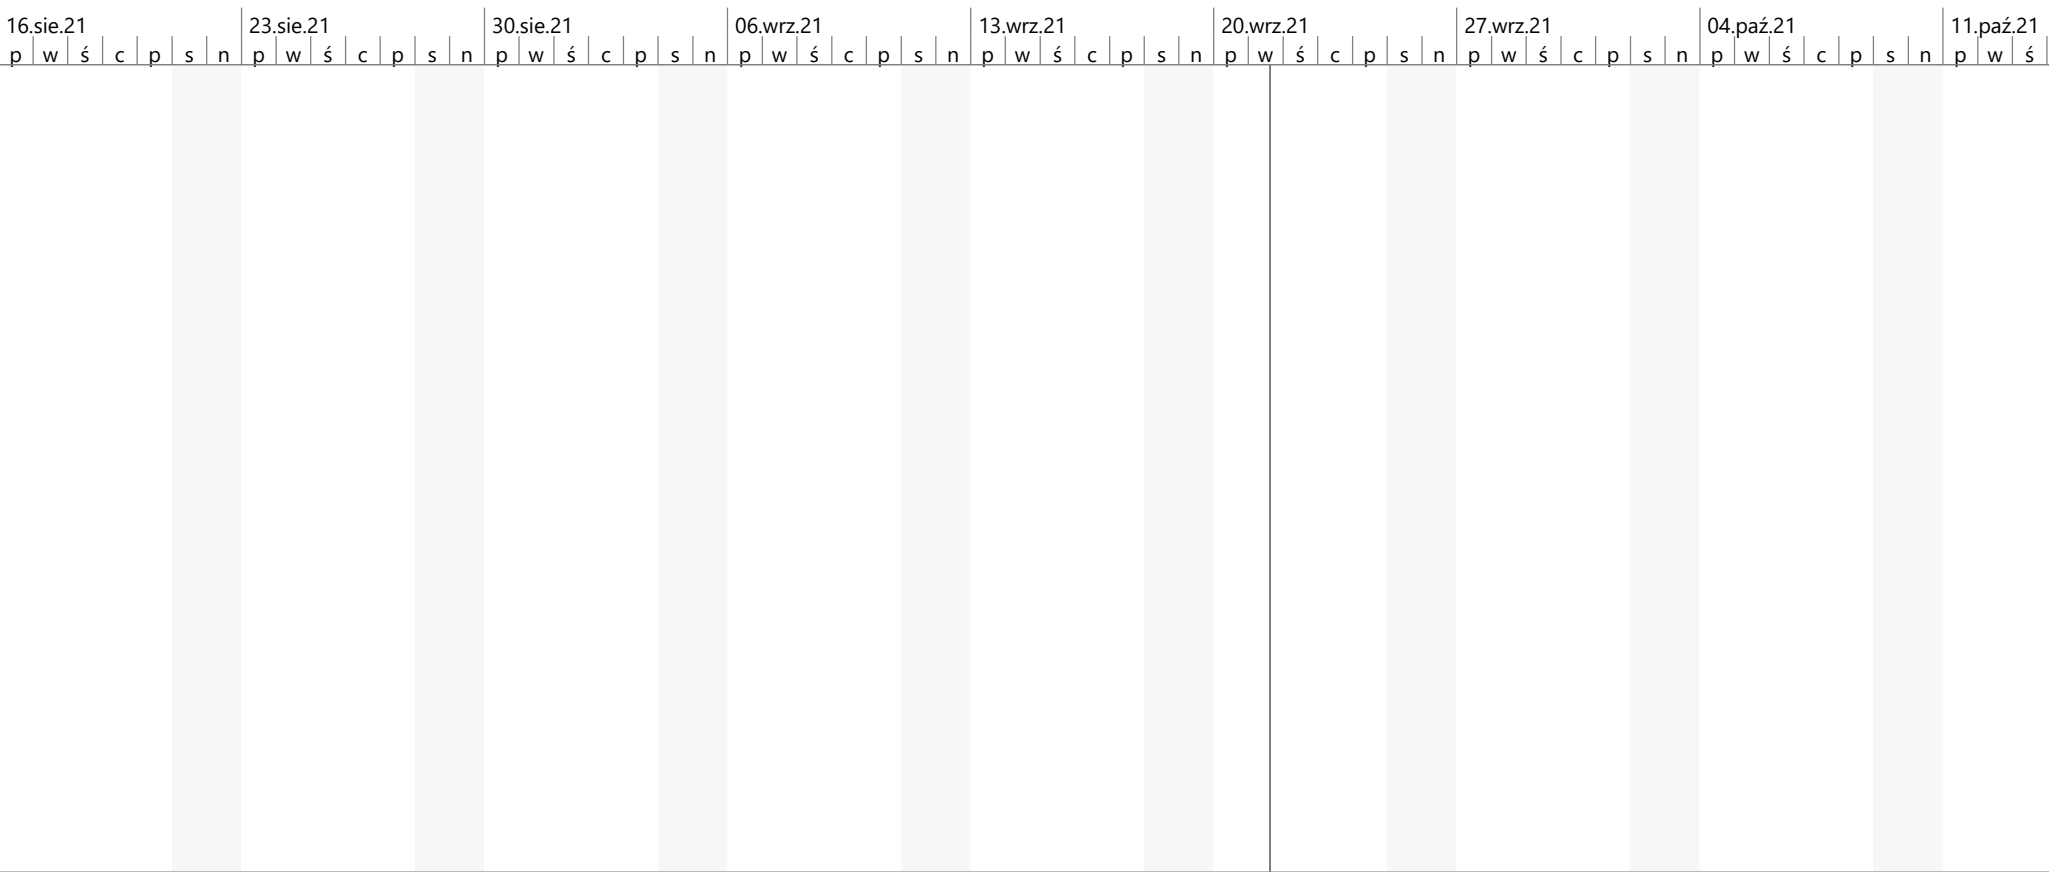

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

◆

◇

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne


Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)

Strona 285



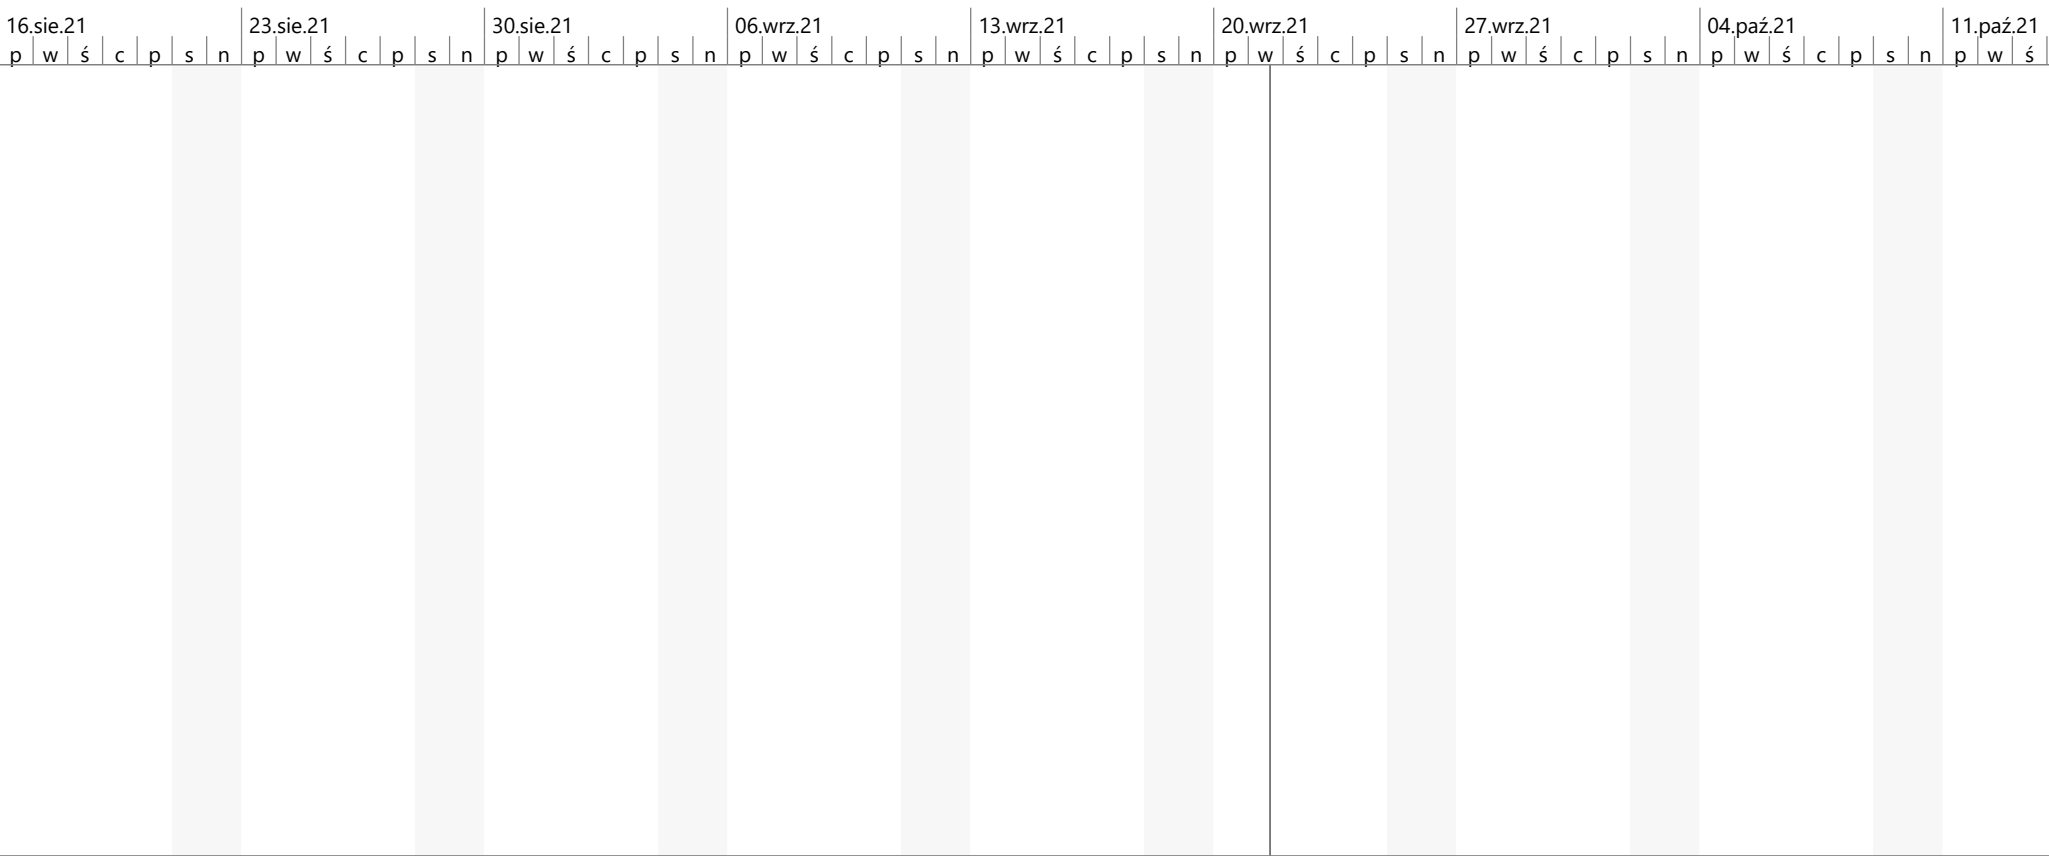

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

◆

◇

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne




















Termin ostateczny

Postęp


Ręczne (postęp)


Strona 287


[illegible]


Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			






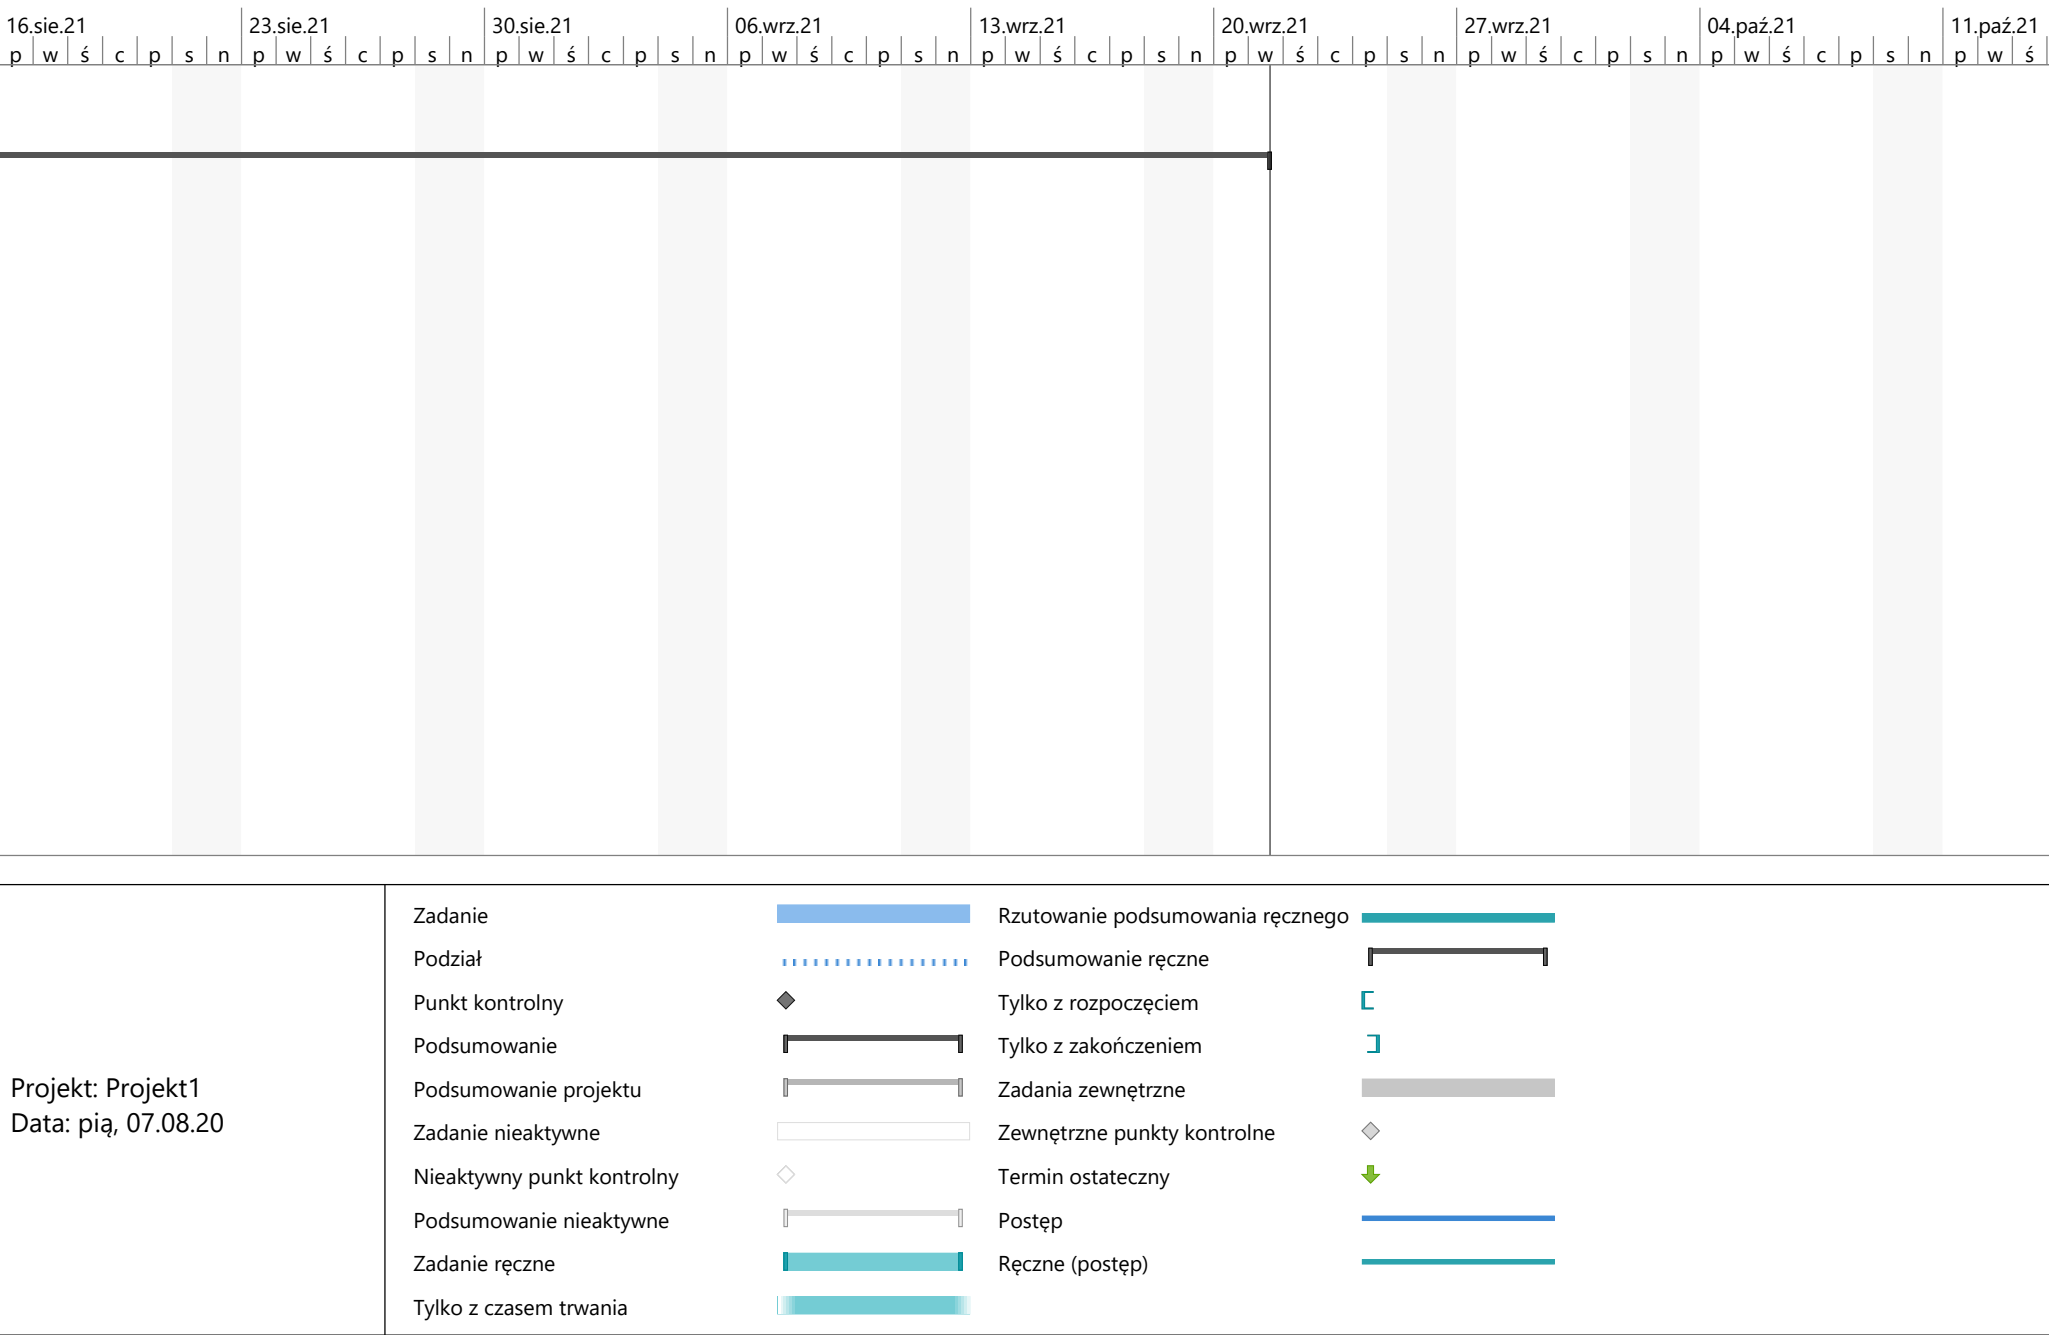

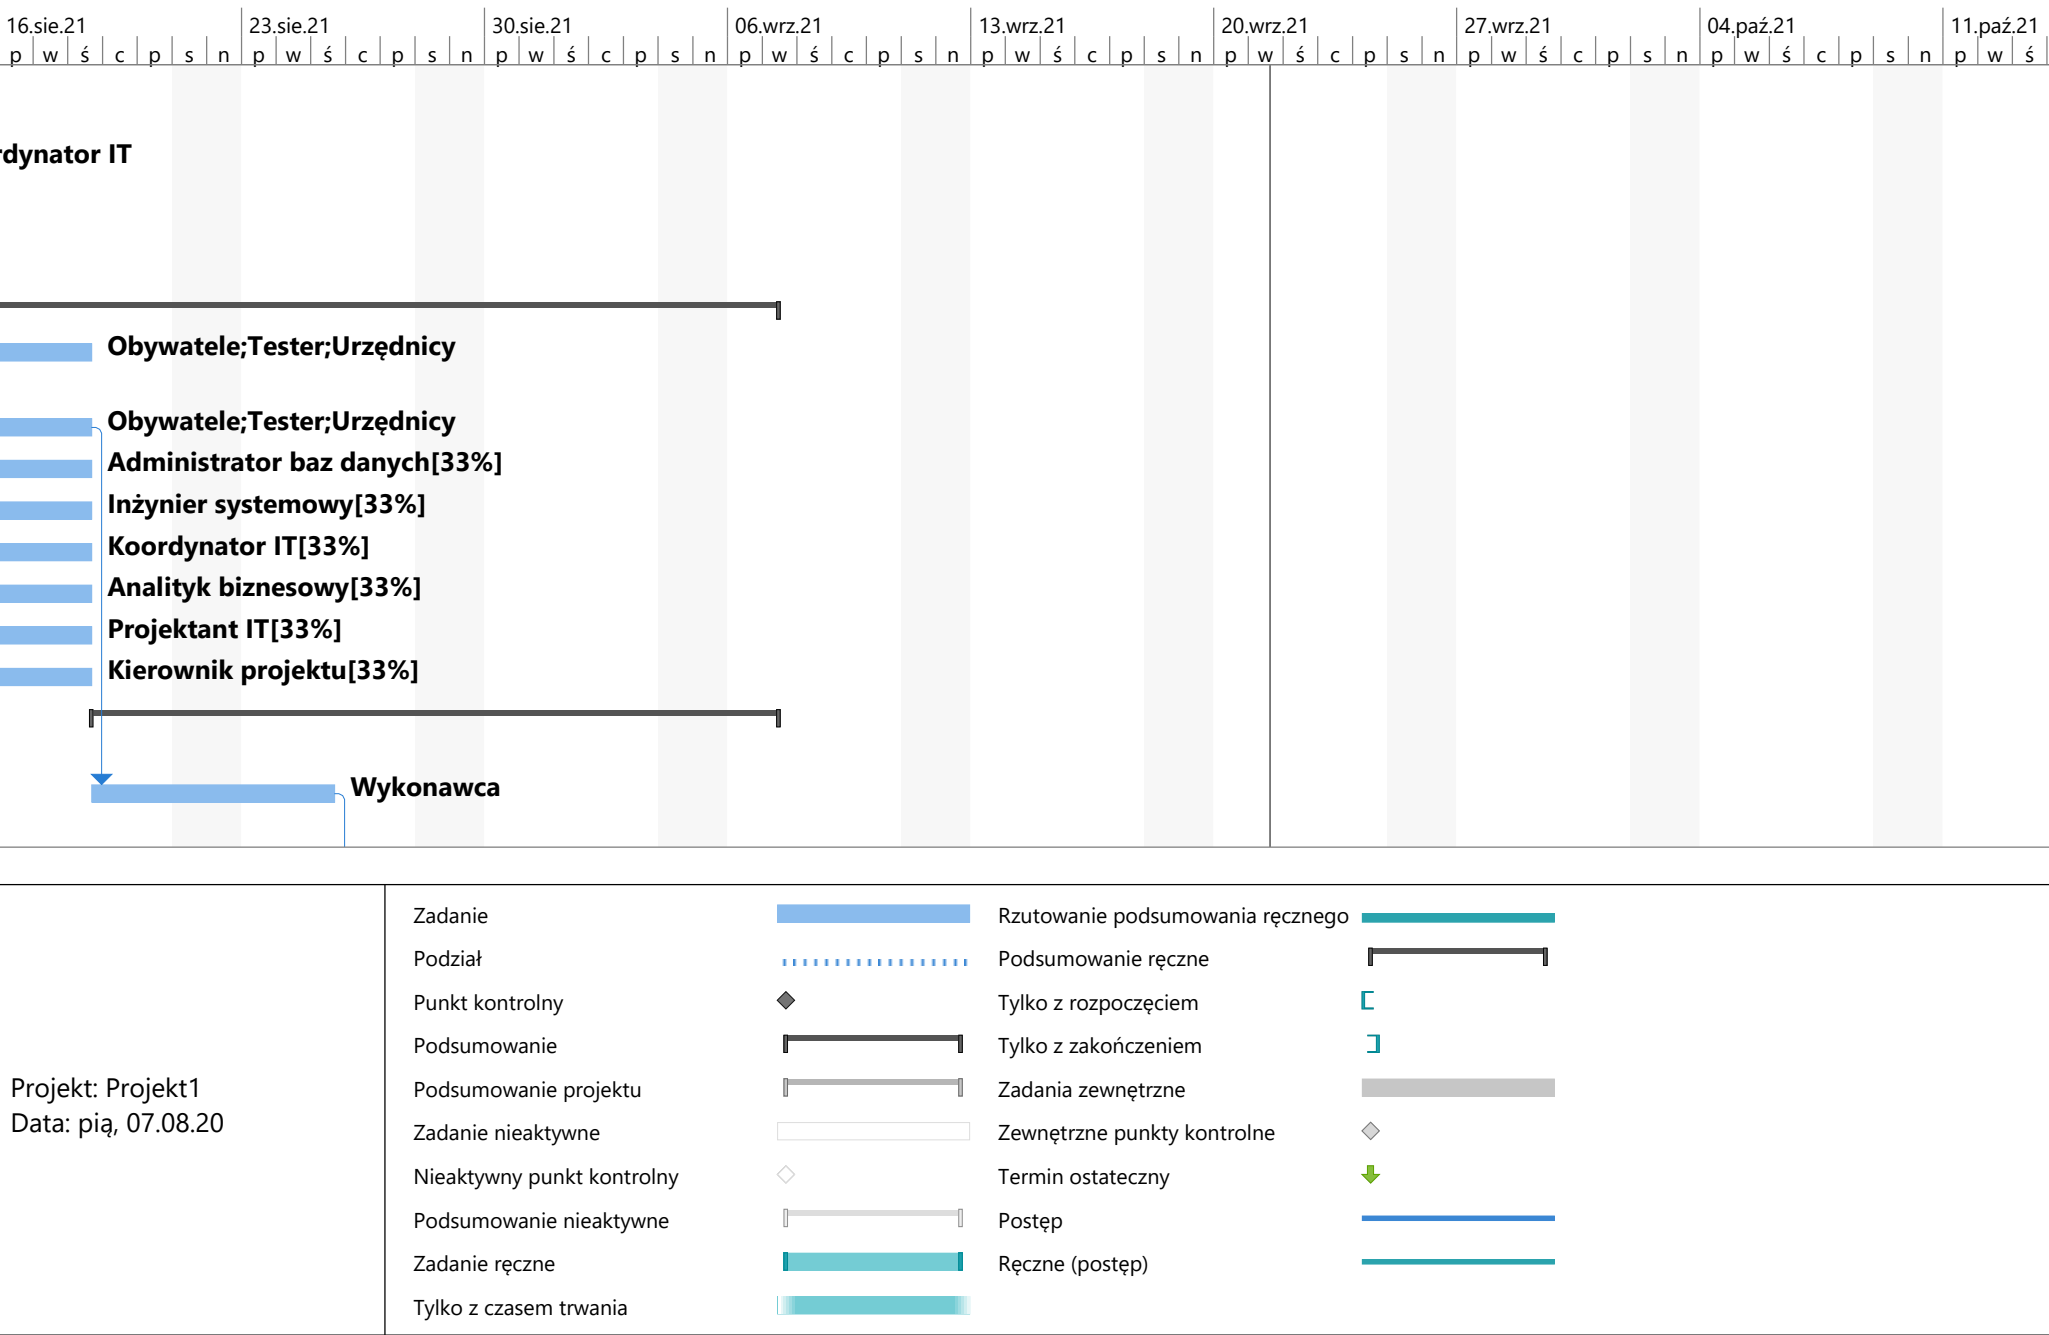


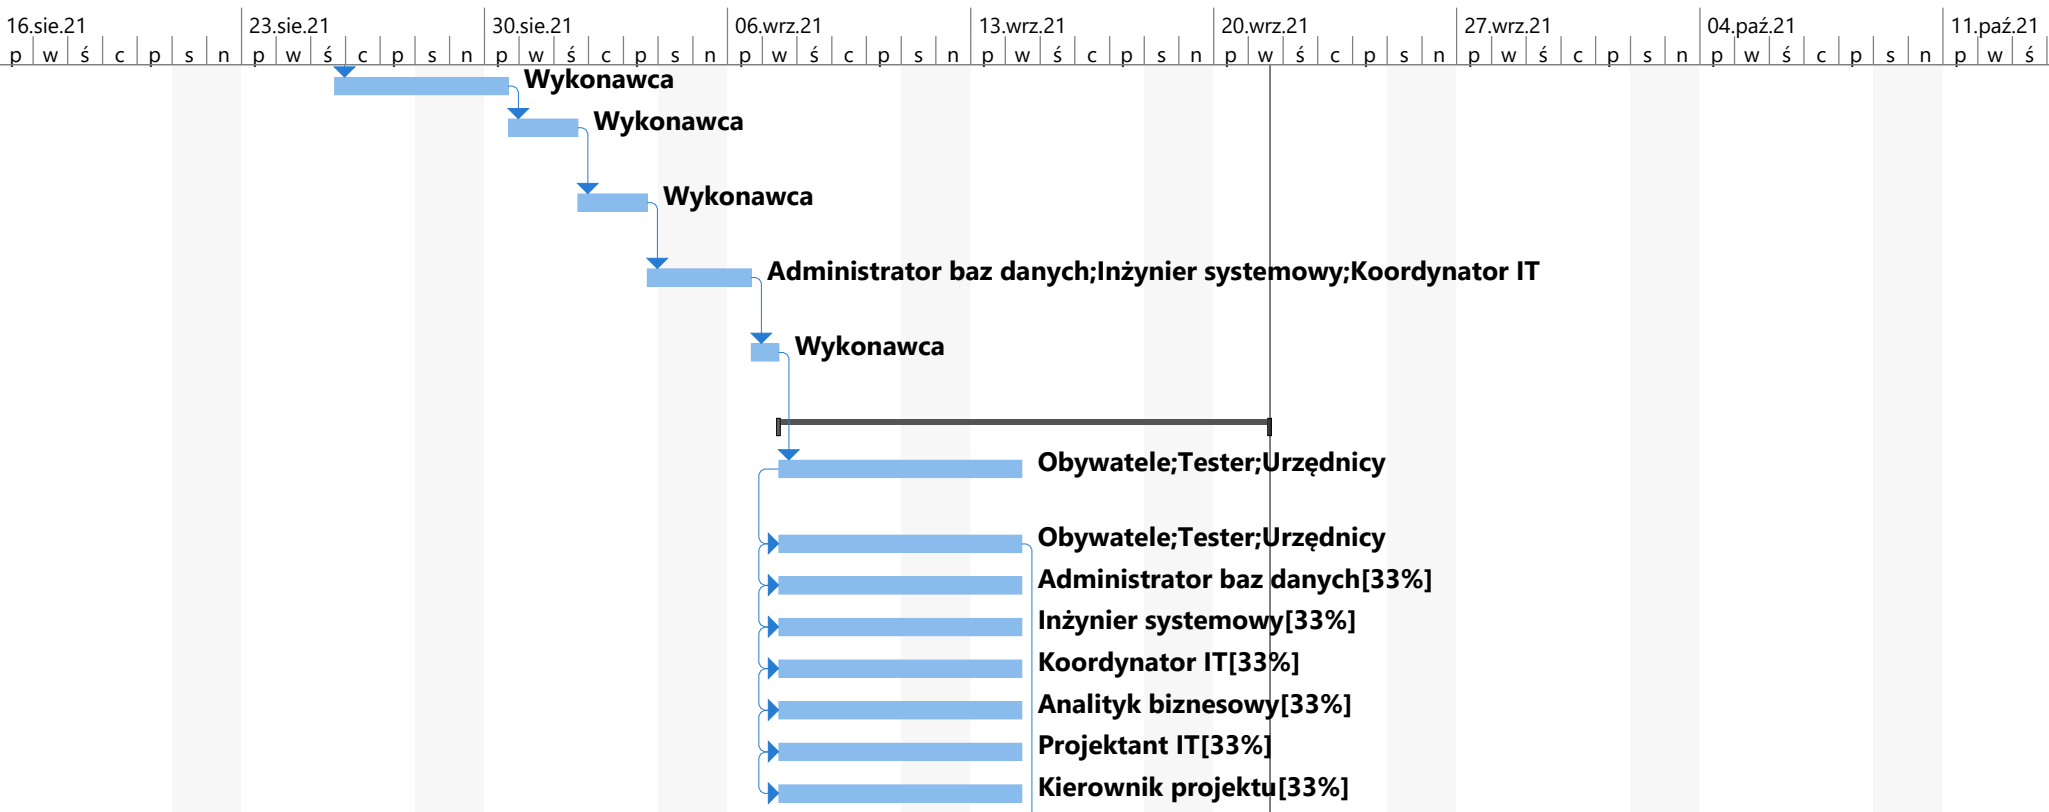

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

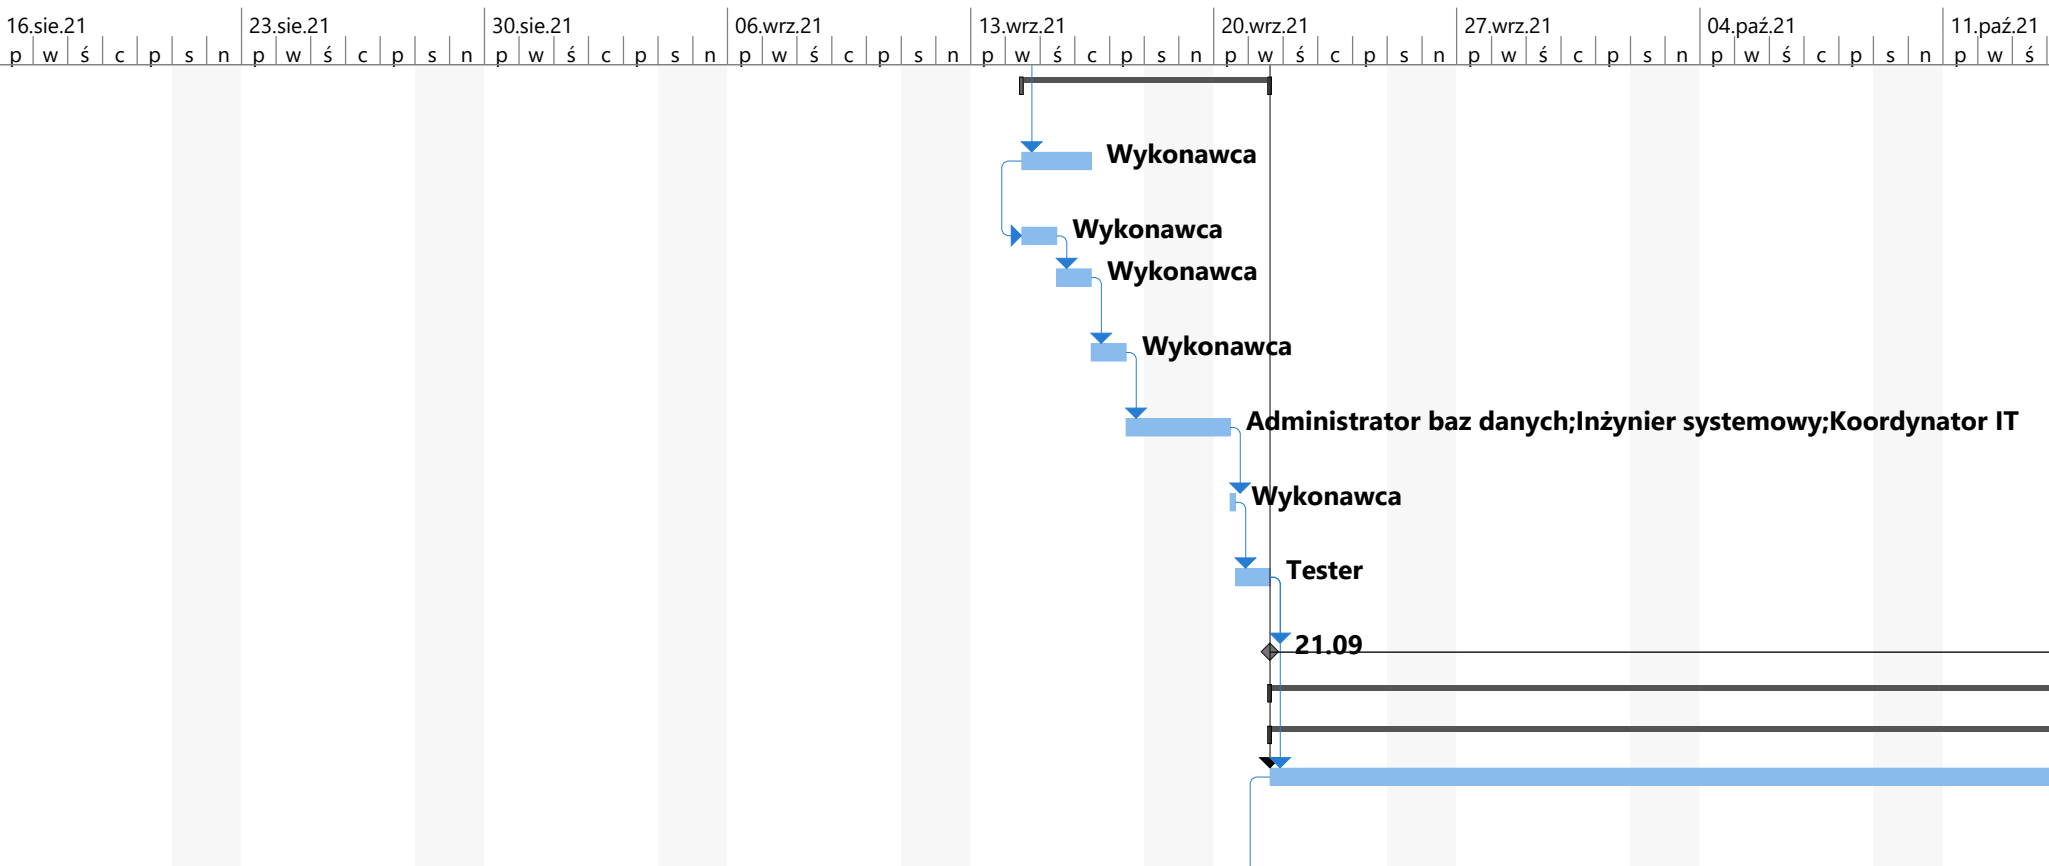

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

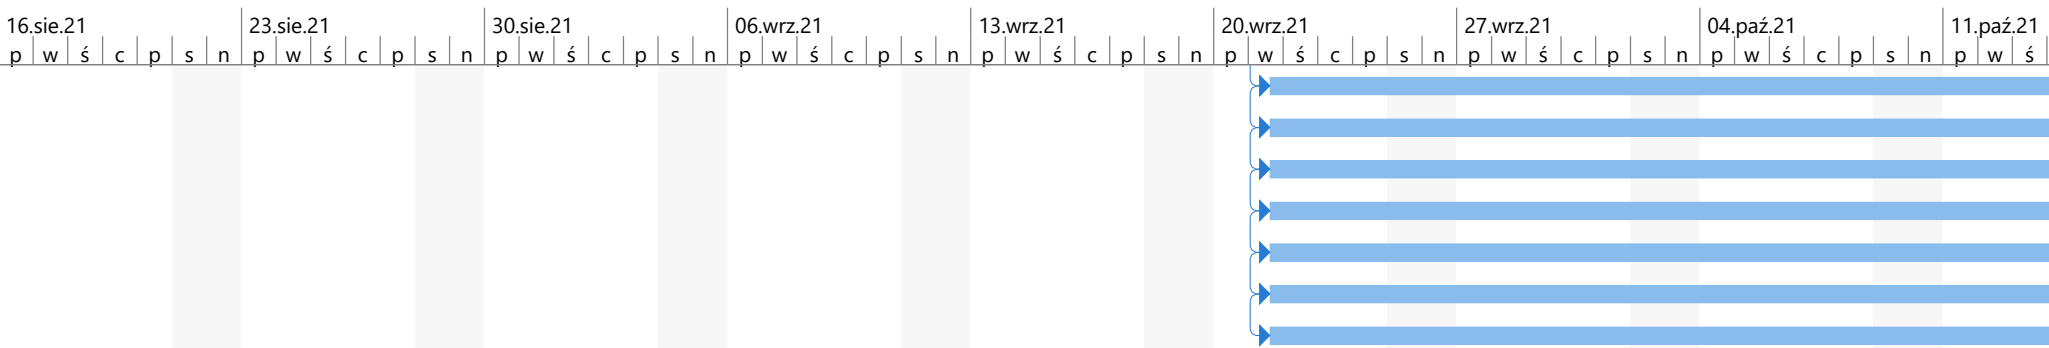

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

16.sie.21

p w ś c p s n

23.sie.21

p w ś c p s n

30.sie.21

p w ś c p s n

06.wrz.21

p w ś c p s n

13.wrz.21

p w ś c p s n

20.wrz.21

p w ś c p s n

27.wrz.21

p w ś c p s n

04.paź.21

p w ś c p s n

11.paź.21

p w ś

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne


Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny







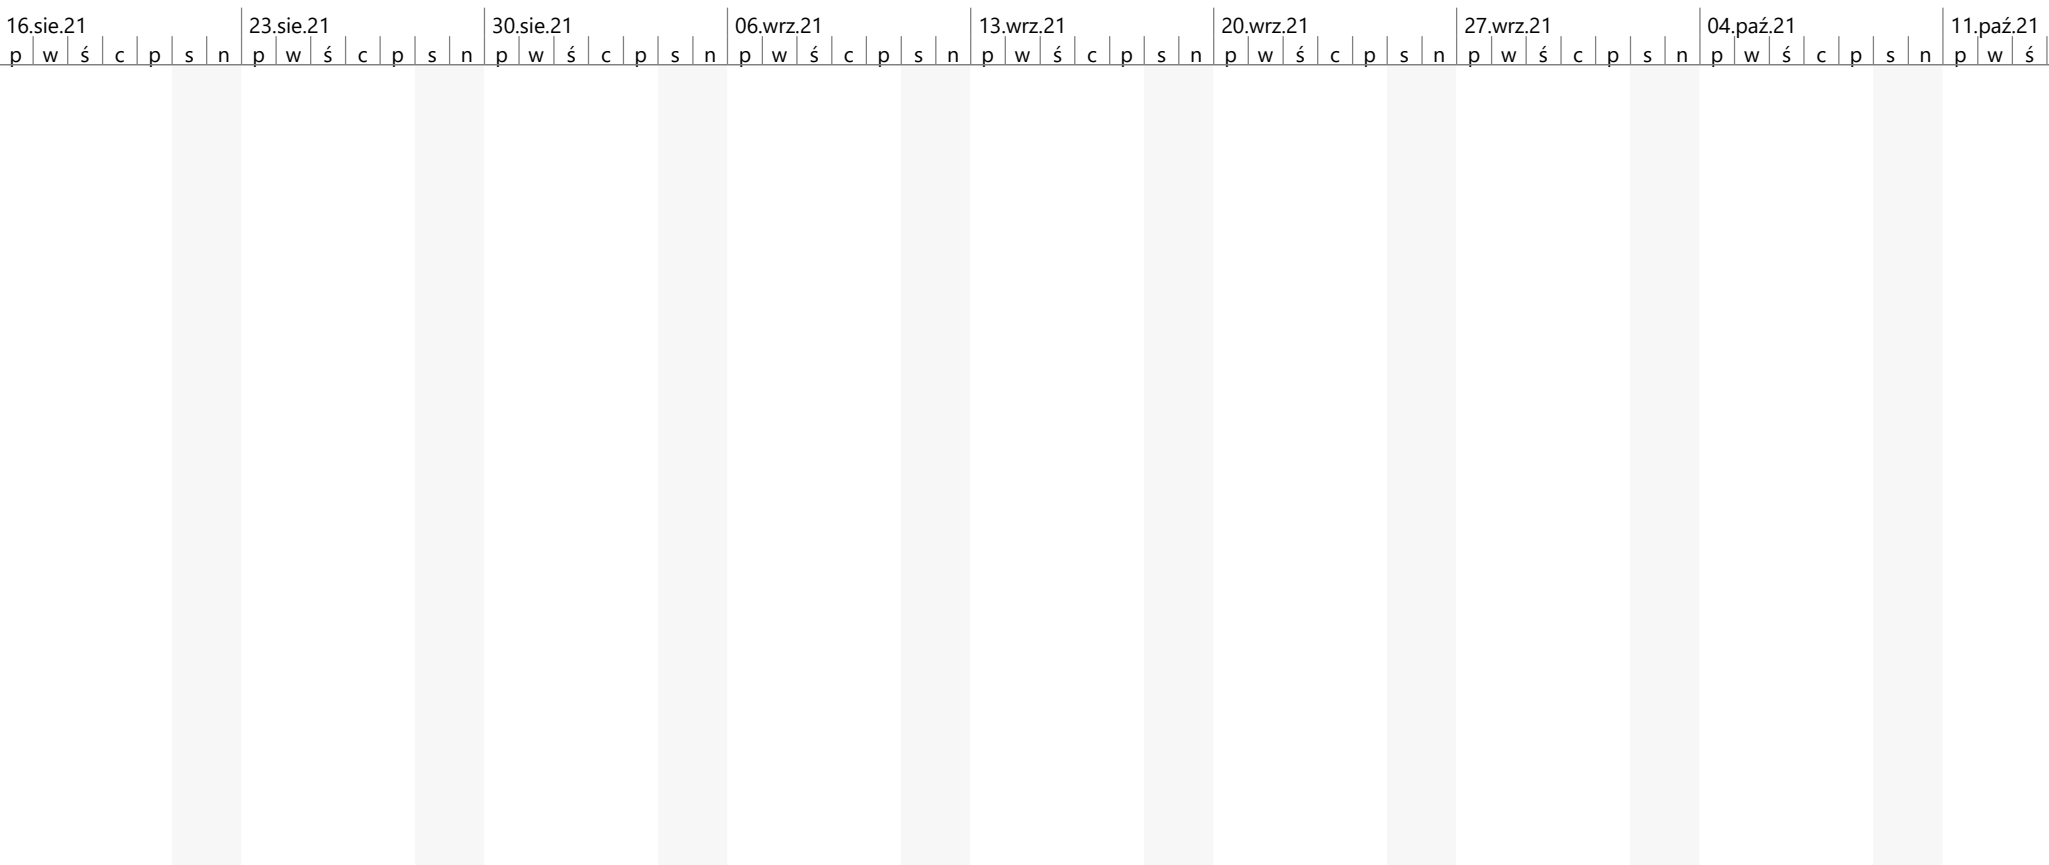












Postęp

Ręczne (postęp)

Strona 295



Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



16.sie.21

p w ś c p s n

23.sie.21

p w ś c p s n

30.sie.21

p w ś c p s n

06.wrz.21

p w ś c p s n

13.wrz.21

p w ś c p s n

20.wrz.21

p w ś c p s n

27.wrz.21

p w ś c p s n

04.paź.21

p w ś c p s n

11.paź.21

p w ś c p s n

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne


Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny


Postęp

Ręczne (postęp)



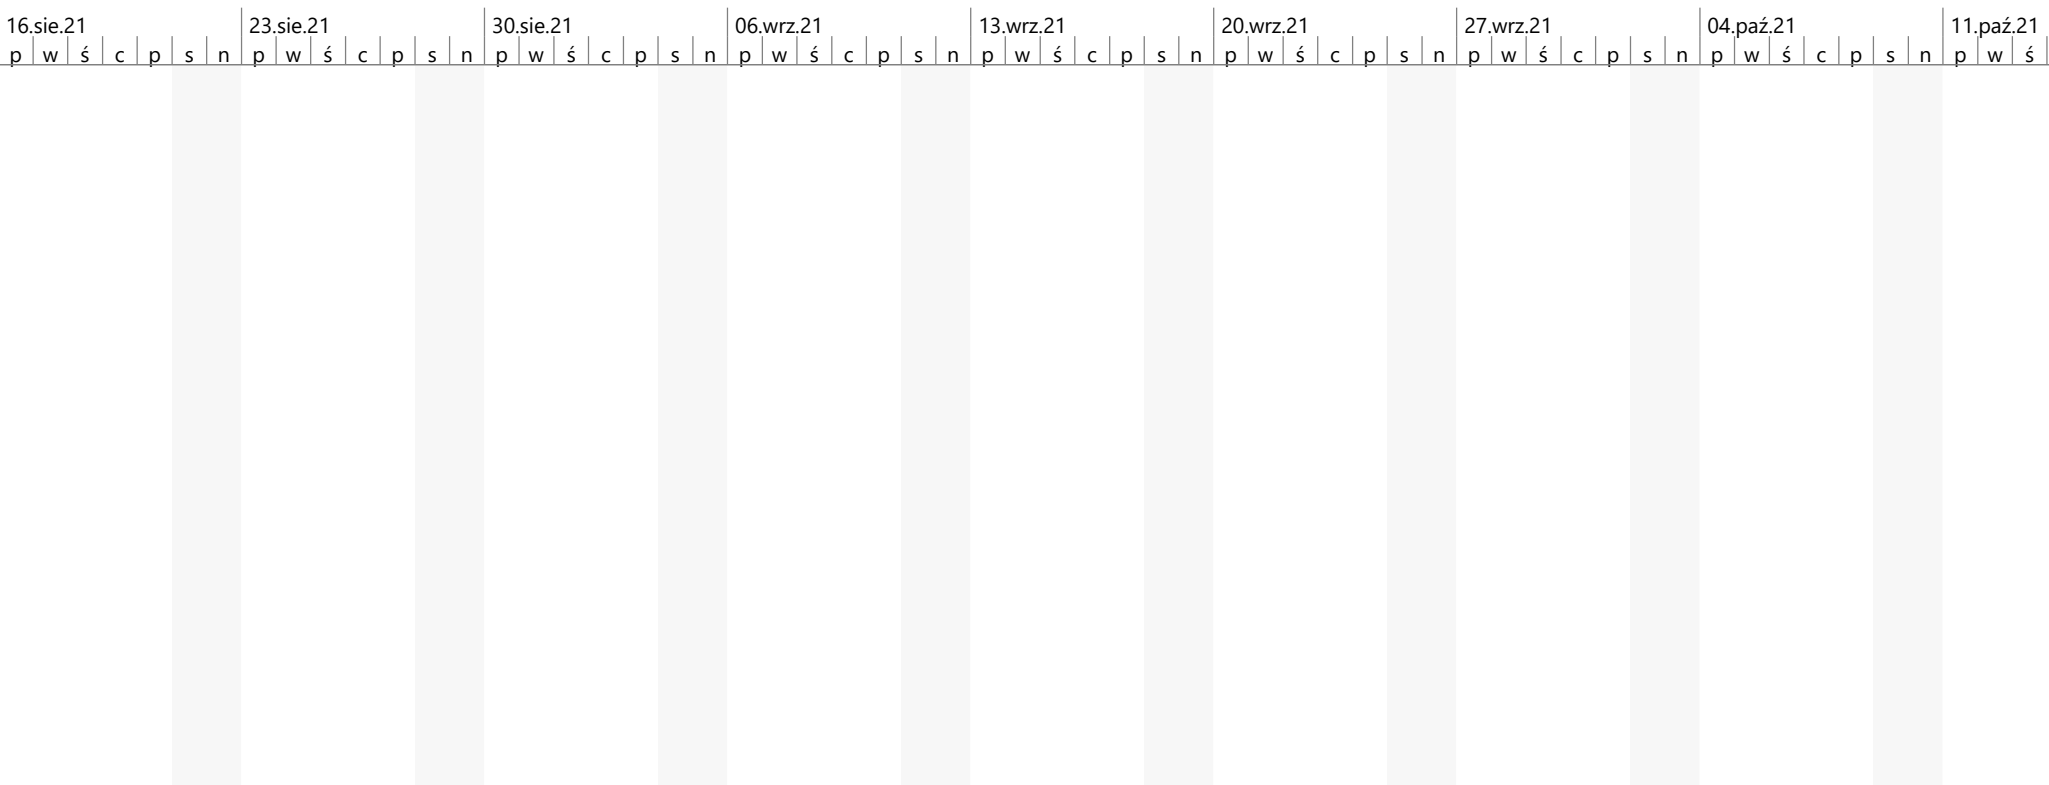



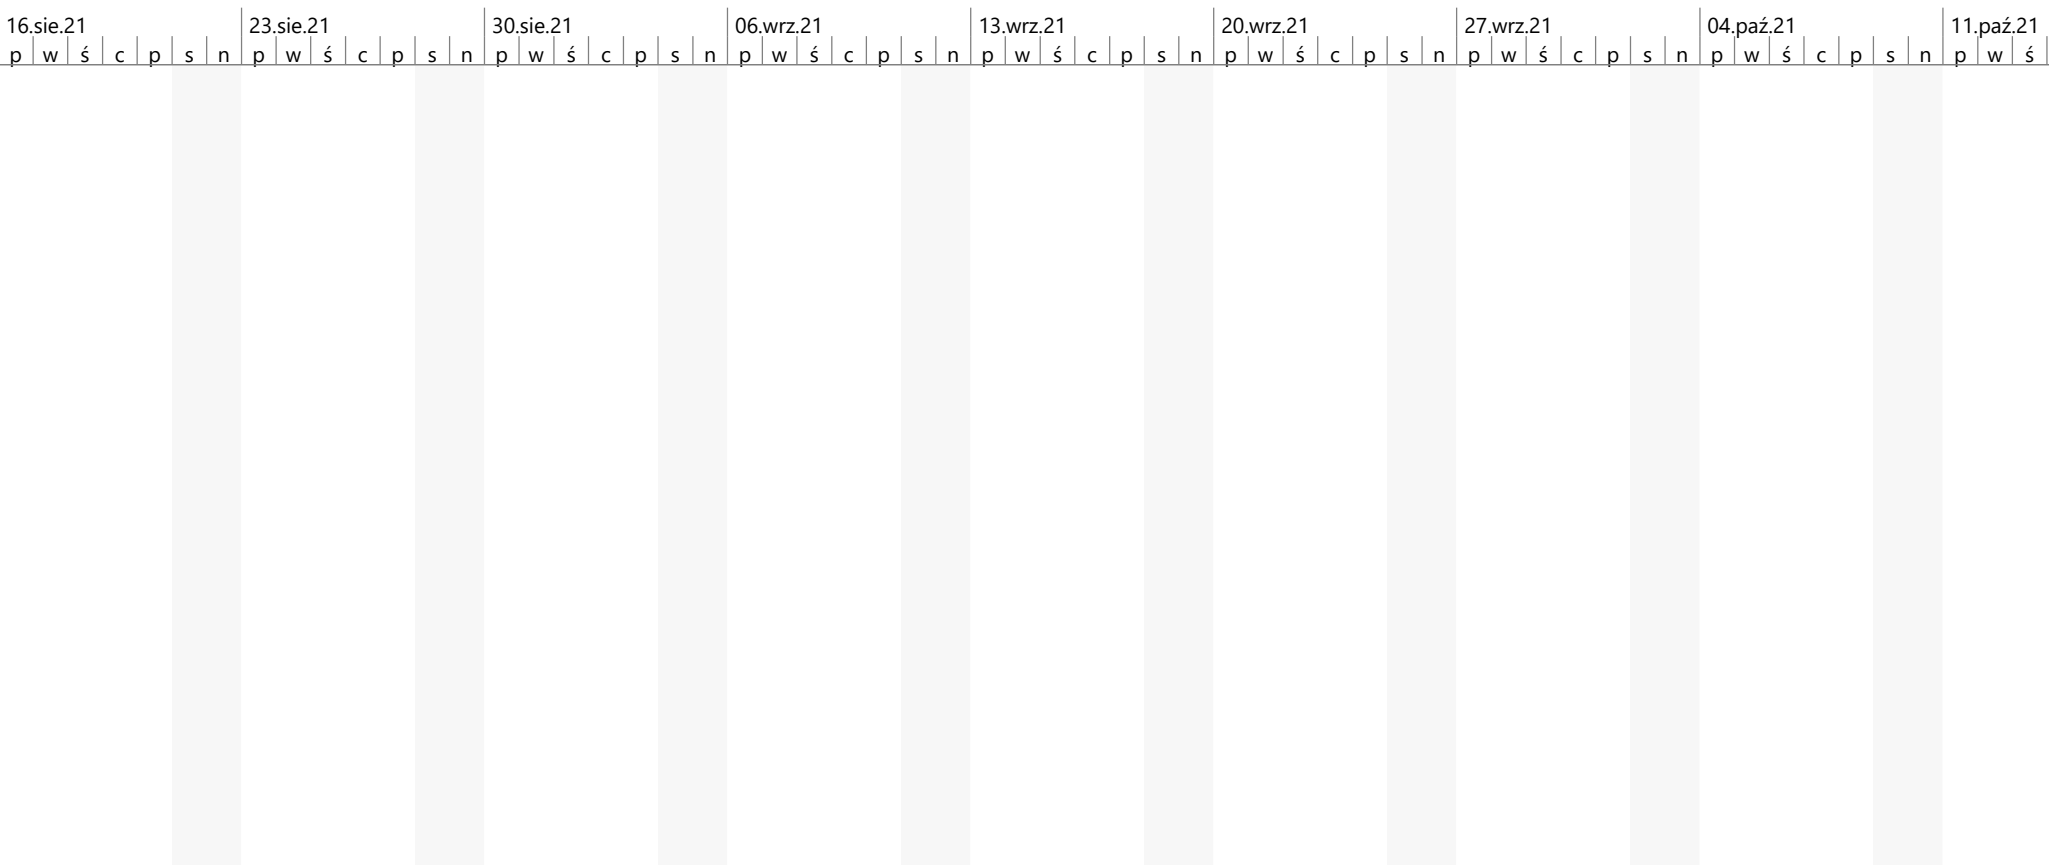












Strona 297




Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

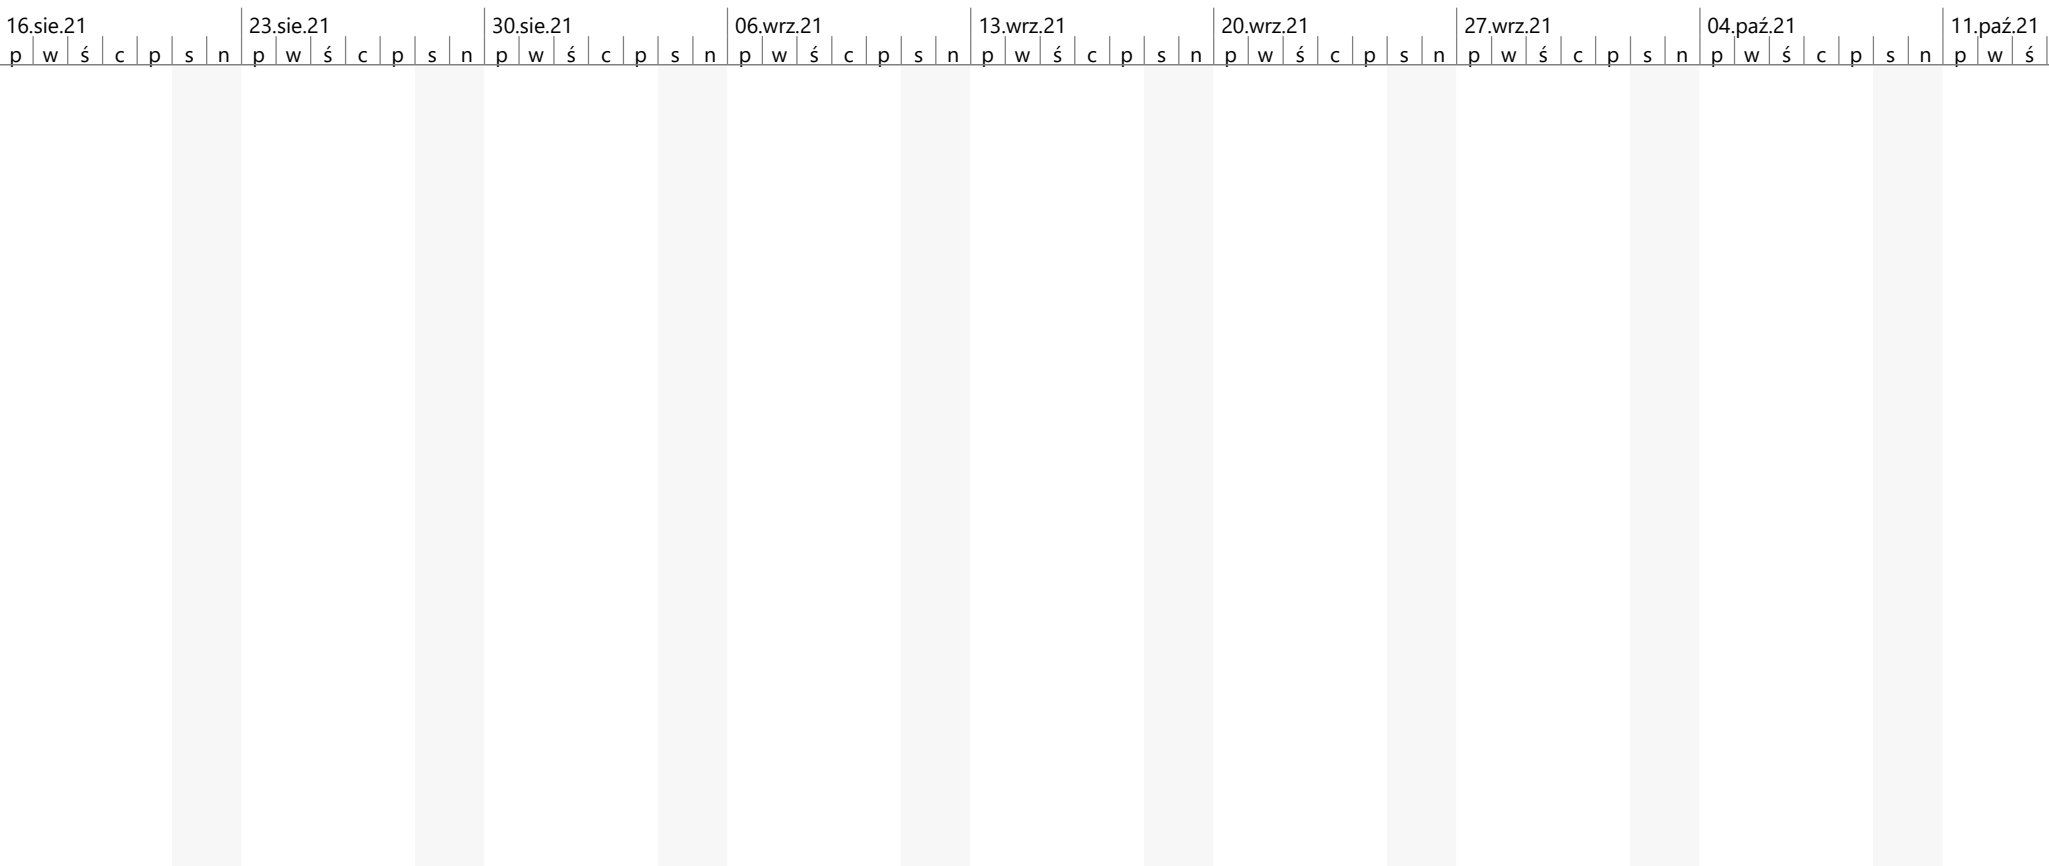

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

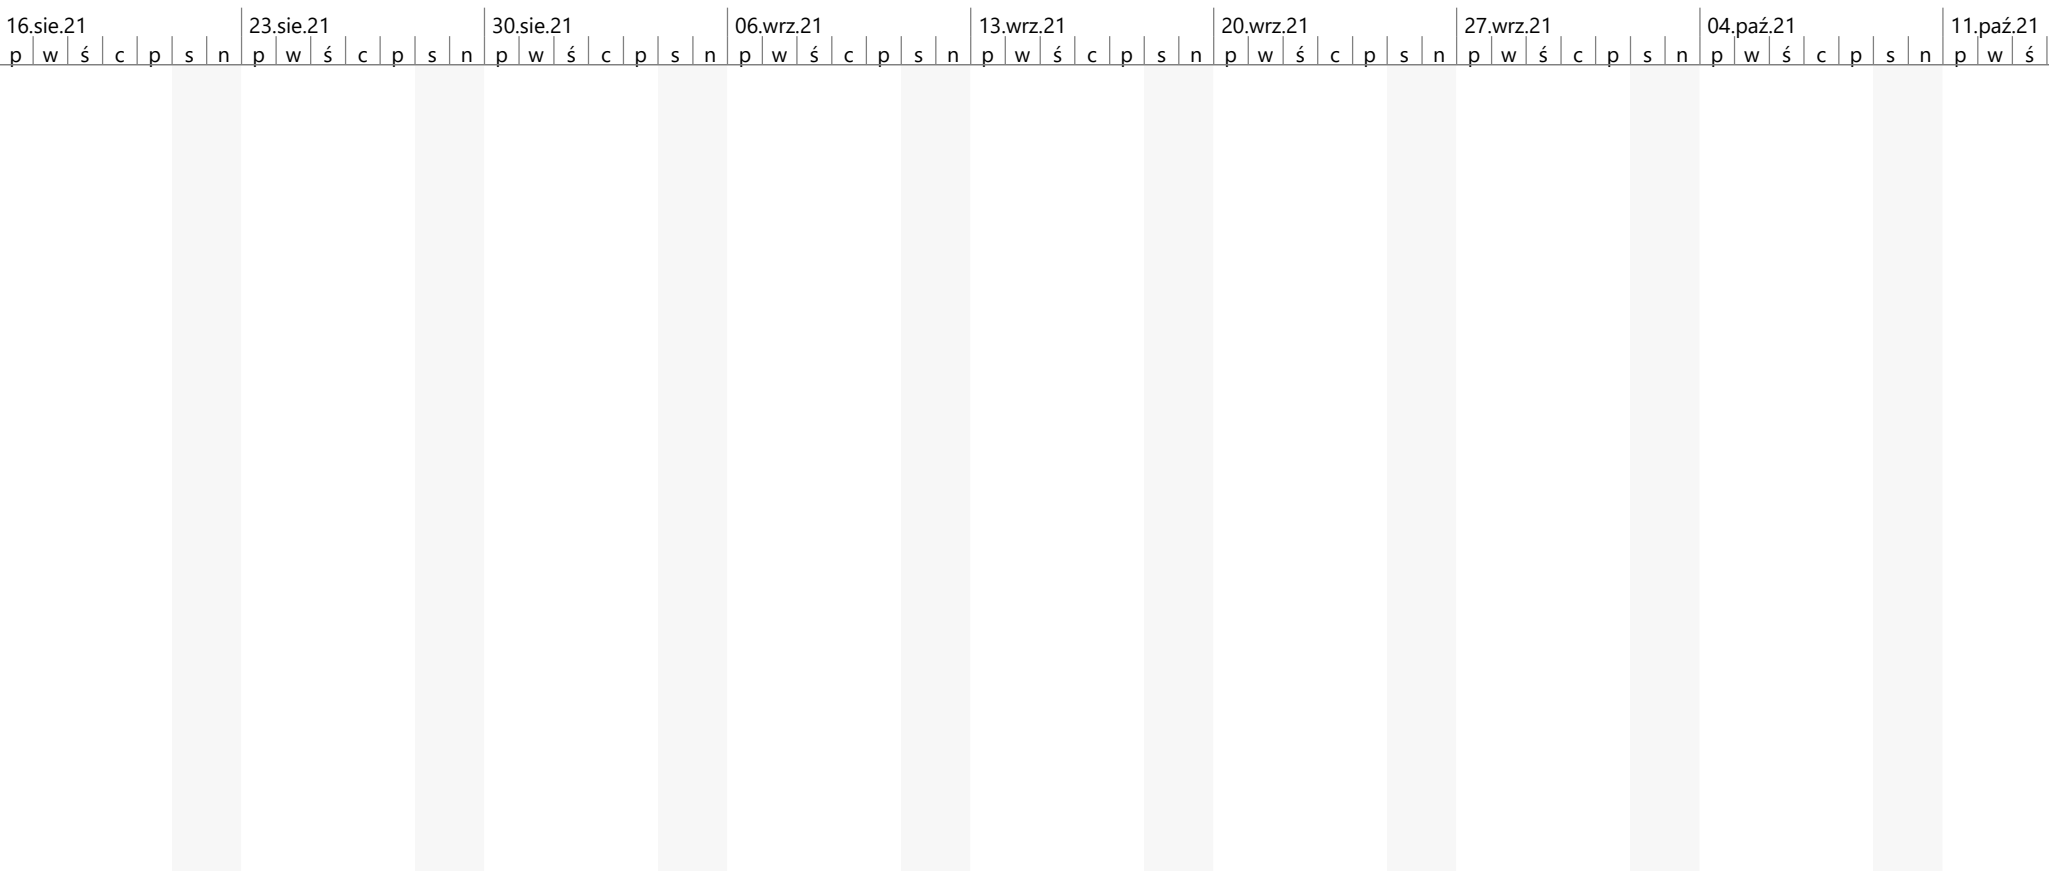

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



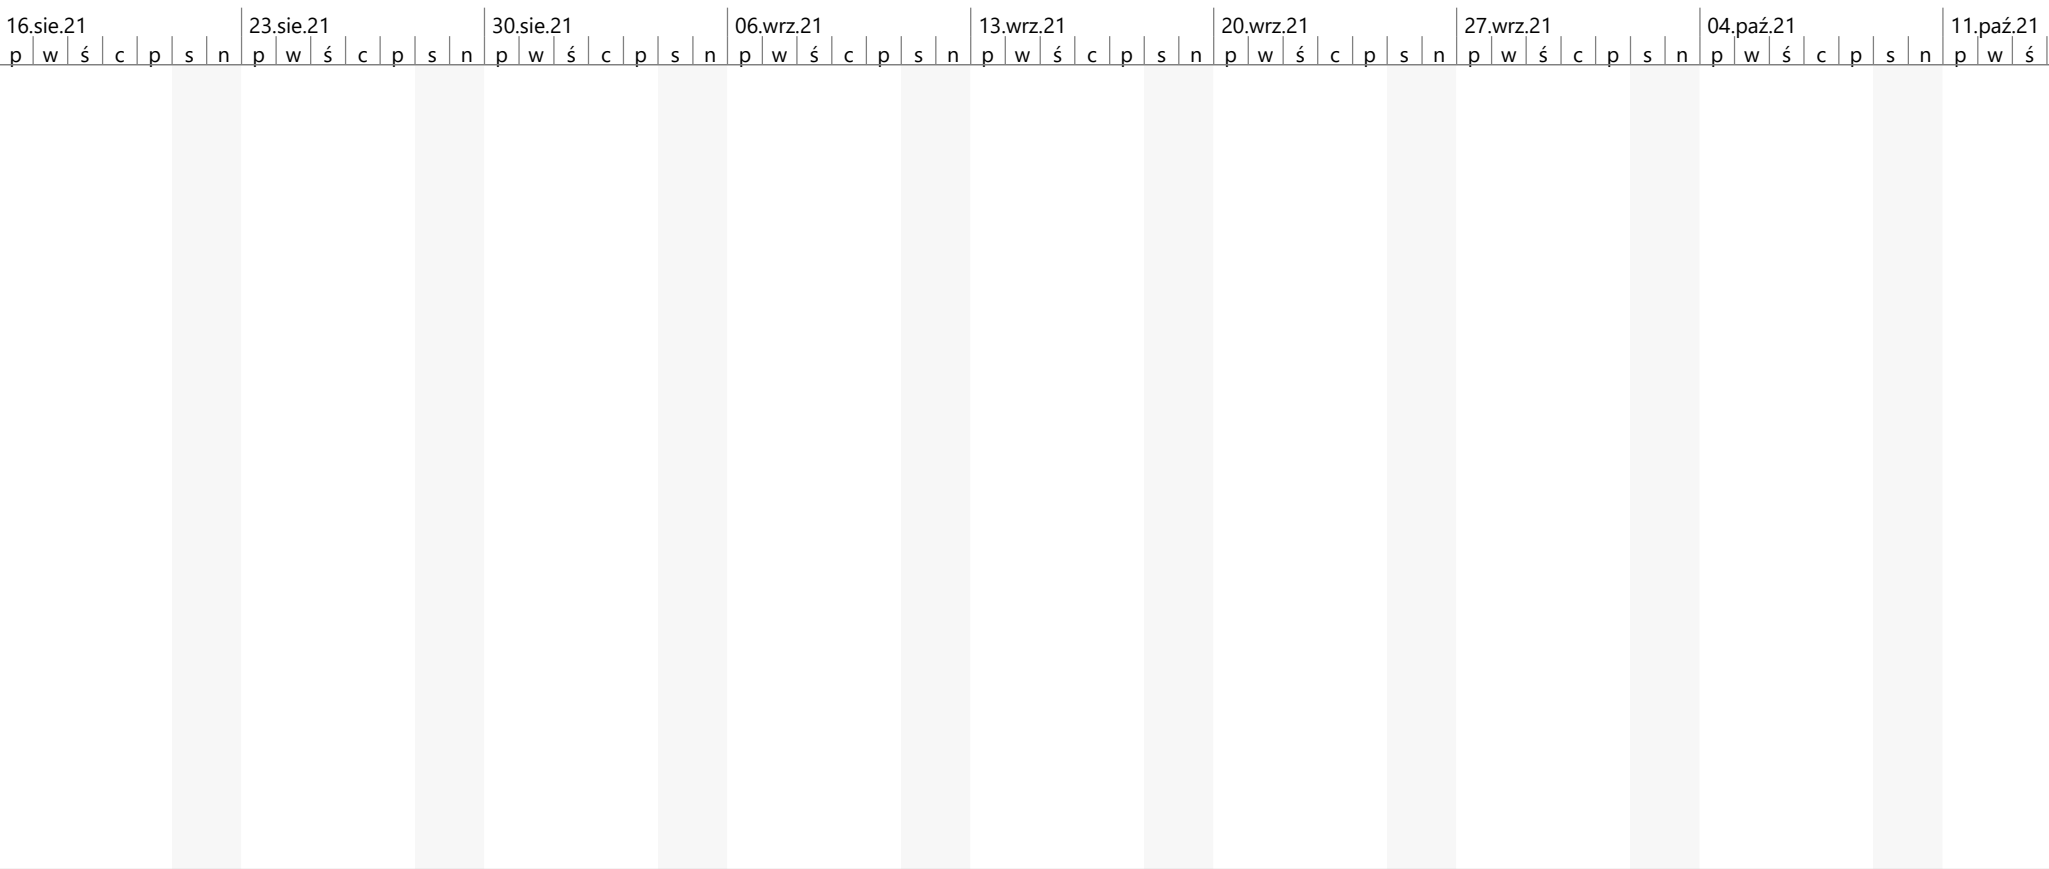


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			





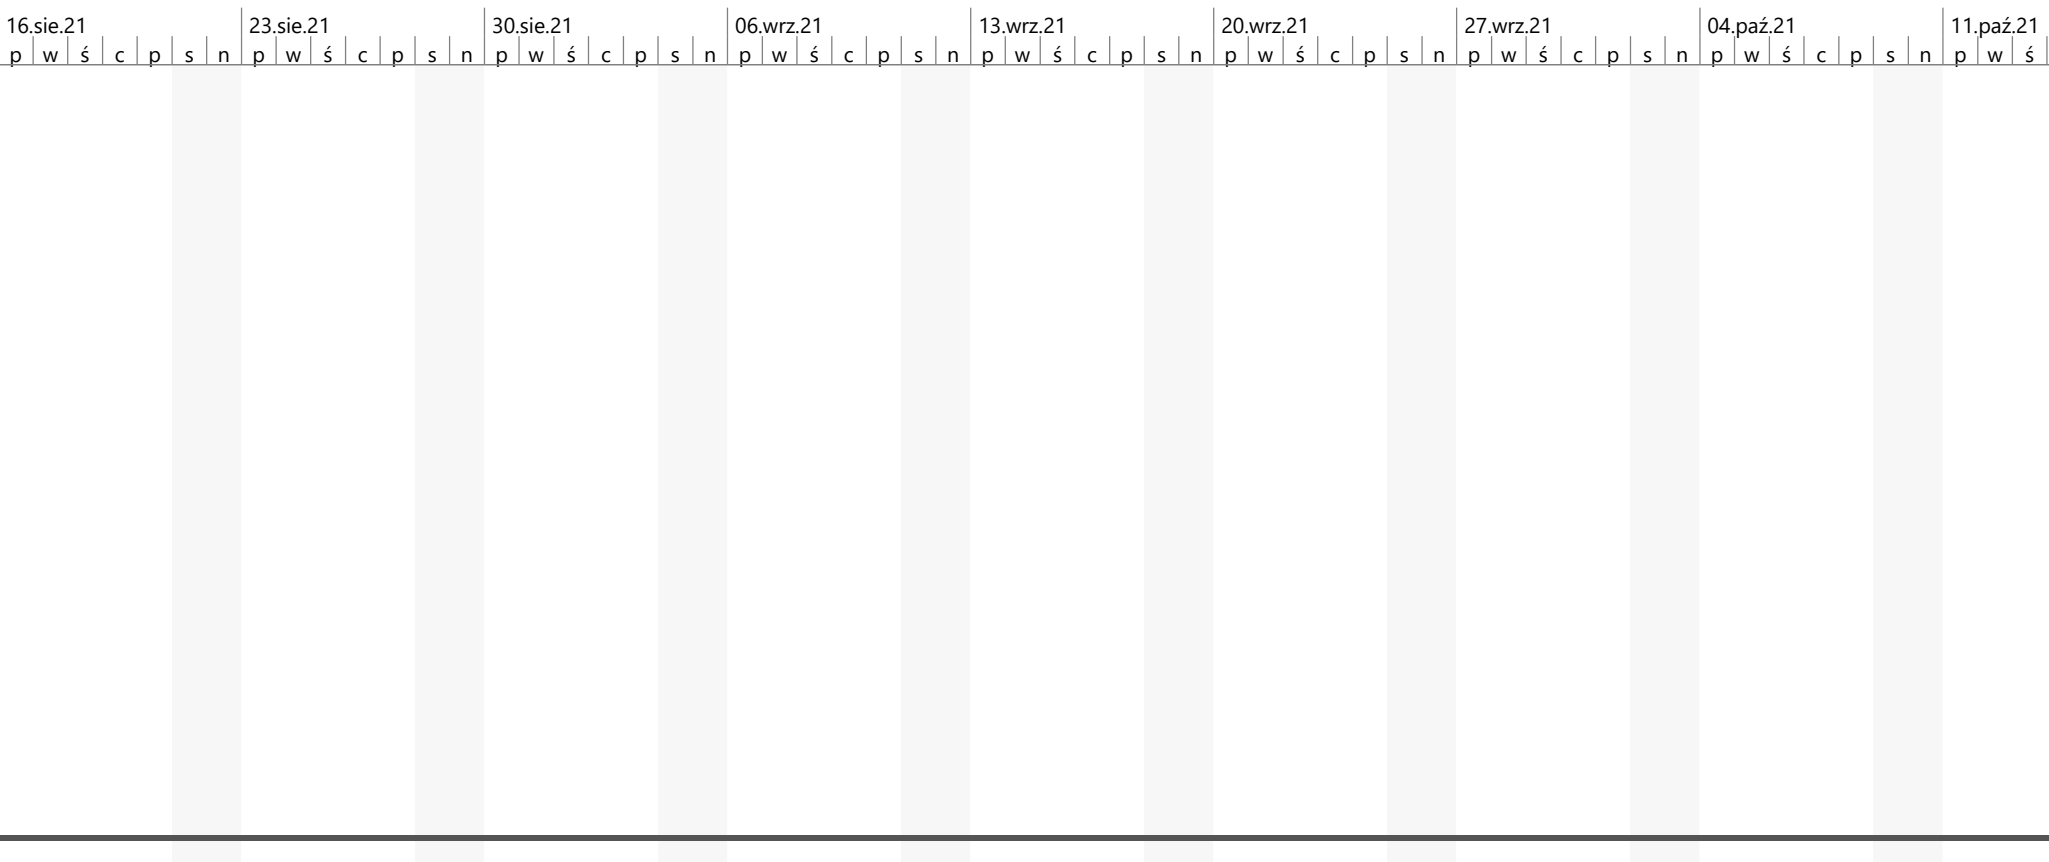




















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

[illegible]

				18.paź.21				25.paź.21				01.lis.21				08.lis.21				15.lis.21				22.lis.21				29.lis.21				06.gru.21																																															
c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s																																										
<div><div>Projekt: Projekt1</div><div>Data: pią, 07.08.20</div></div> <table><tr><th>Zadanie</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>Zadanie</td><td><div></div></td><td>Rzutowanie podsumowania ręcznego</td><td><div></div></td></tr><tr><td>Podział</td><td><div></div></td><td>Podsumowanie ręczne</td><td><div></div></td></tr><tr><td>Punkt kontrolny</td><td><div></div></td><td>Tylko z rozpoczęciem</td><td><div></div></td></tr><tr><td>Podsumowanie</td><td><div></div></td><td>Tylko z zakończeniem</td><td><div></div></td></tr><tr><td>Podsumowanie projektu</td><td><div></div></td><td>Zadania zewnętrzne</td><td><div></div></td></tr><tr><td>Zadanie nieaktywne</td><td><div></div></td><td>Zewnętrzne punkty kontrolne</td><td><div></div></td></tr><tr><td>Nieaktywny punkt kontrolny</td><td><div></div></td><td>Termin ostateczny</td><td><div></div></td></tr><tr><td>Podsumowanie nieaktywne</td><td><div></div></td><td>Postęp</td><td><div></div></td></tr><tr><td>Zadanie ręczne</td><td><div></div></td><td>Ręczne (postęp)</td><td><div></div></td></tr><tr><td>Tylko z czasem trwania</td><td><div></div></td><td></td><td></td></tr></table>																																				Zadanie				Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>	Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>	Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>	Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>	Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>	Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>	Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>	Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>	Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>	Tylko z czasem trwania	<div></div>		
Zadanie																																																																															
Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>																																																																												
Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>																																																																												
Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>																																																																												
Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>																																																																												
Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>																																																																												
Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>																																																																												
Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>																																																																												
Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>																																																																												
Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>																																																																												
Tylko z czasem trwania	<div></div>																																																																														

Strona 307

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




[illegible]

Projekt: Projekt1		Data: pią, 07.08.20	
Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			








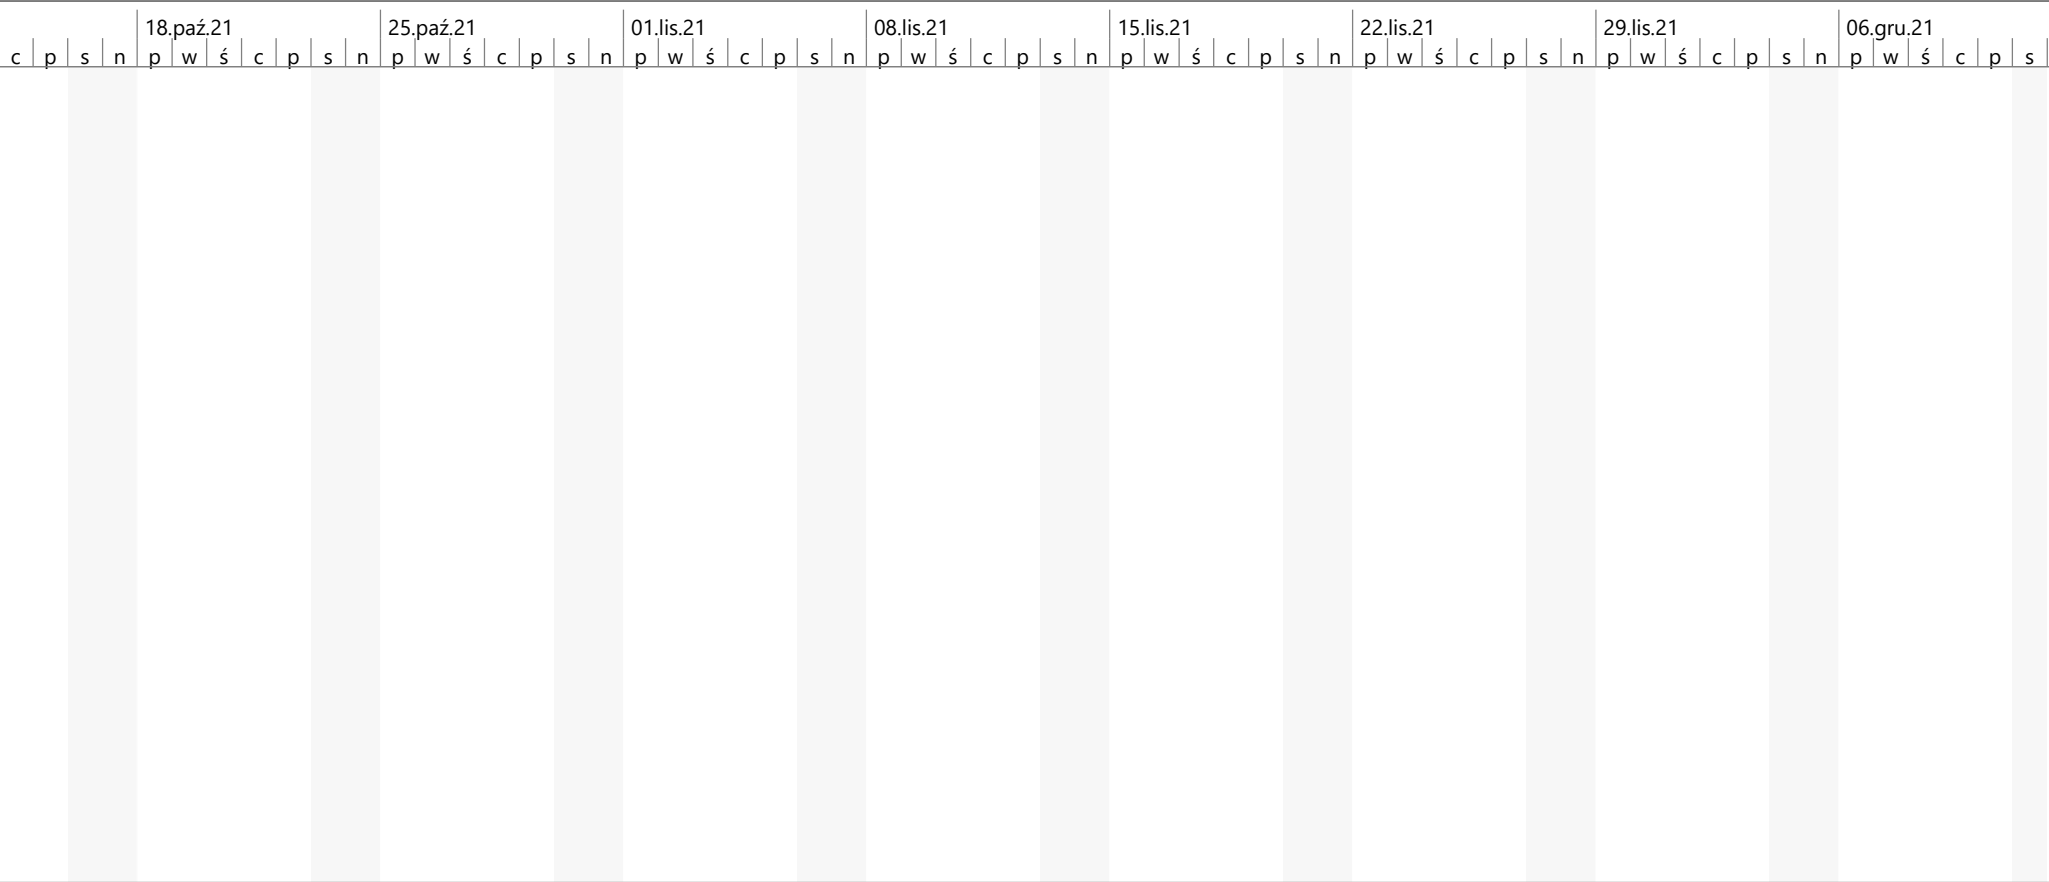

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20





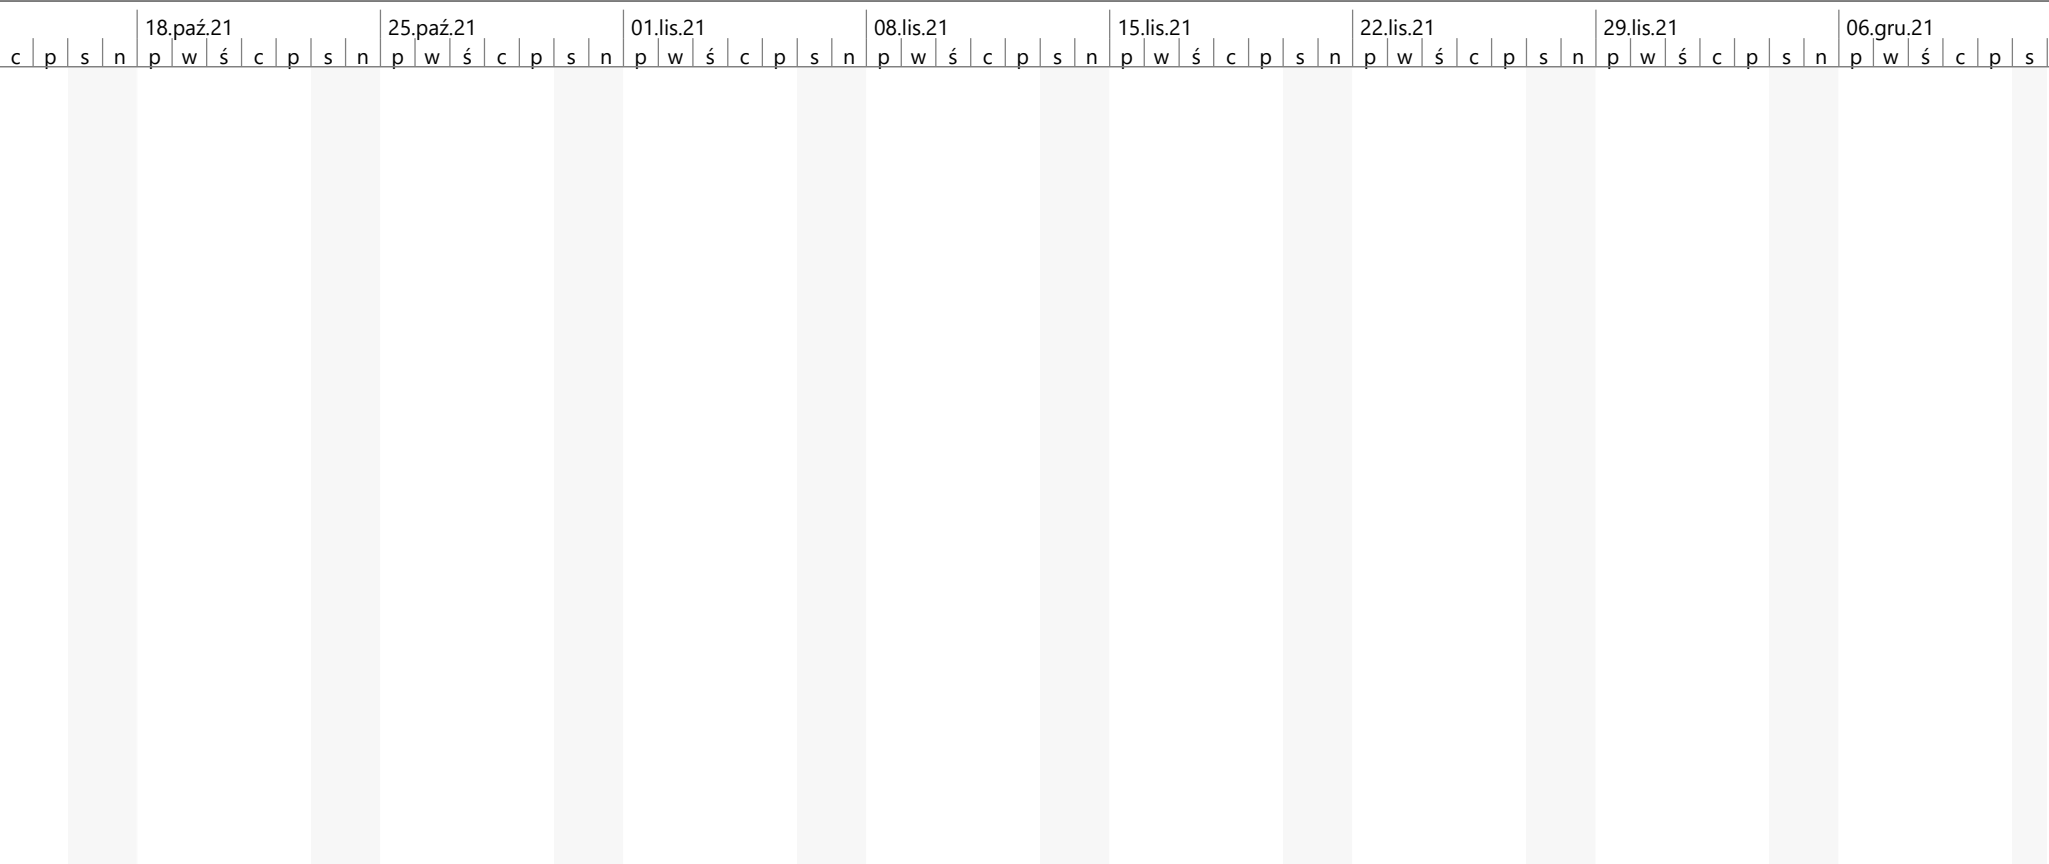














Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			





Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			
















































[illegible]

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1		Data: pią, 07.08.20	
Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			






	c	p	s	n	18.paź.21				25.paź.21				01.lis.21				08.lis.21				15.lis.21				22.lis.21				29.lis.21				06.gru.21						
					p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	




Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



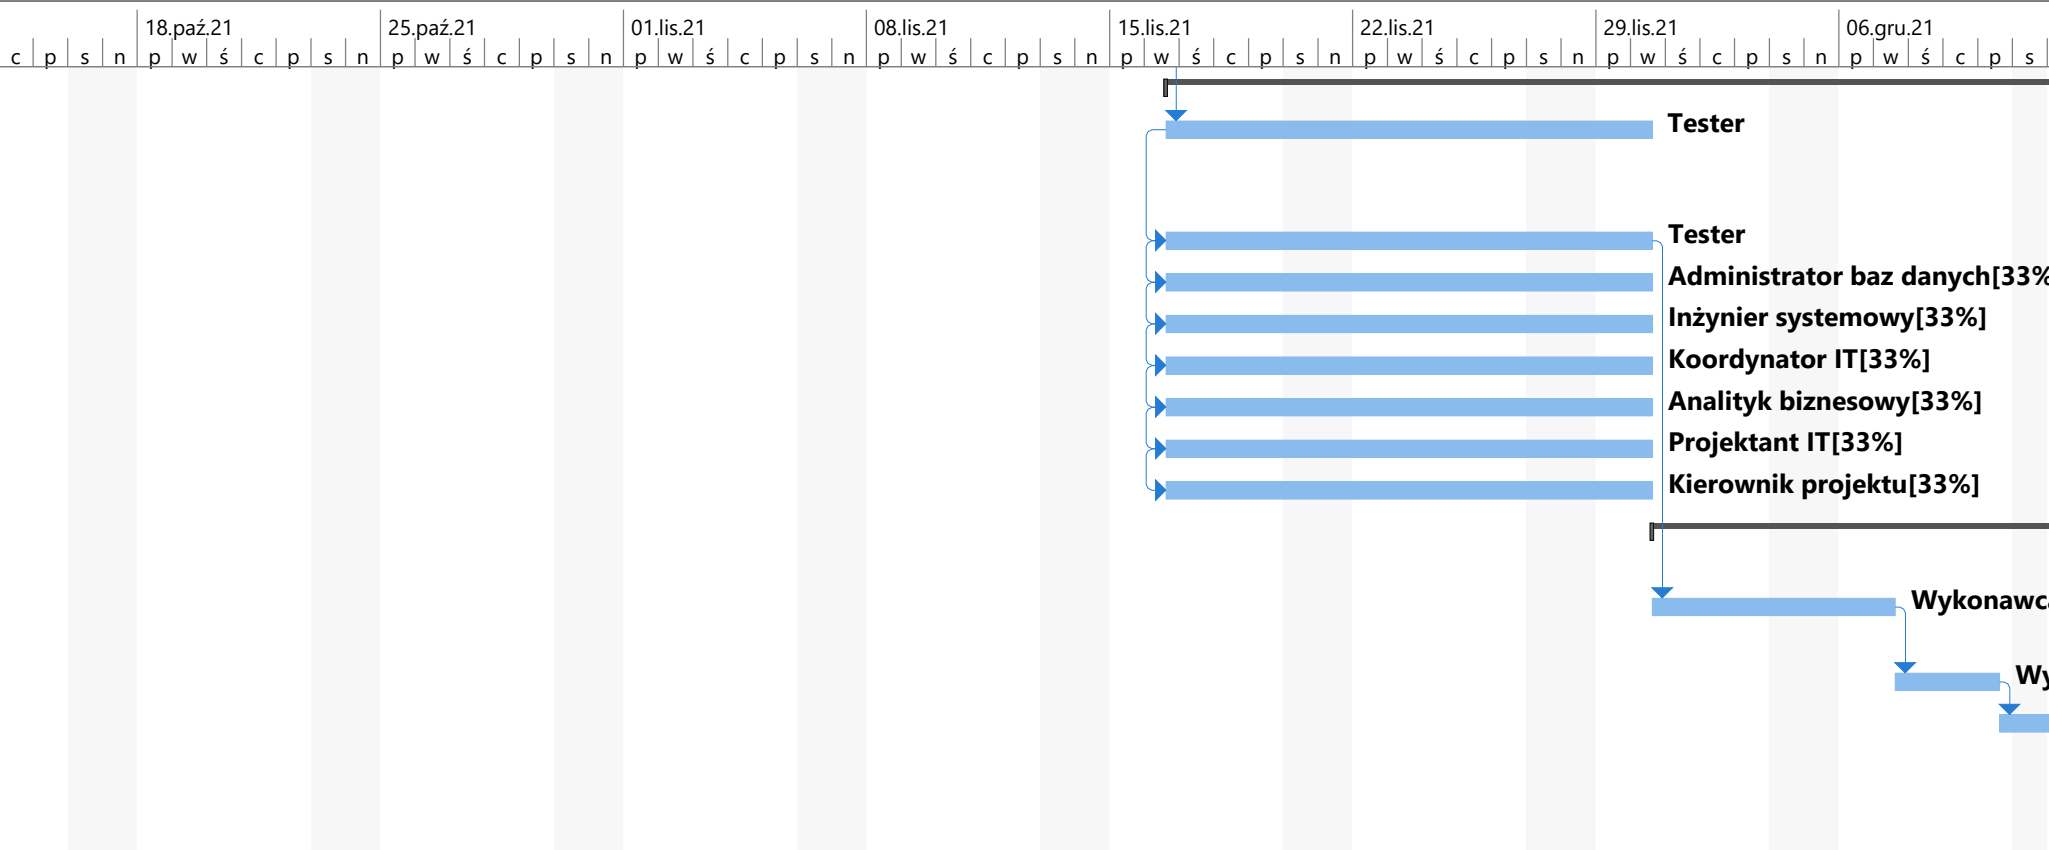



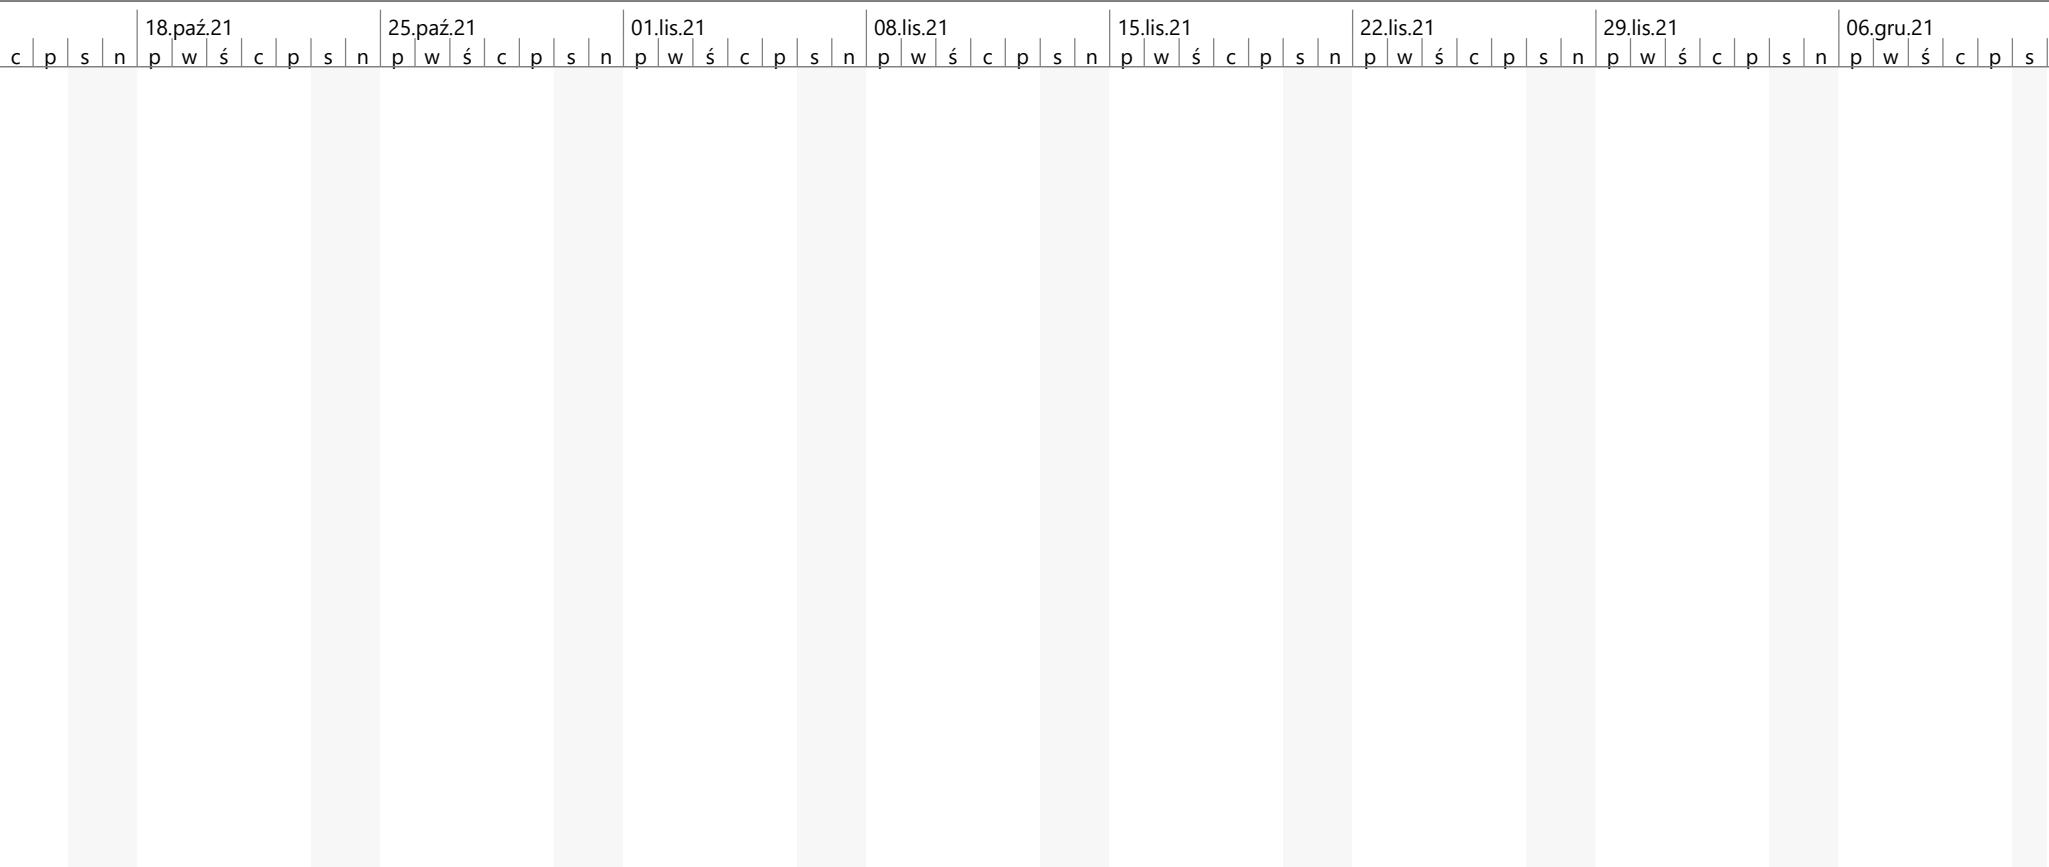
















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			









































Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			
























Legenda	
Zadanie	
Podział	
Punkt kontrolny	
Podsumowanie	
Podsumowanie projektu	
Zadanie nieaktywne	
Nieaktywny punkt kontrolny	
Podsumowanie nieaktywne	
Zadanie ręczne	
Tylko z czasem trwania	
Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podsumowanie ręczne	
Tylko z rozpoczęciem	
Tylko z zakończeniem	
Zadania zewnętrzne	
Zewnętrzne punkty kontrolne	
Termin ostateczny	
Postęp	
Ręczne (postęp)	




















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			


[illegible]

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

Projekt: Projekt1		Data: pią, 07.08.20	
Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

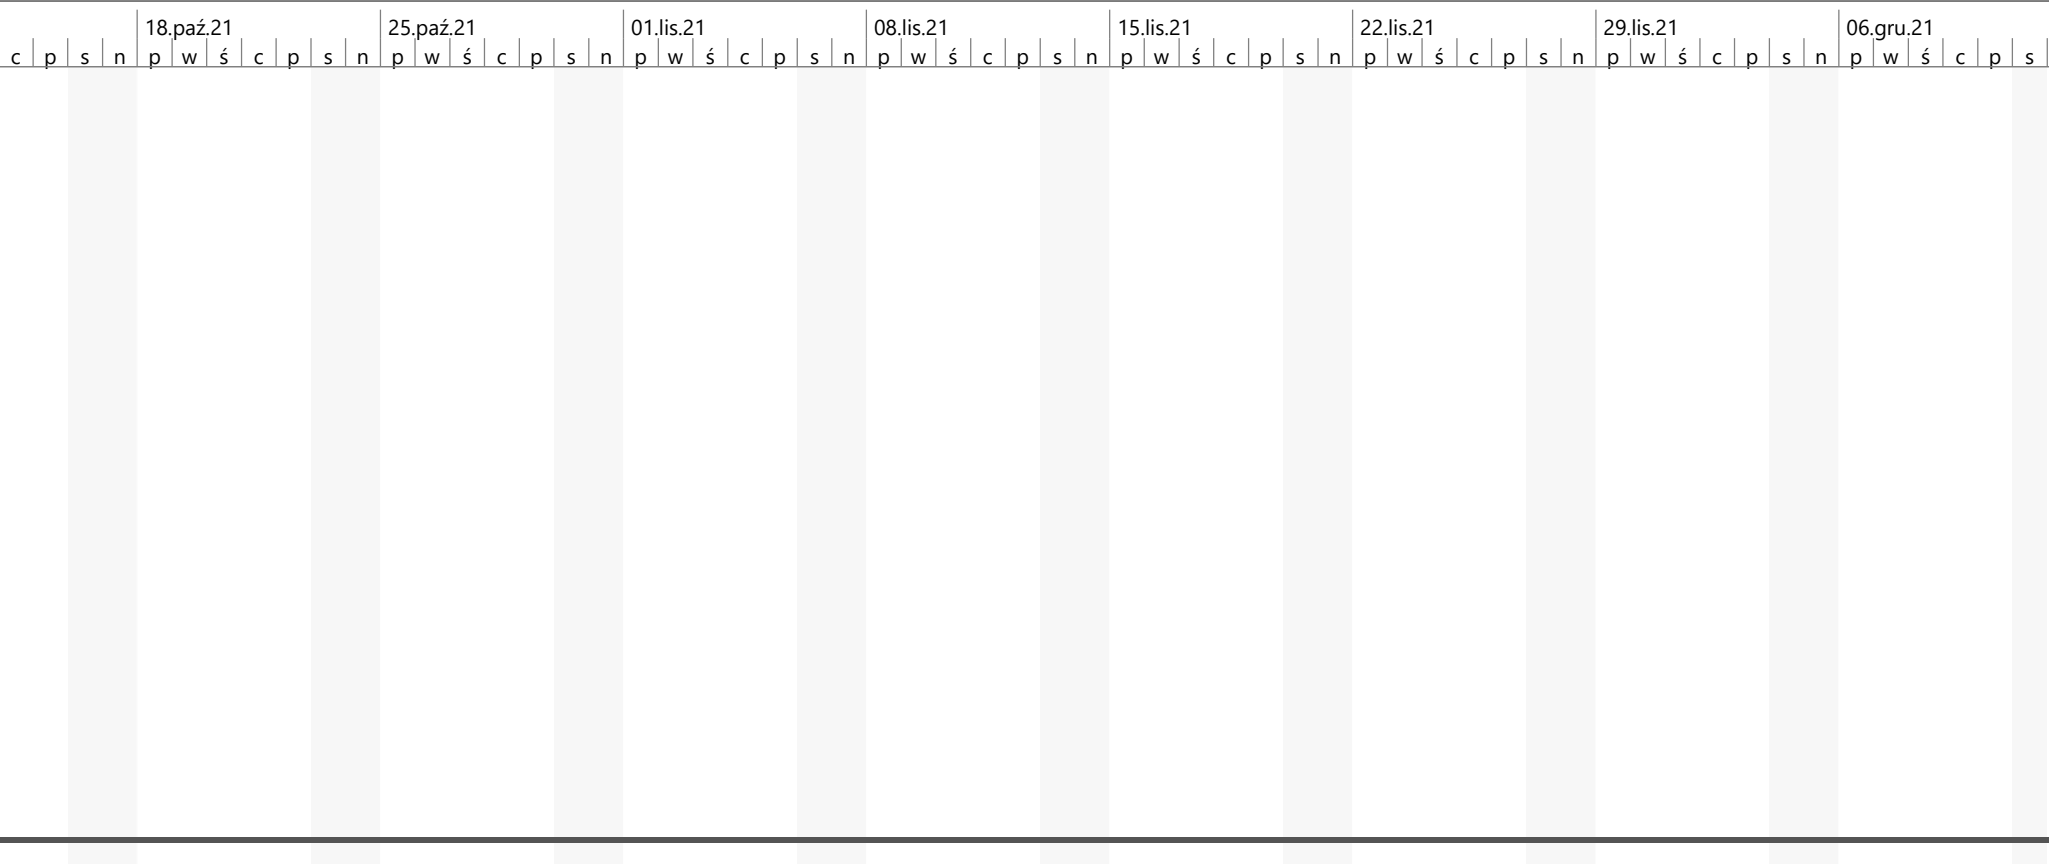

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

c				18.paź.21				25.paź.21				01.lis.21				08.lis.21				15.lis.21				22.lis.21				29.lis.21				06.gru.21							
c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Strona 340

13.gru.21

n p w ś c p s n

20.gru.21

p w ś c p s n

27.gru.21

p w ś c p s n

03.sty.22

p w ś c p s n

10.sty.22

p w ś c p s n

17.sty.22

p w ś c p s n

24.sty.22

p w ś c p s n

31.sty.22

p w ś c p s n

07.lut.22

p w

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne


Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)

Strona 341



Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20




















Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			








[illegible]

Legenda	
Zadanie	 Rzutowanie podsumowania ręcznego 
Podział	 Podsumowanie ręczne 
Punkt kontrolny	 Tylko z rozpoczęciem 
Podsumowanie	 Tylko z zakończeniem 
Podsumowanie projektu	 Zadania zewnętrzne 
Zadanie nieaktywne	 Zewnętrzne punkty kontrolne 
Nieaktywny punkt kontrolny	 Termin ostateczny 
Podsumowanie nieaktywne	 Postęp 
Zadanie ręczne	 Ręczne (postęp) 
Tylko z czasem trwania	





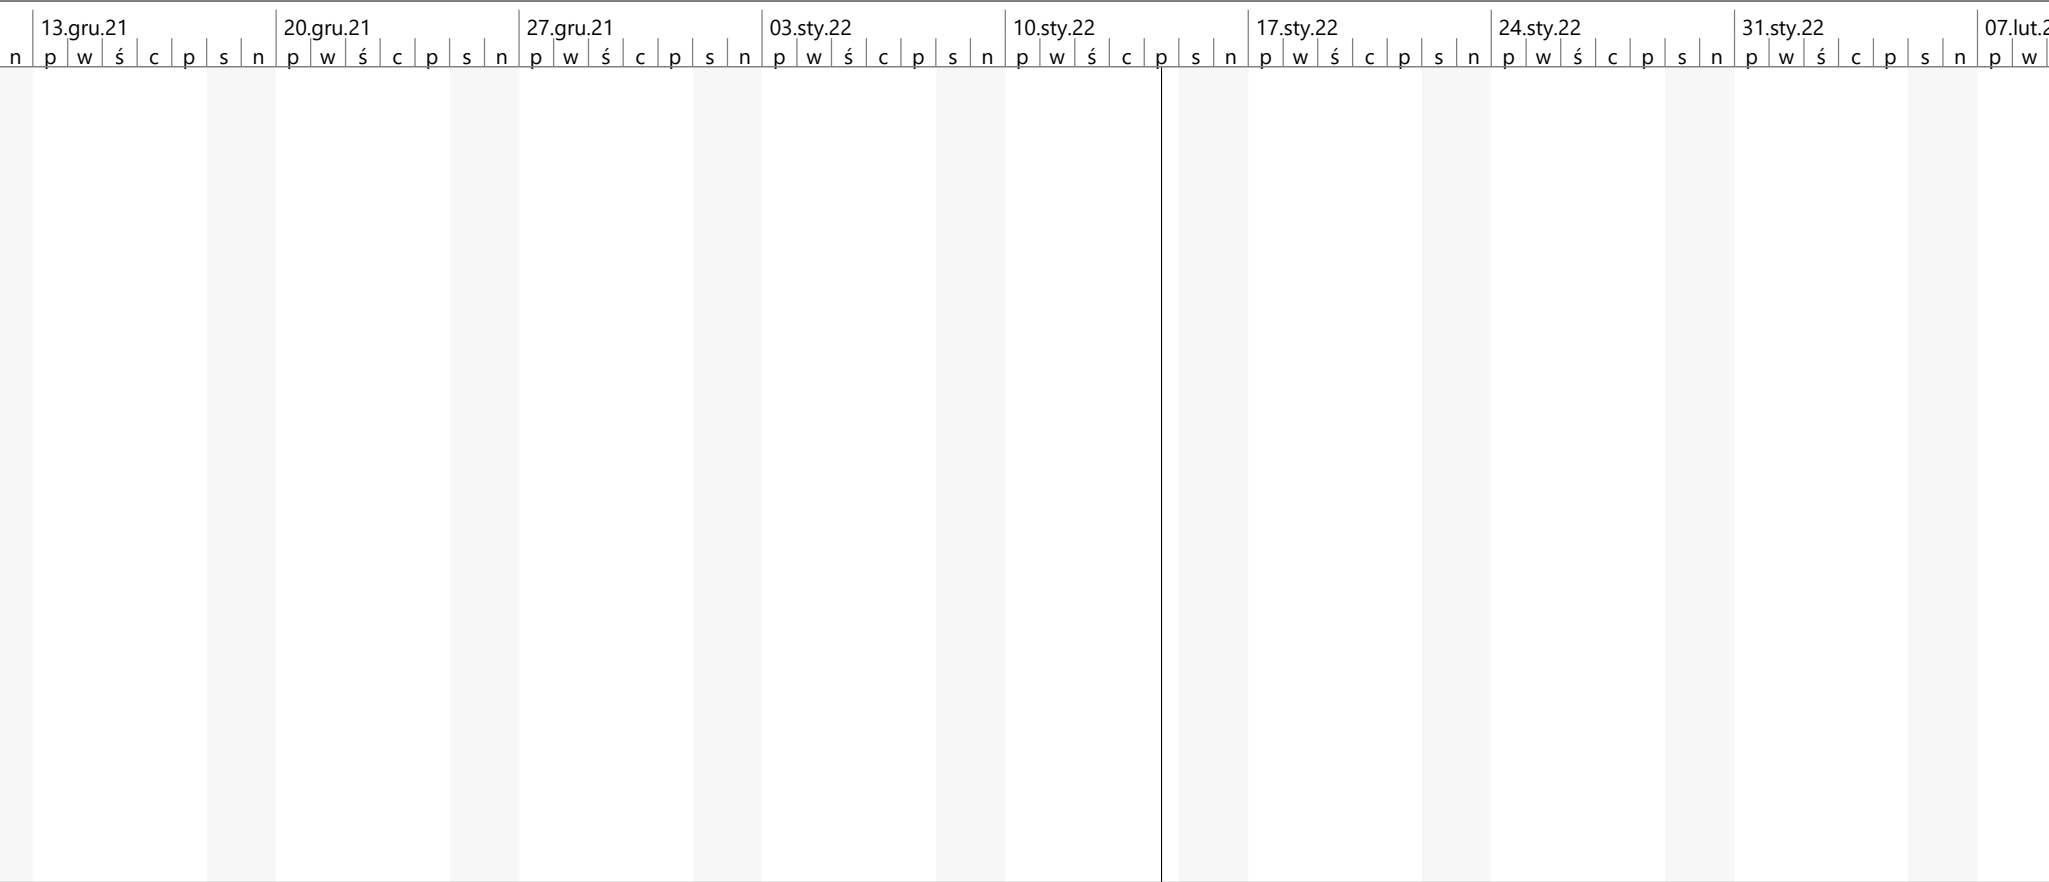

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

13.gru.21

n p w ś c p s n

20.gru.21

p w ś c p s n

27.gru.21

p w ś c p s n

03.sty.22

p w ś c p s n

10.sty.22

p w ś c p s n

17.sty.22

p w ś c p s n

24.sty.22

p w ś c p s n

31.sty.22

p w ś c p s n

07.lut.22

p w

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

Strona 349





























[illegible]

Projekt: Projekt1		Data: pią, 07.08.20	
Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			








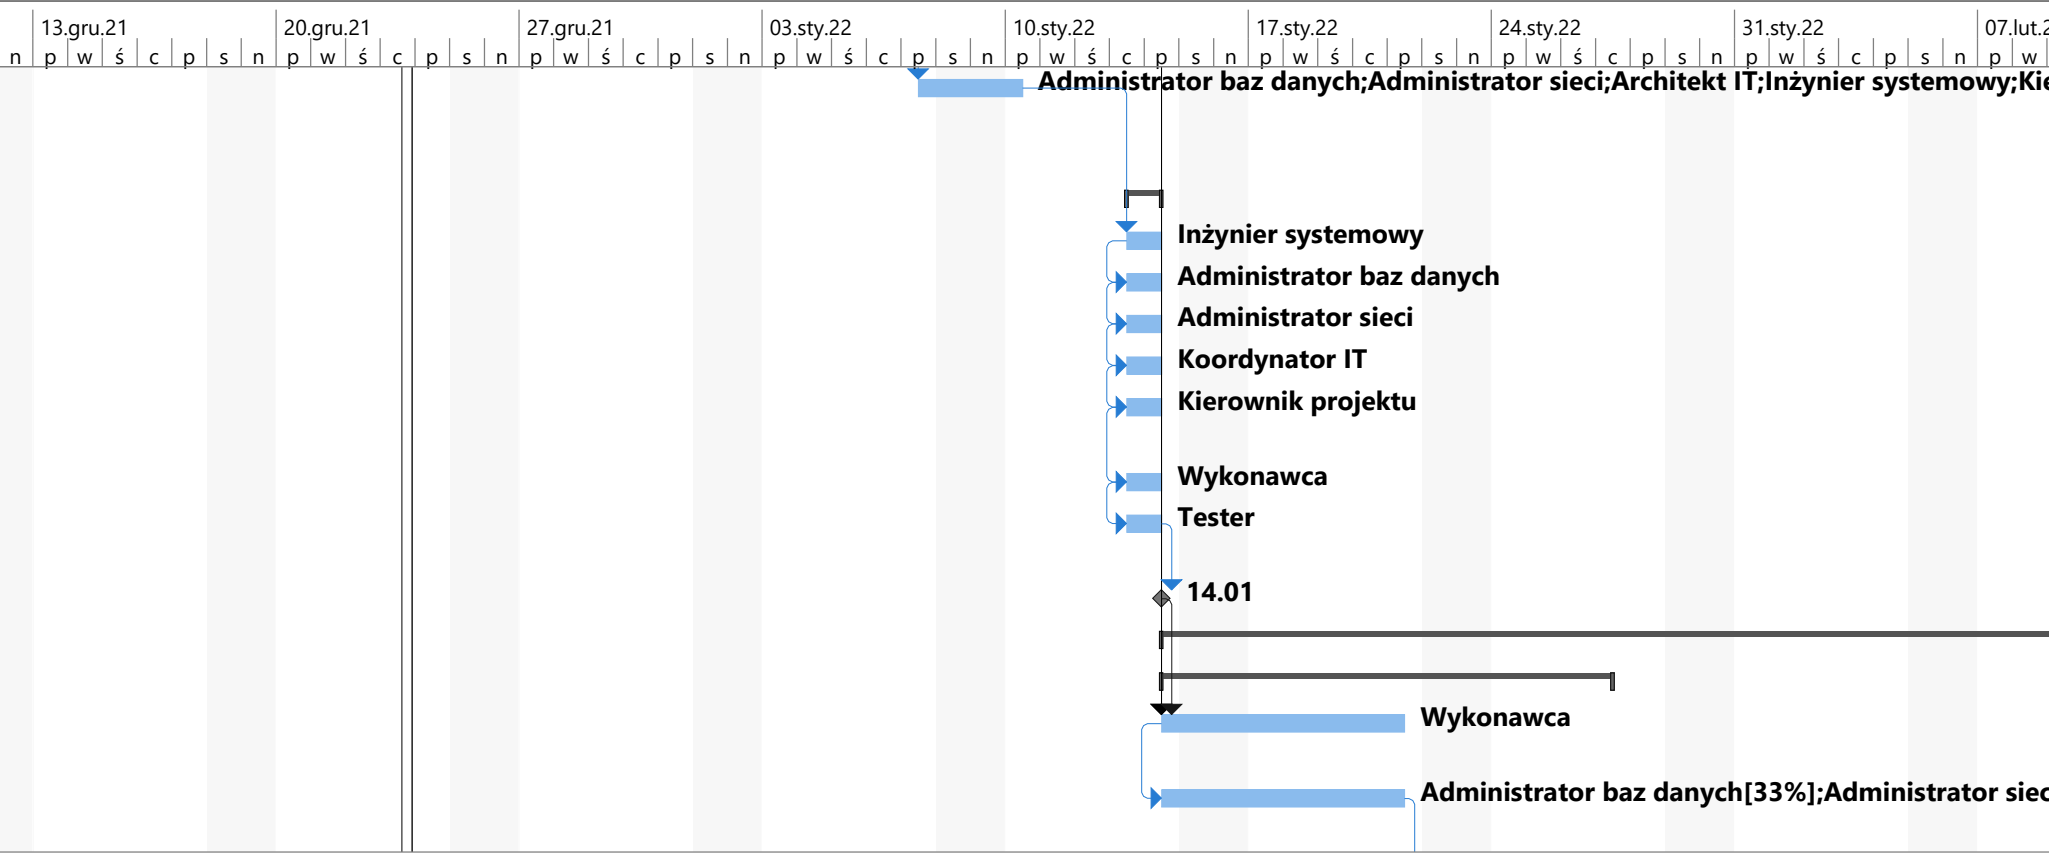



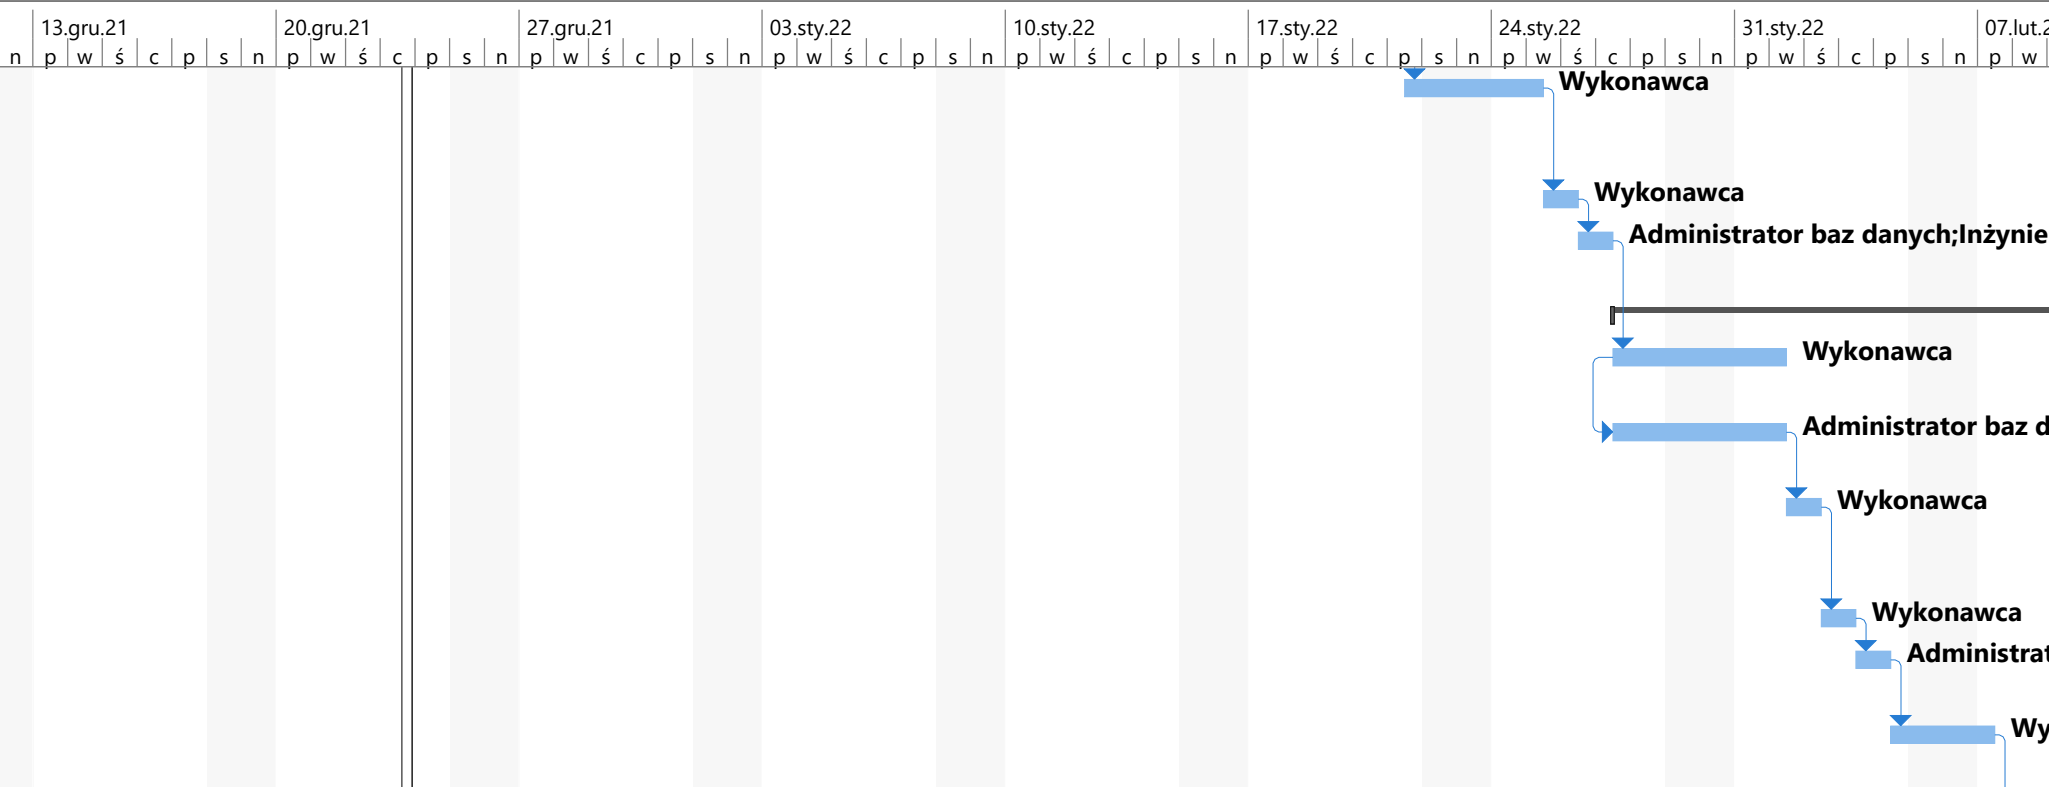
















Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




[illegible]

Projekt: Projekt1		Data: pią, 07.08.20	
Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




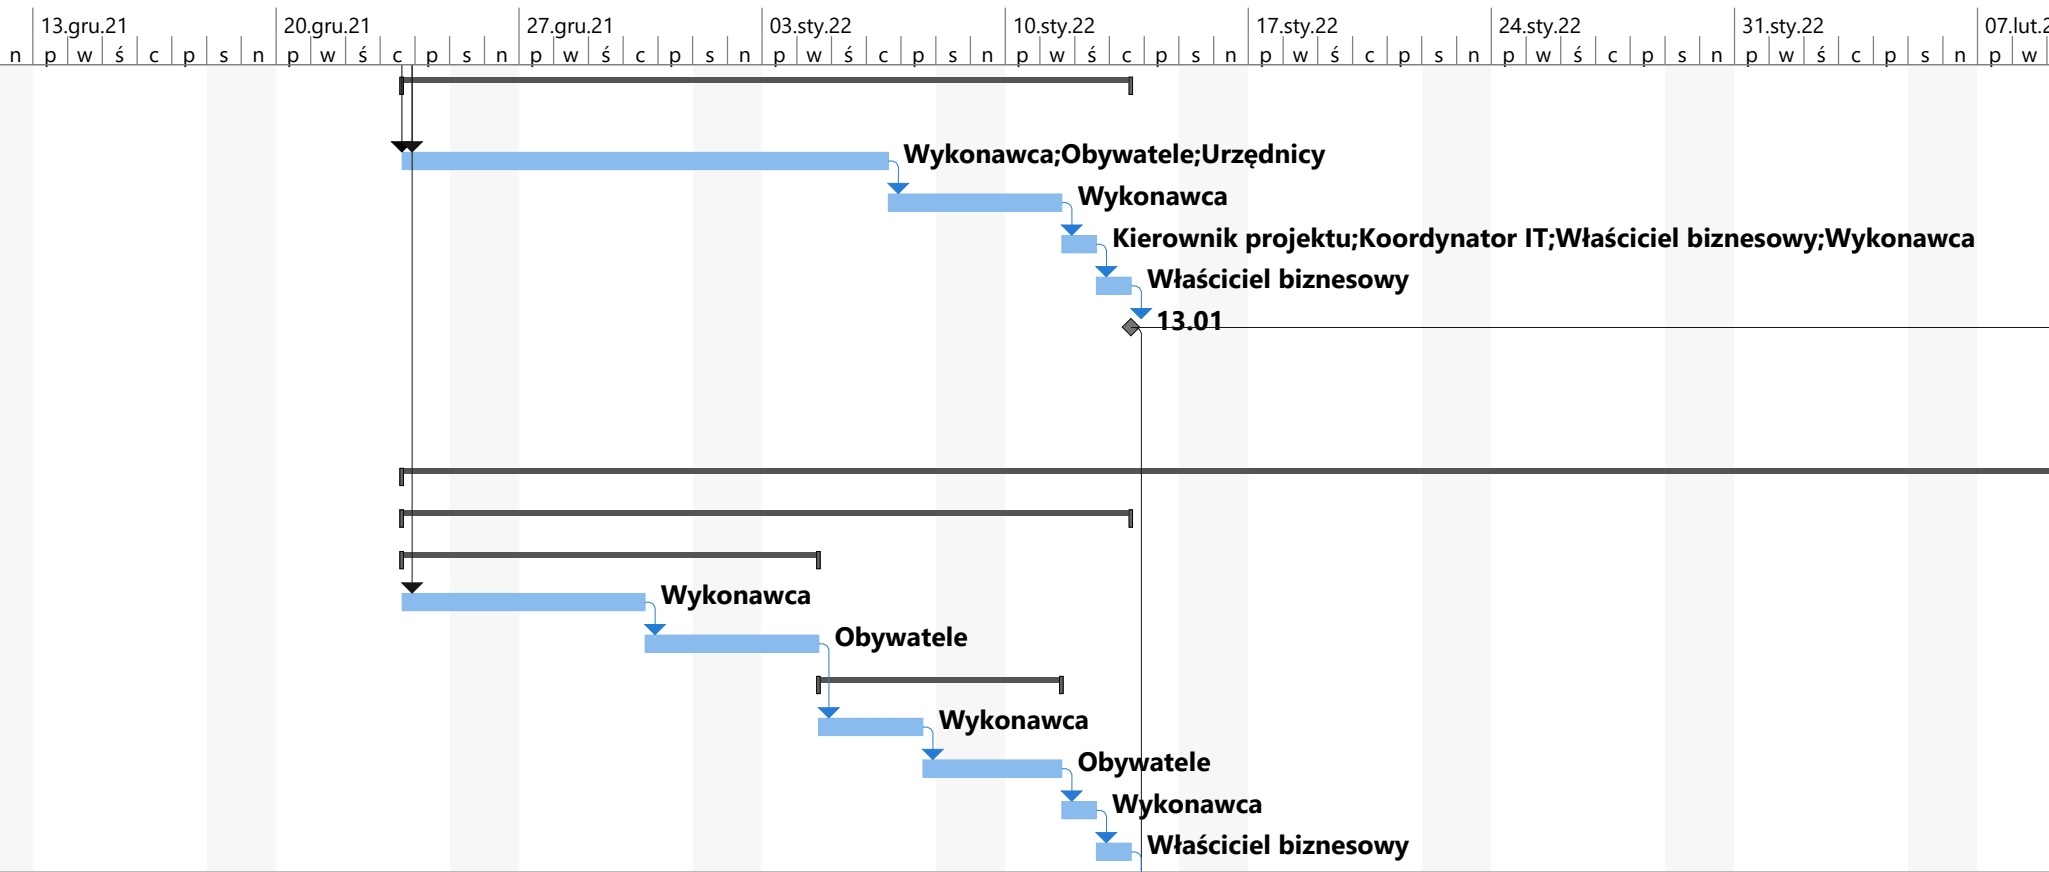


Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

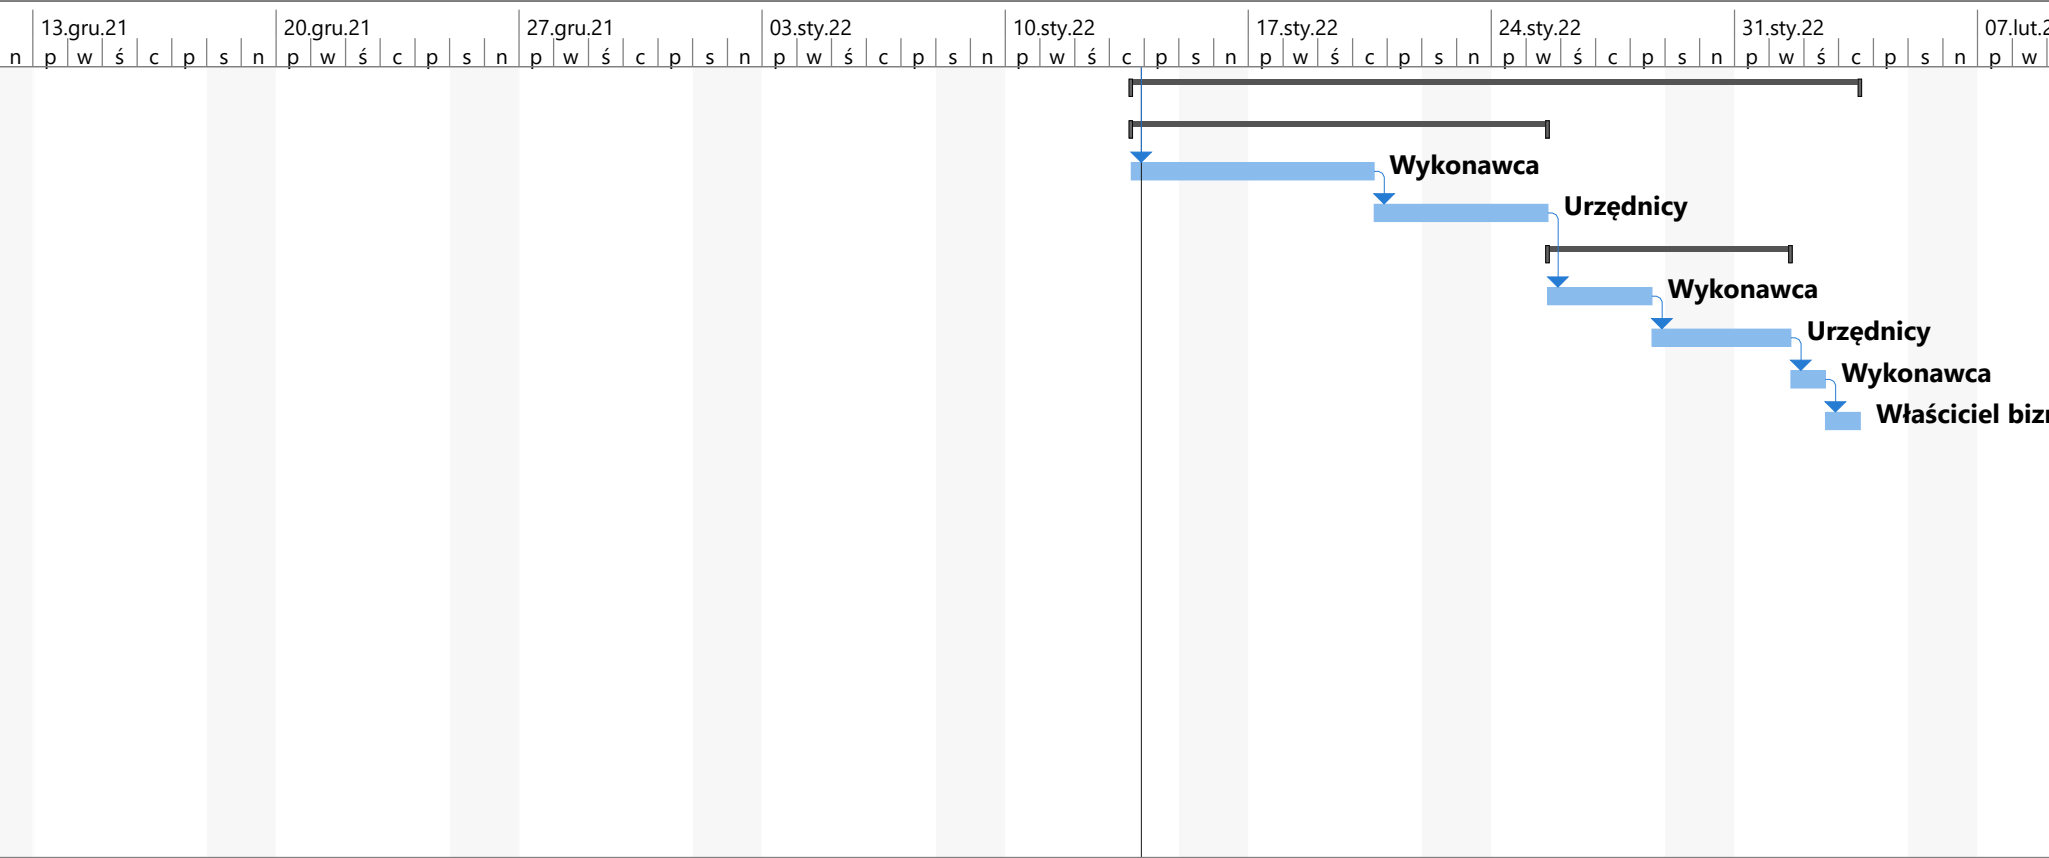

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

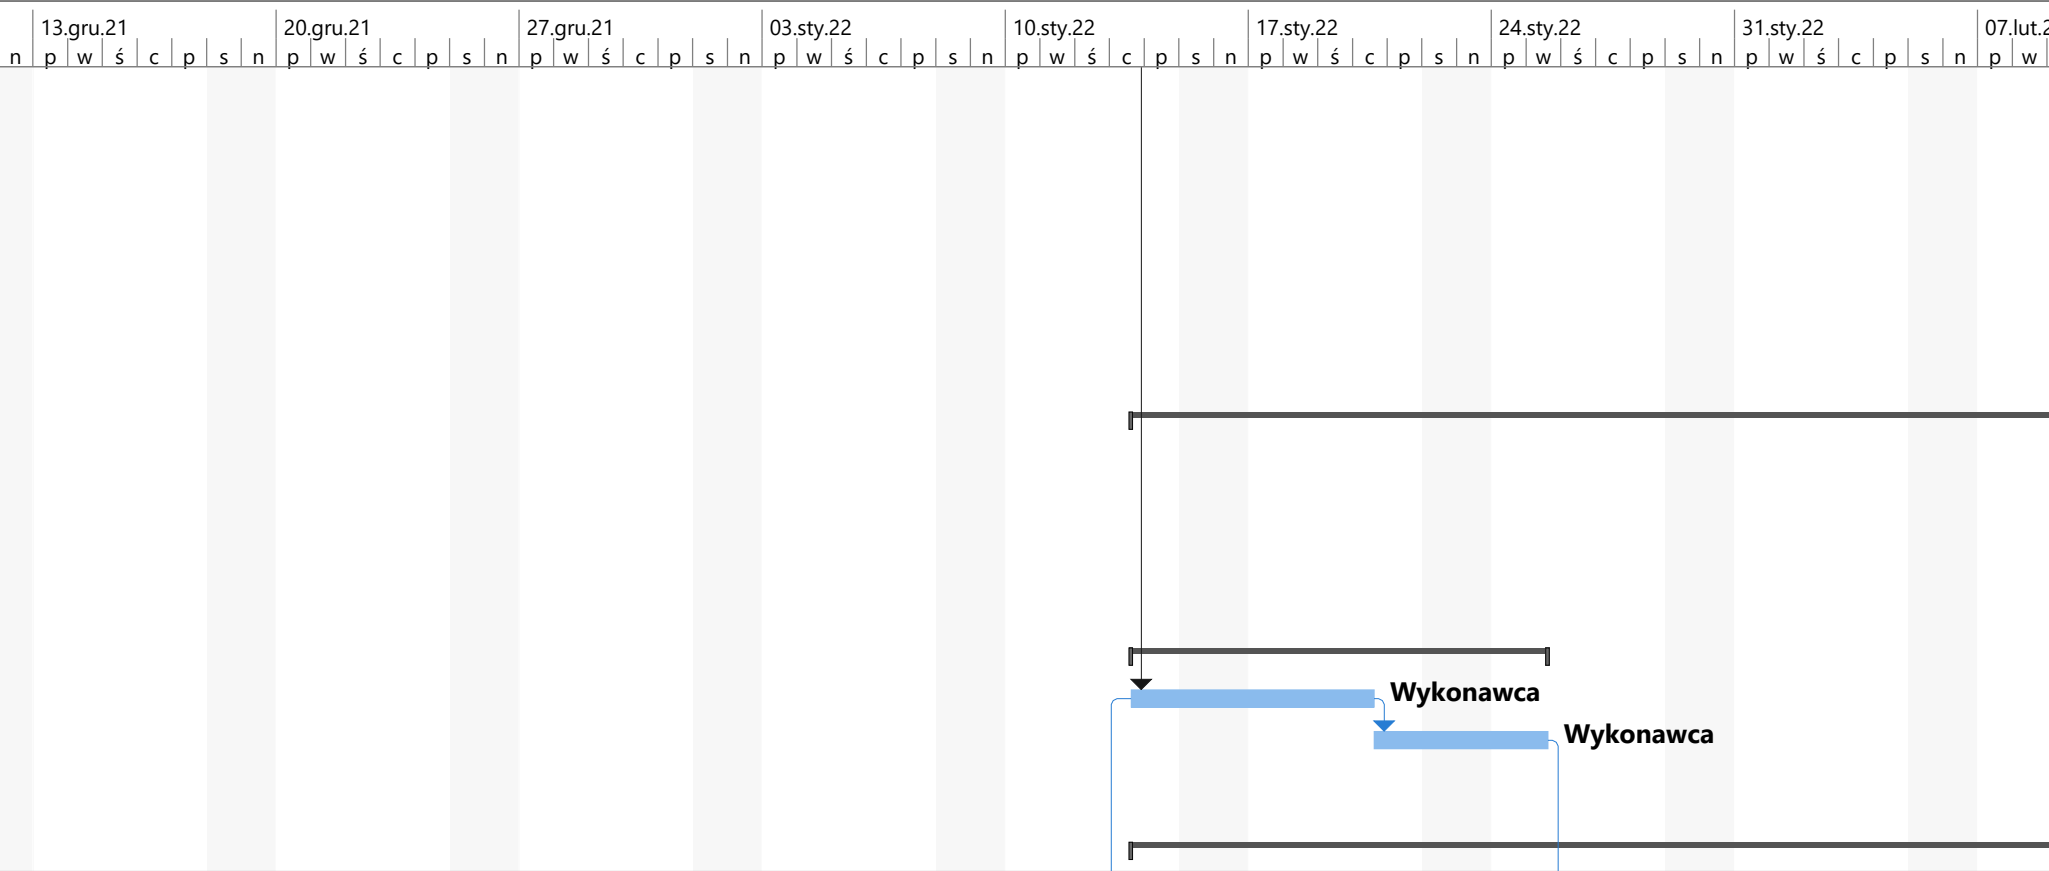

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

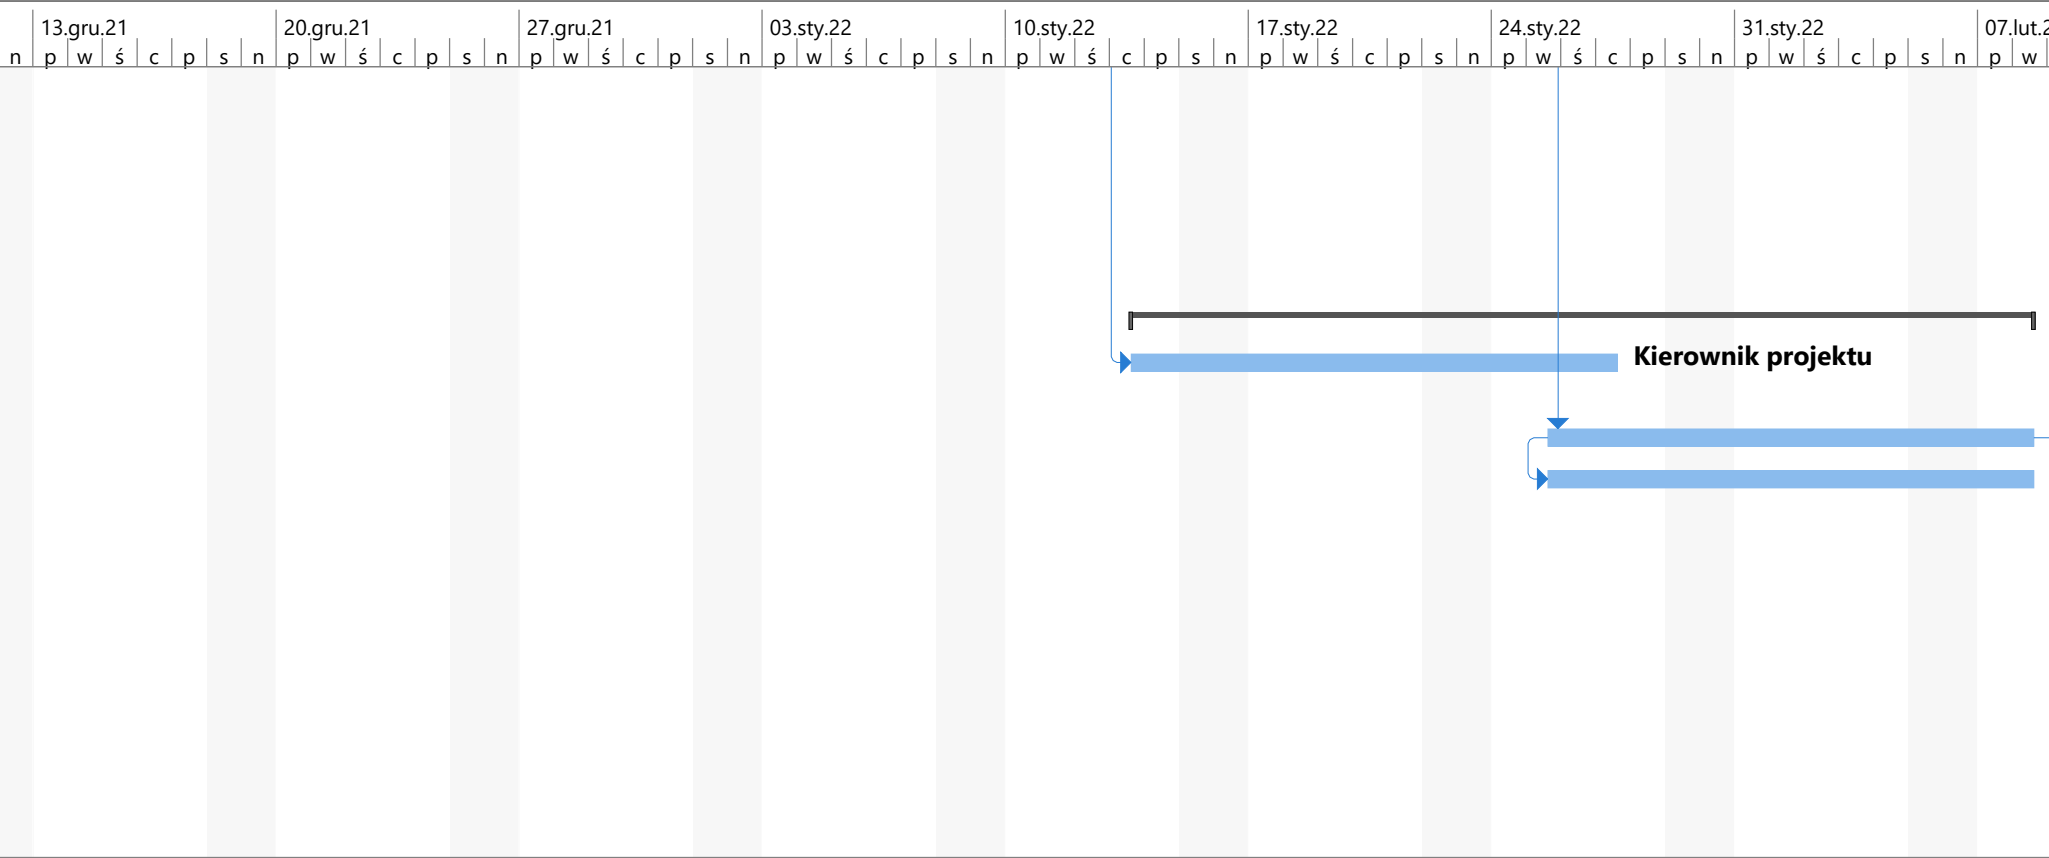


Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




<div>Projekt: Projekt1</div> <div>Data: pią, 07.08.20</div>	Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>
	Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>
	Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>
	Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>
	Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>
	Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>
	Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>
	Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>
	Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>
	Tylko z czasem trwania	<div></div>		





Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			






Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			








Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			












Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			








Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			




Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



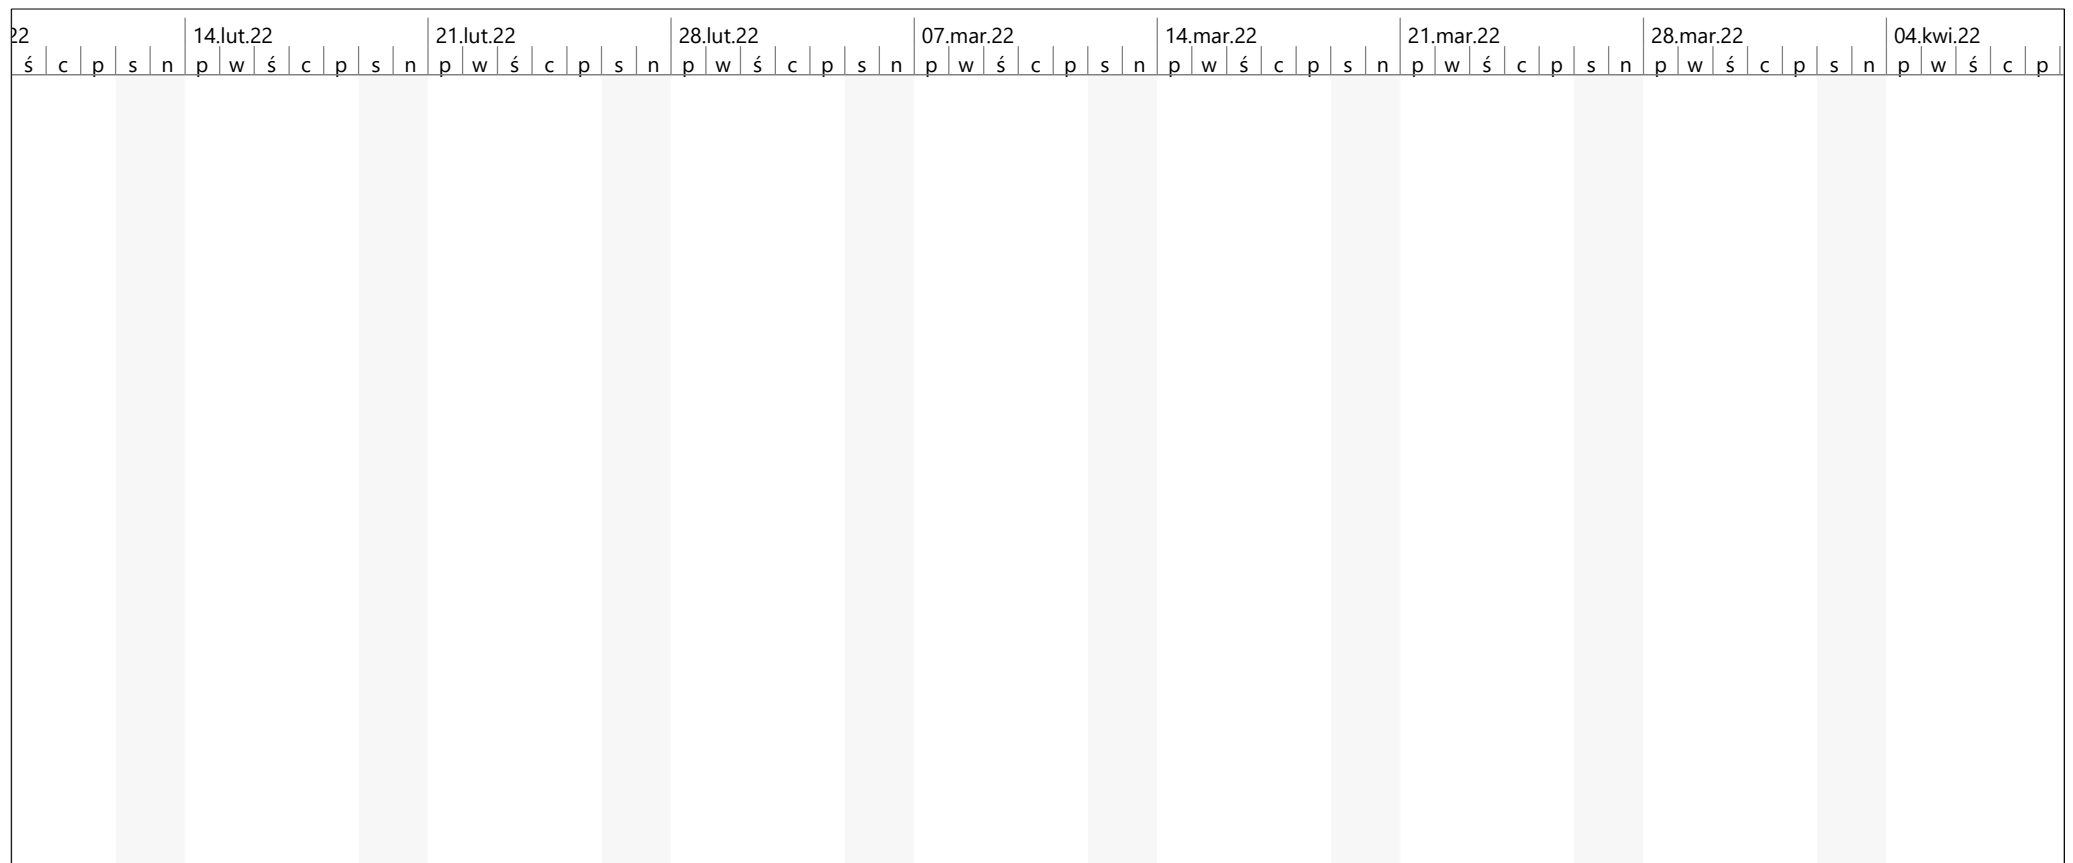



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

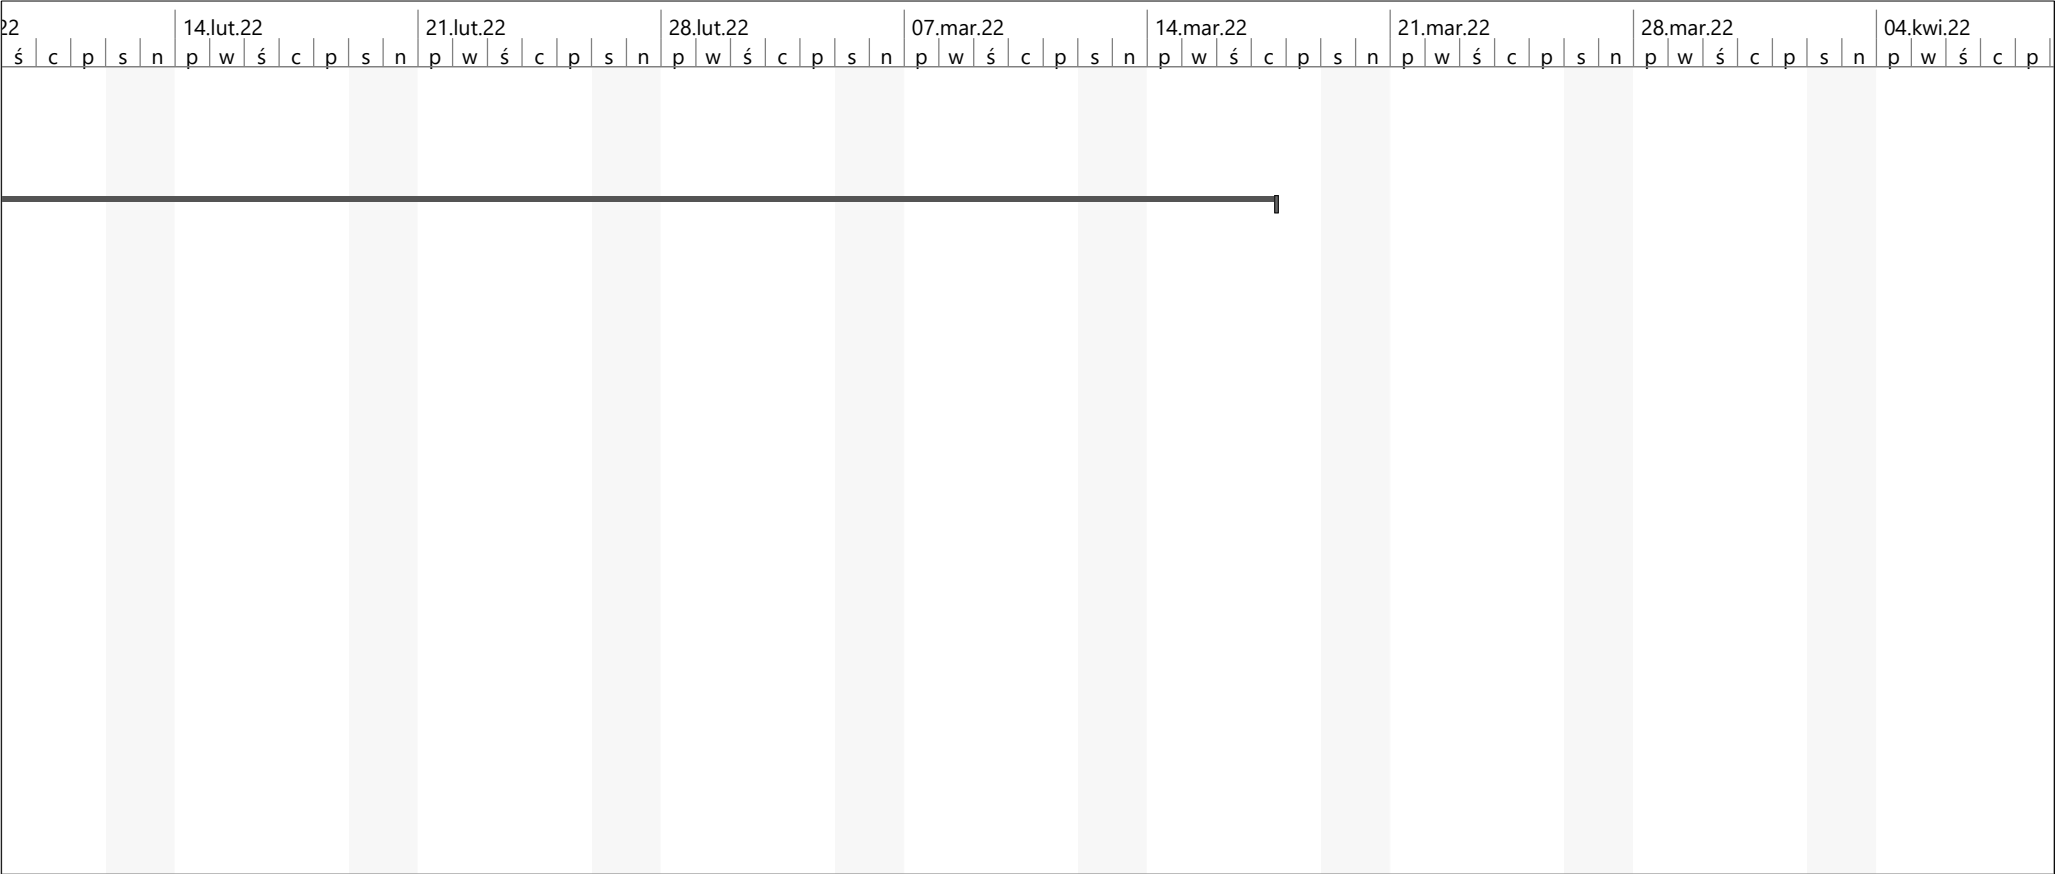

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			





Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



22

ś c p s n

14.lut.22

p w ś c p s n

21.lut.22

p w ś c p s n

28.lut.22

p w ś c p s n

07.mar.22

p w ś c p s n

14.mar.22

p w ś c p s n

21.mar.22

p w ś c p s n

28.mar.22


p w ś c p s n

04.kwi.22

p w ś c p

Projekt: Projekt1		Data: pią, 07.08.20	
Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			


Strona 393




Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			








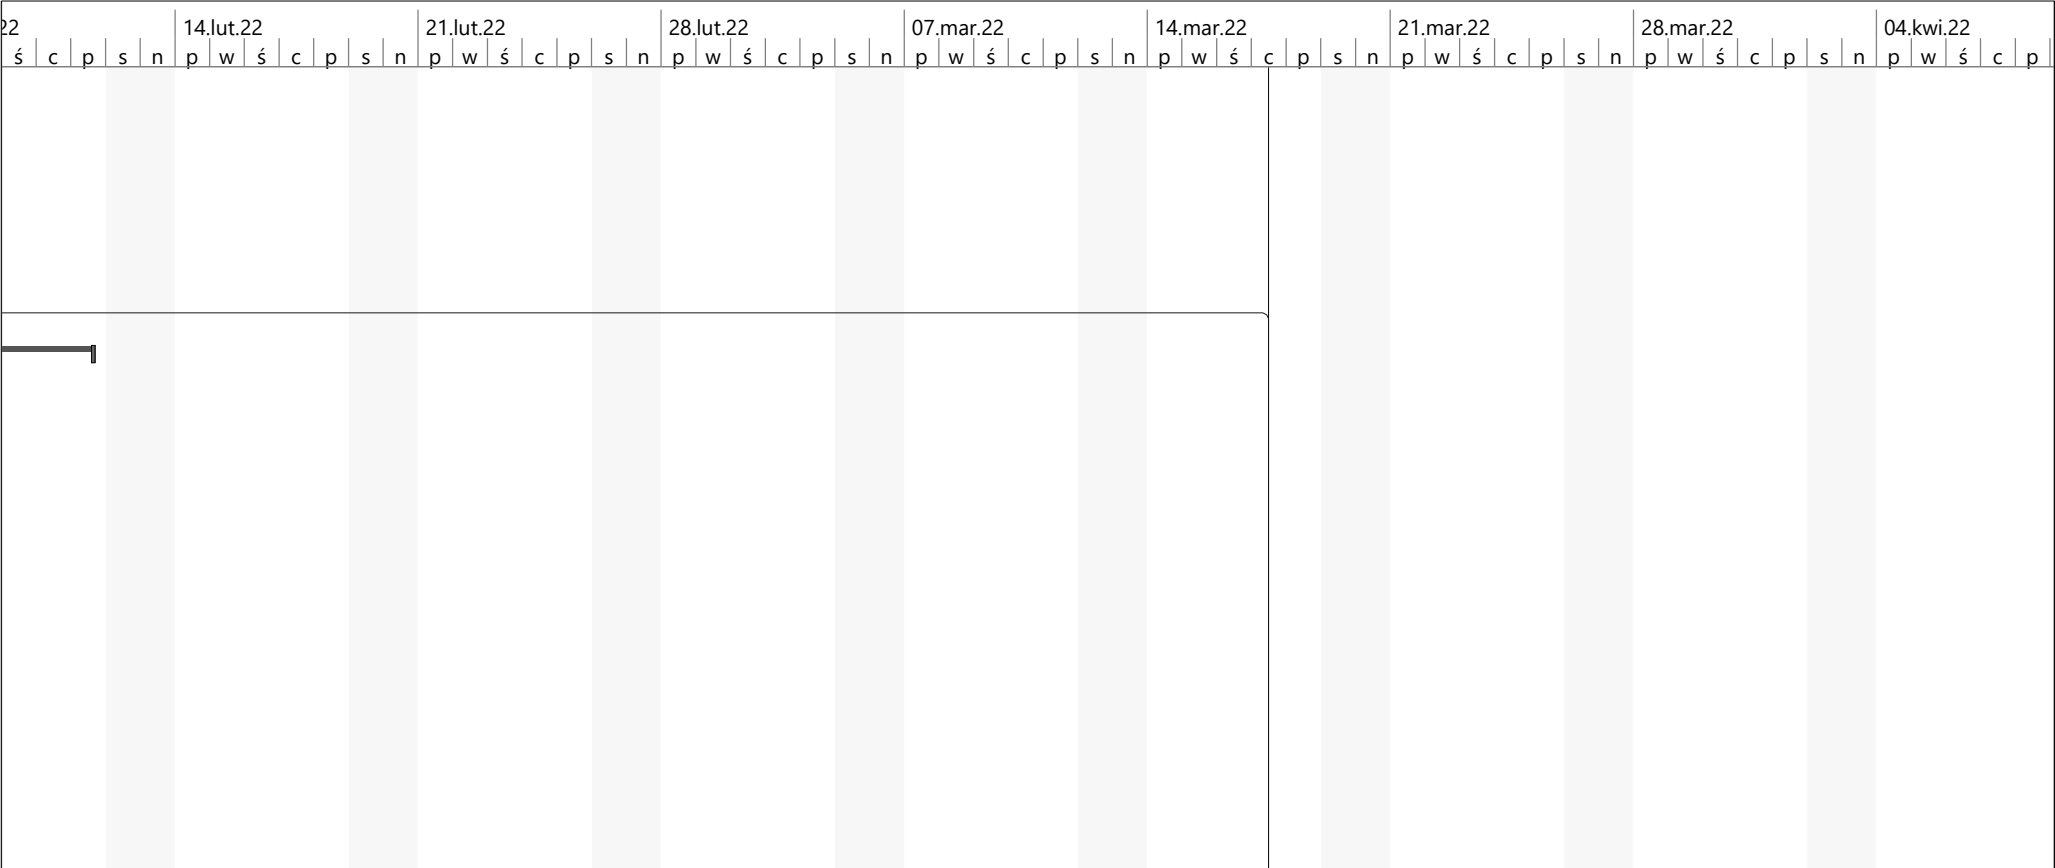

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

[illegible]

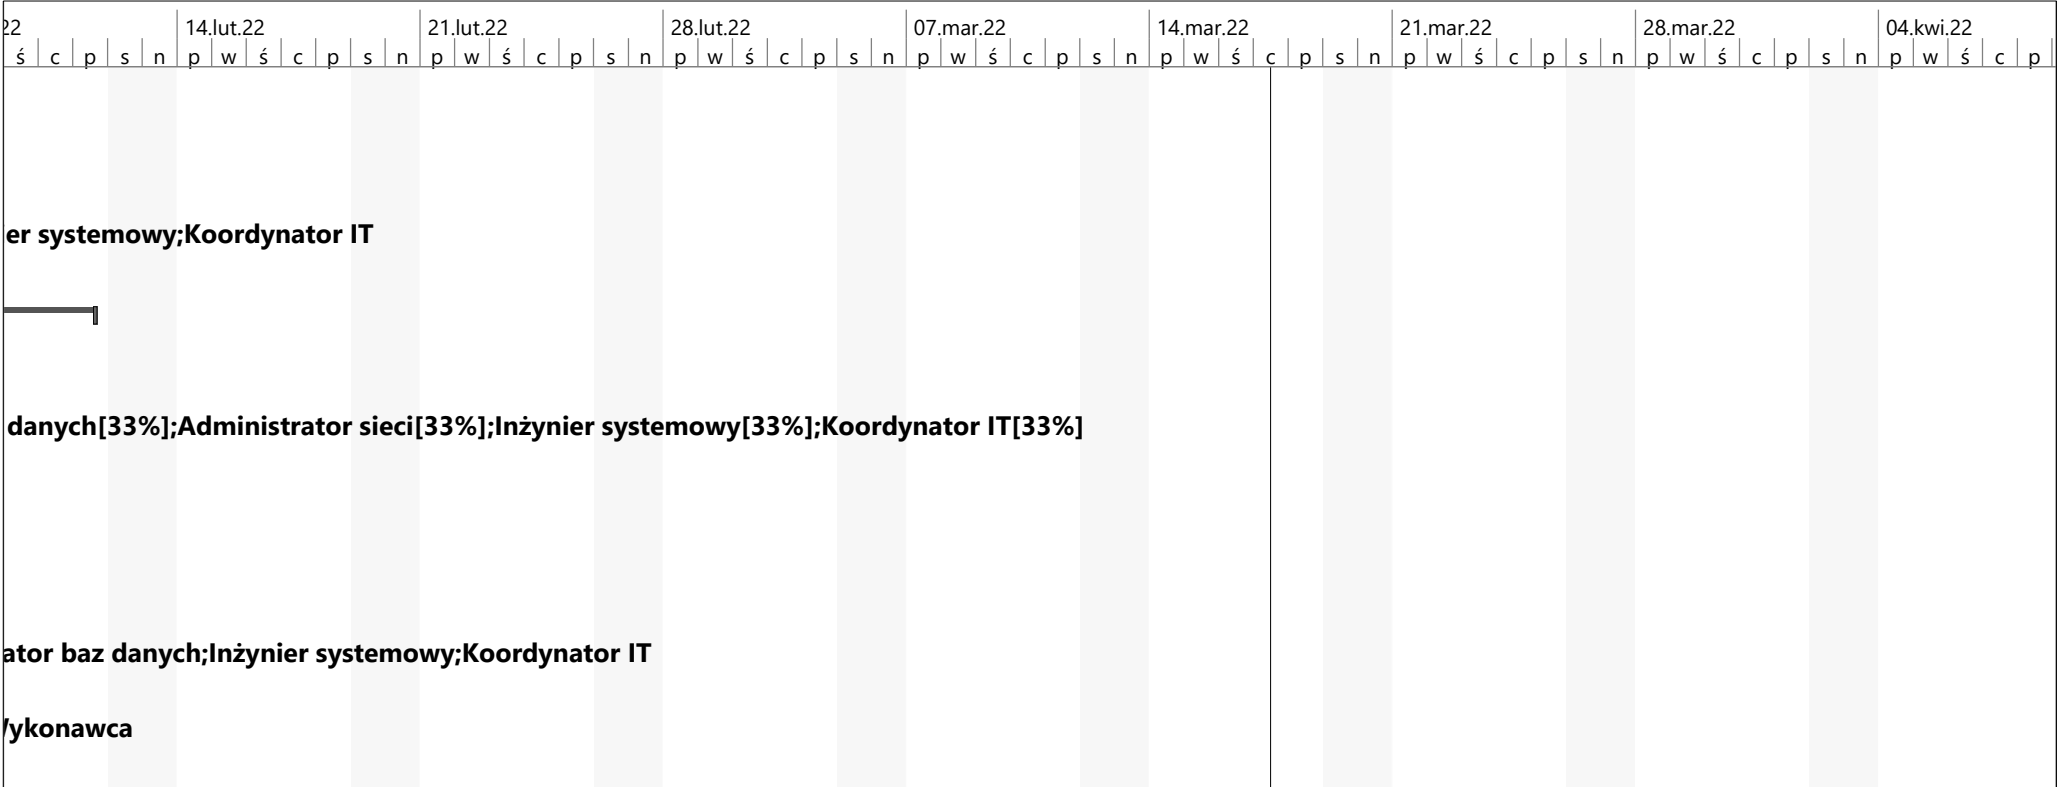


Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



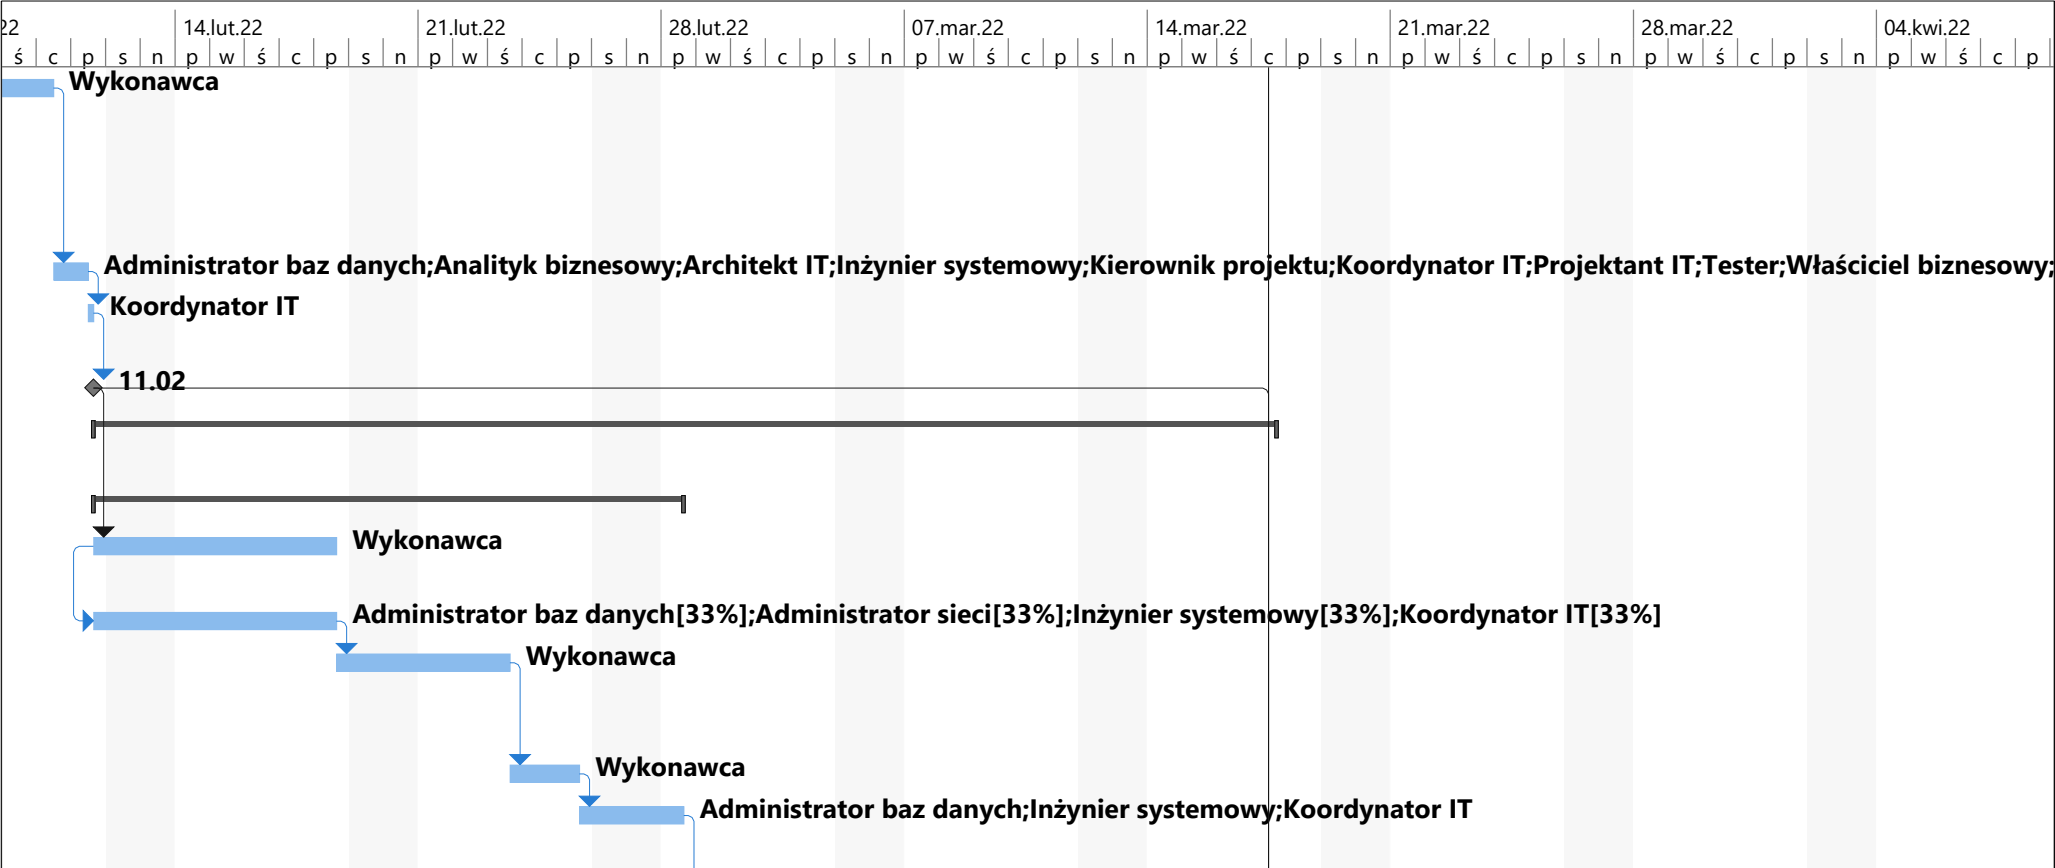

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

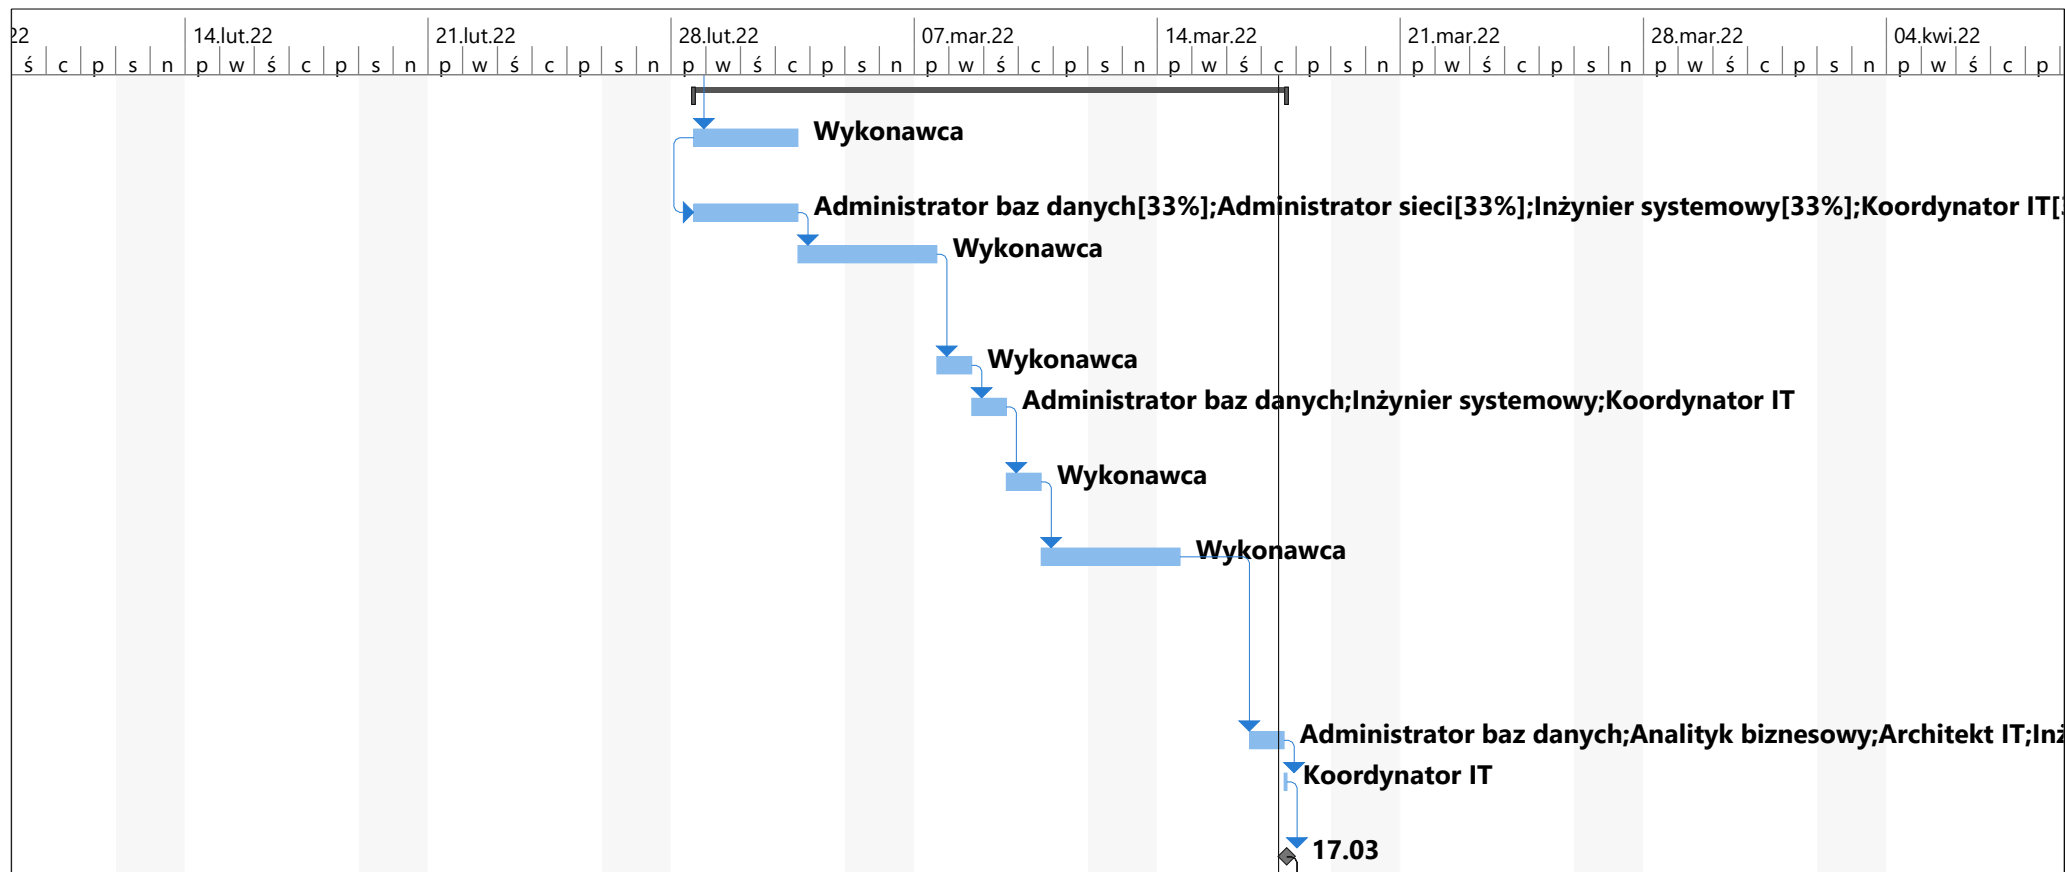


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			






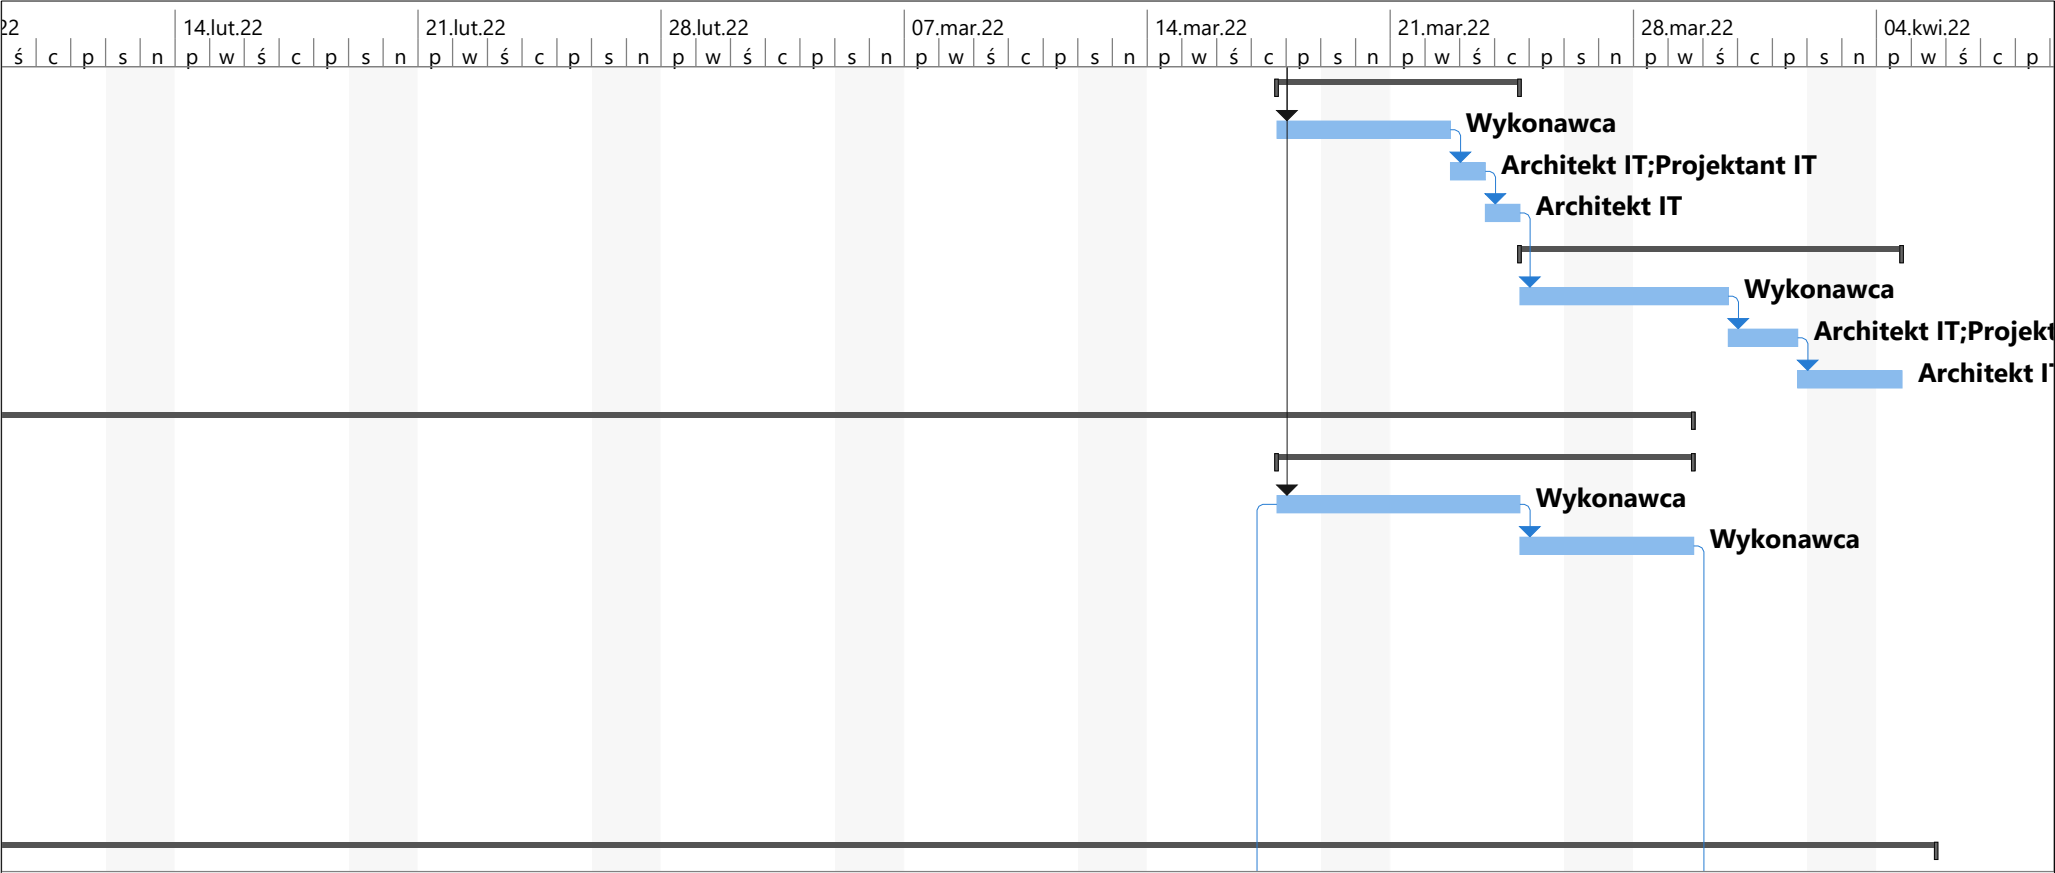


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

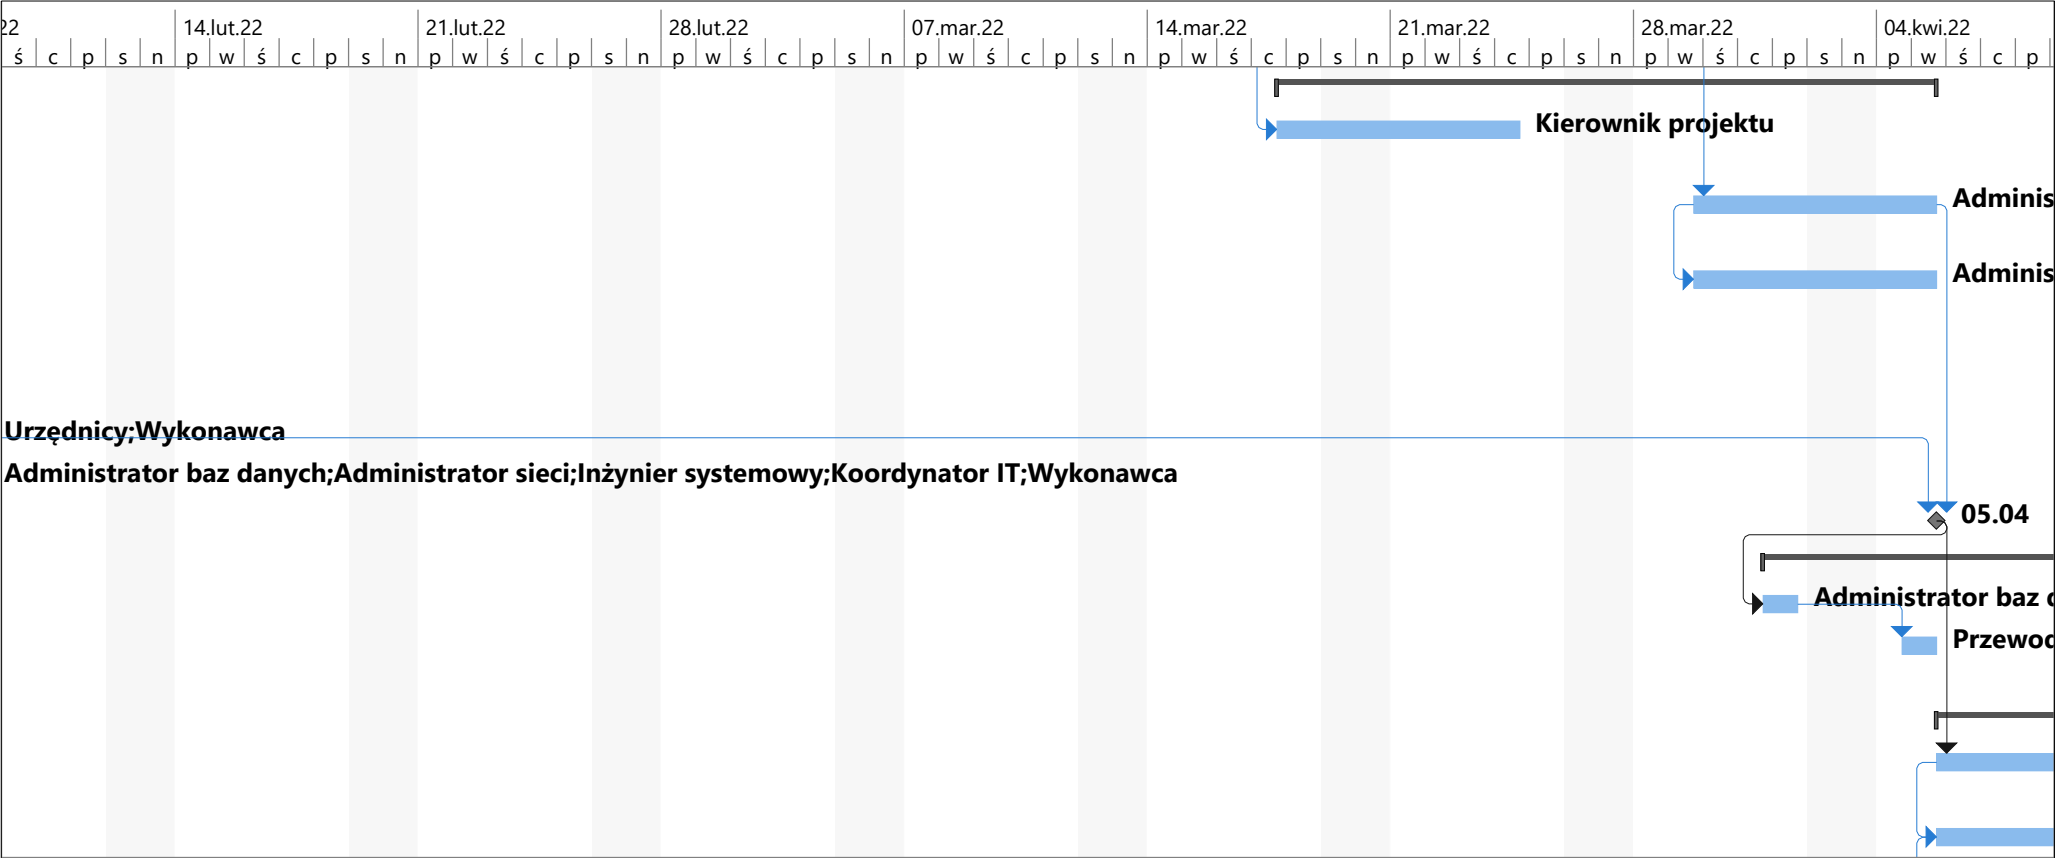


Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

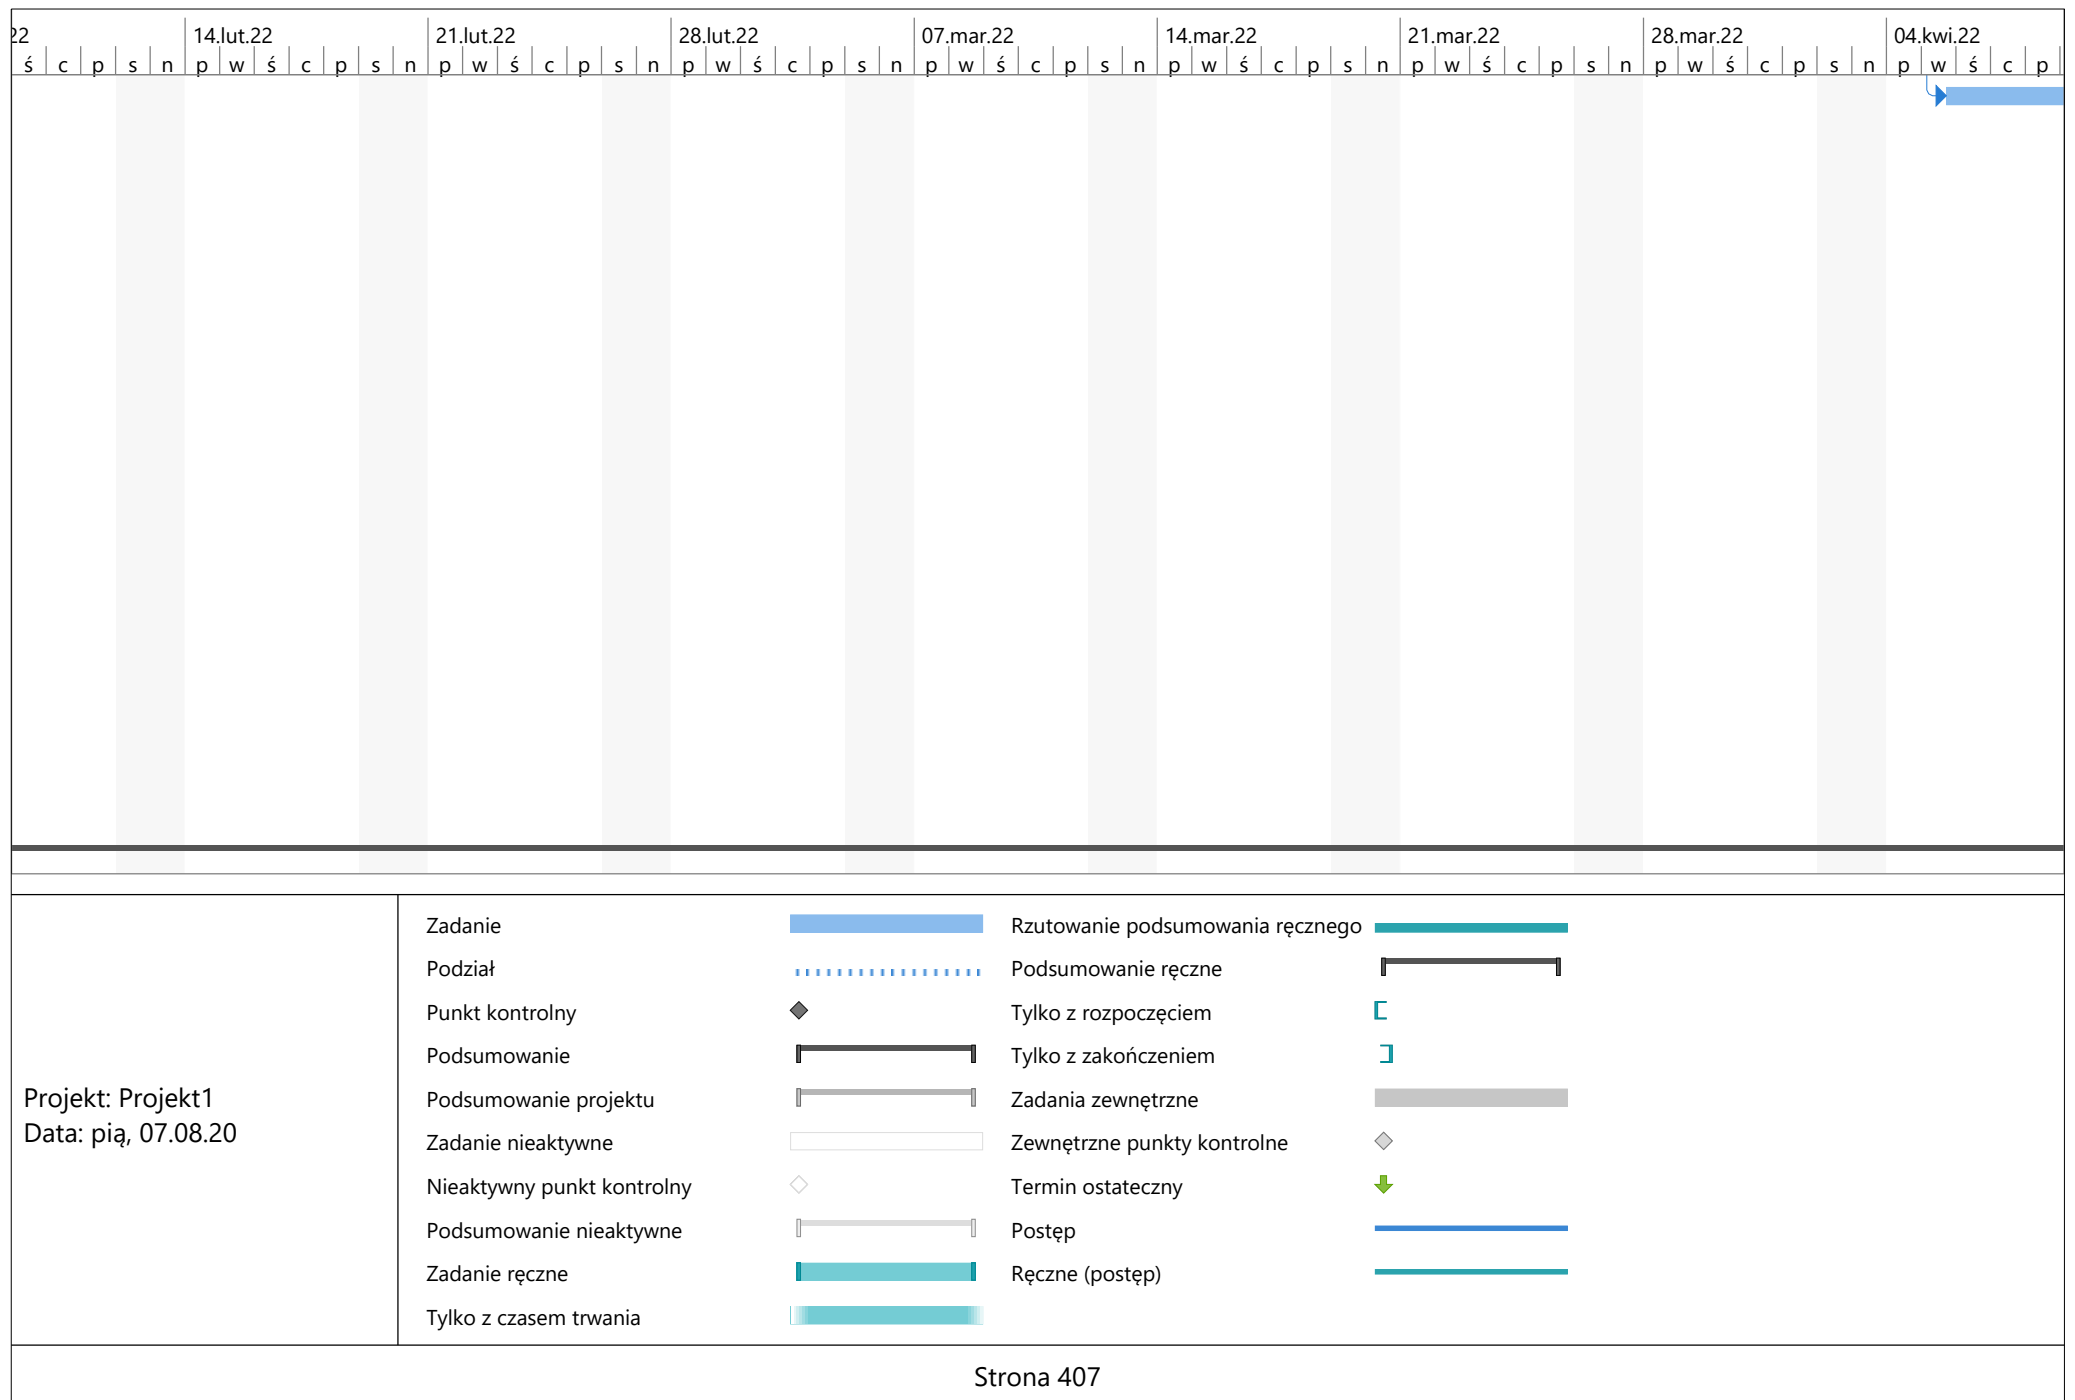







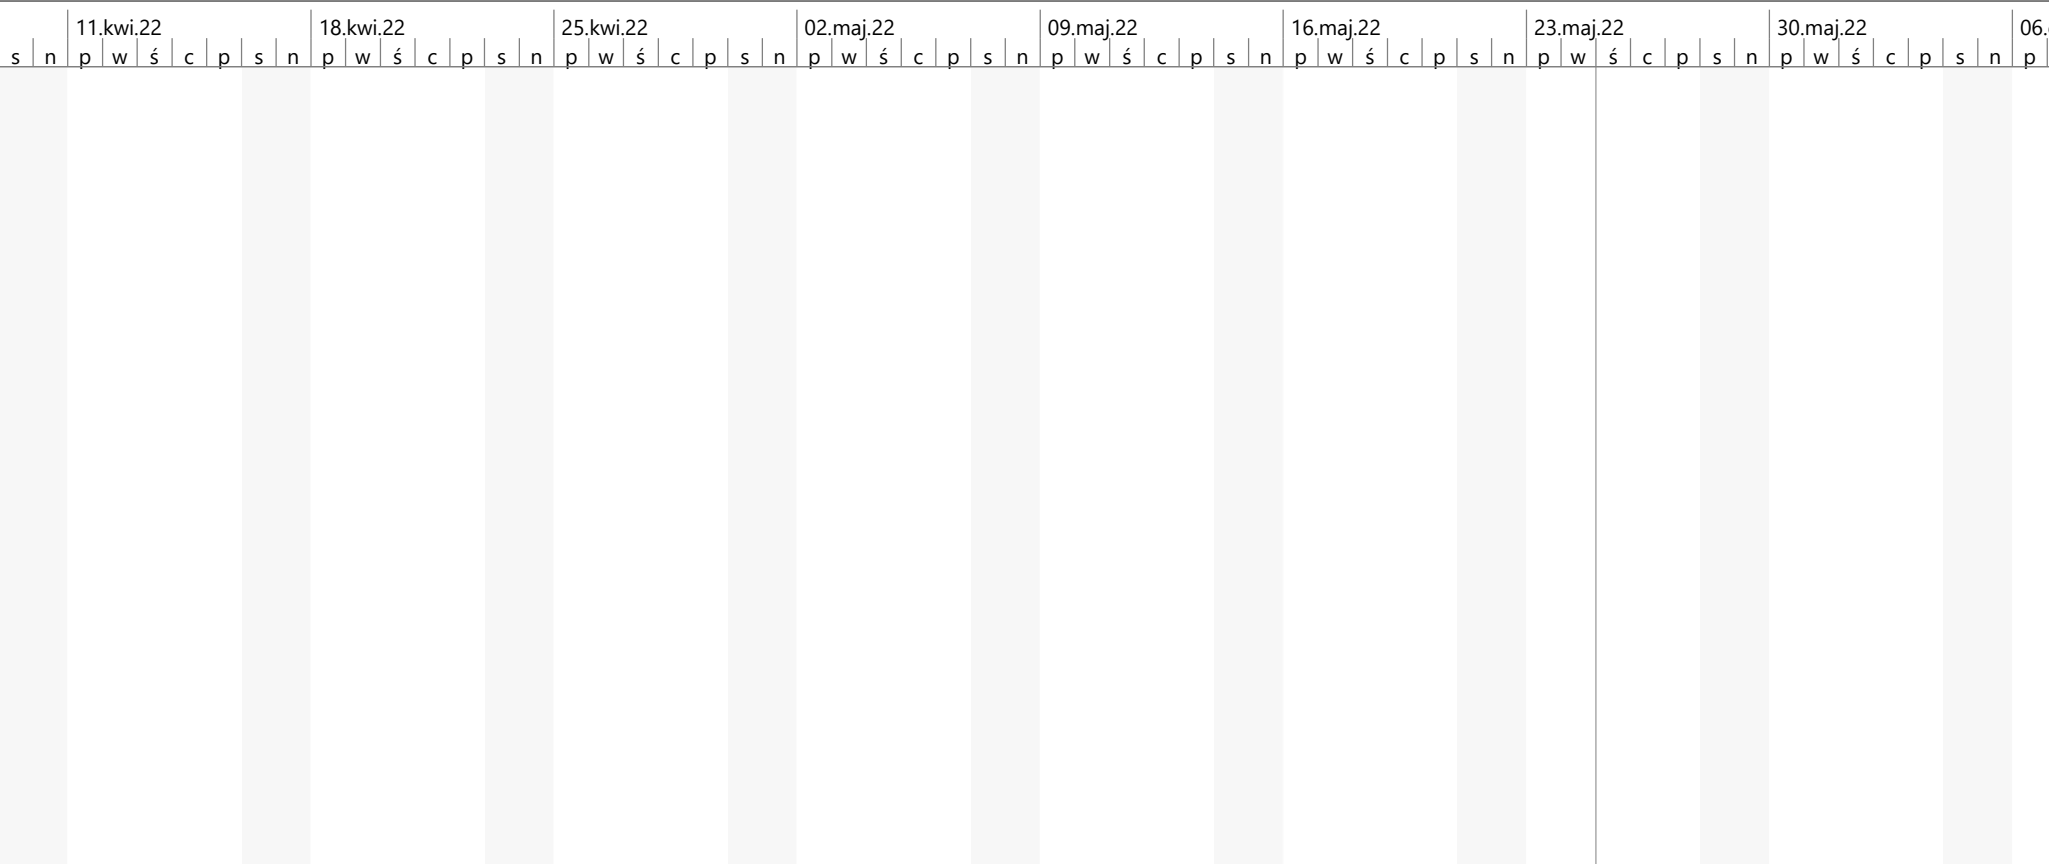

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne


Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny


Postęp

Ręczne (postęp)


Strona 410

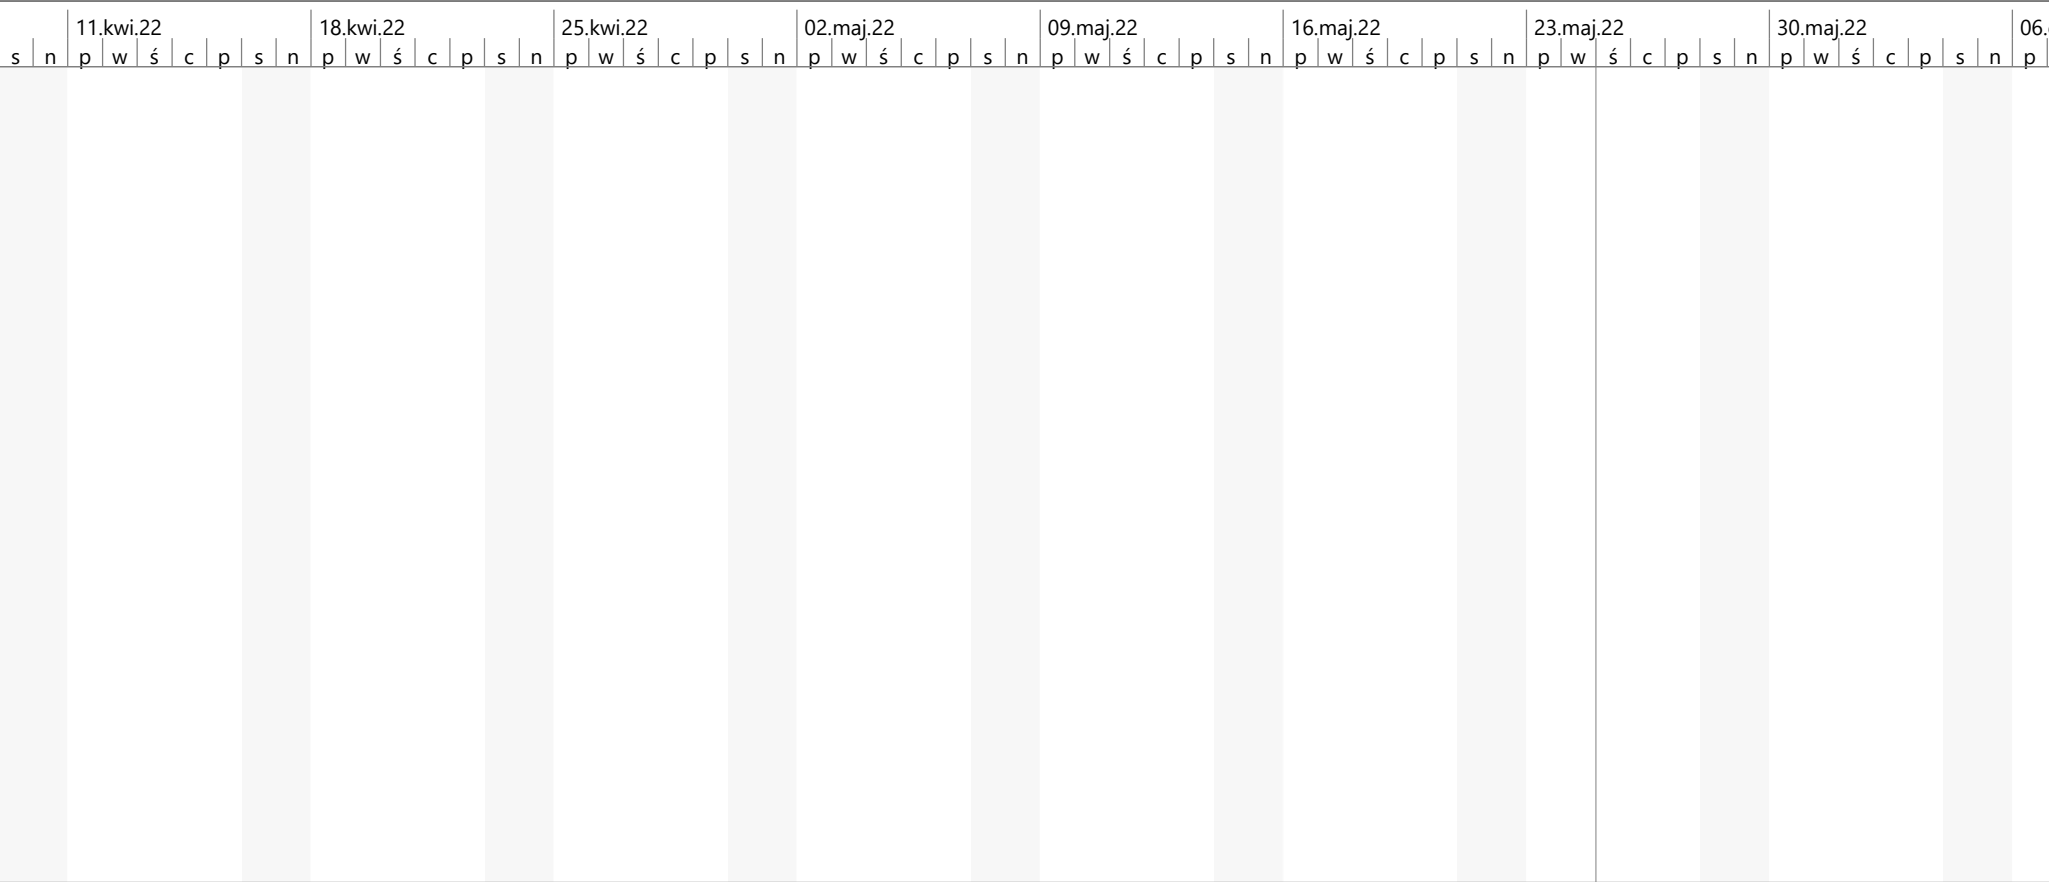

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

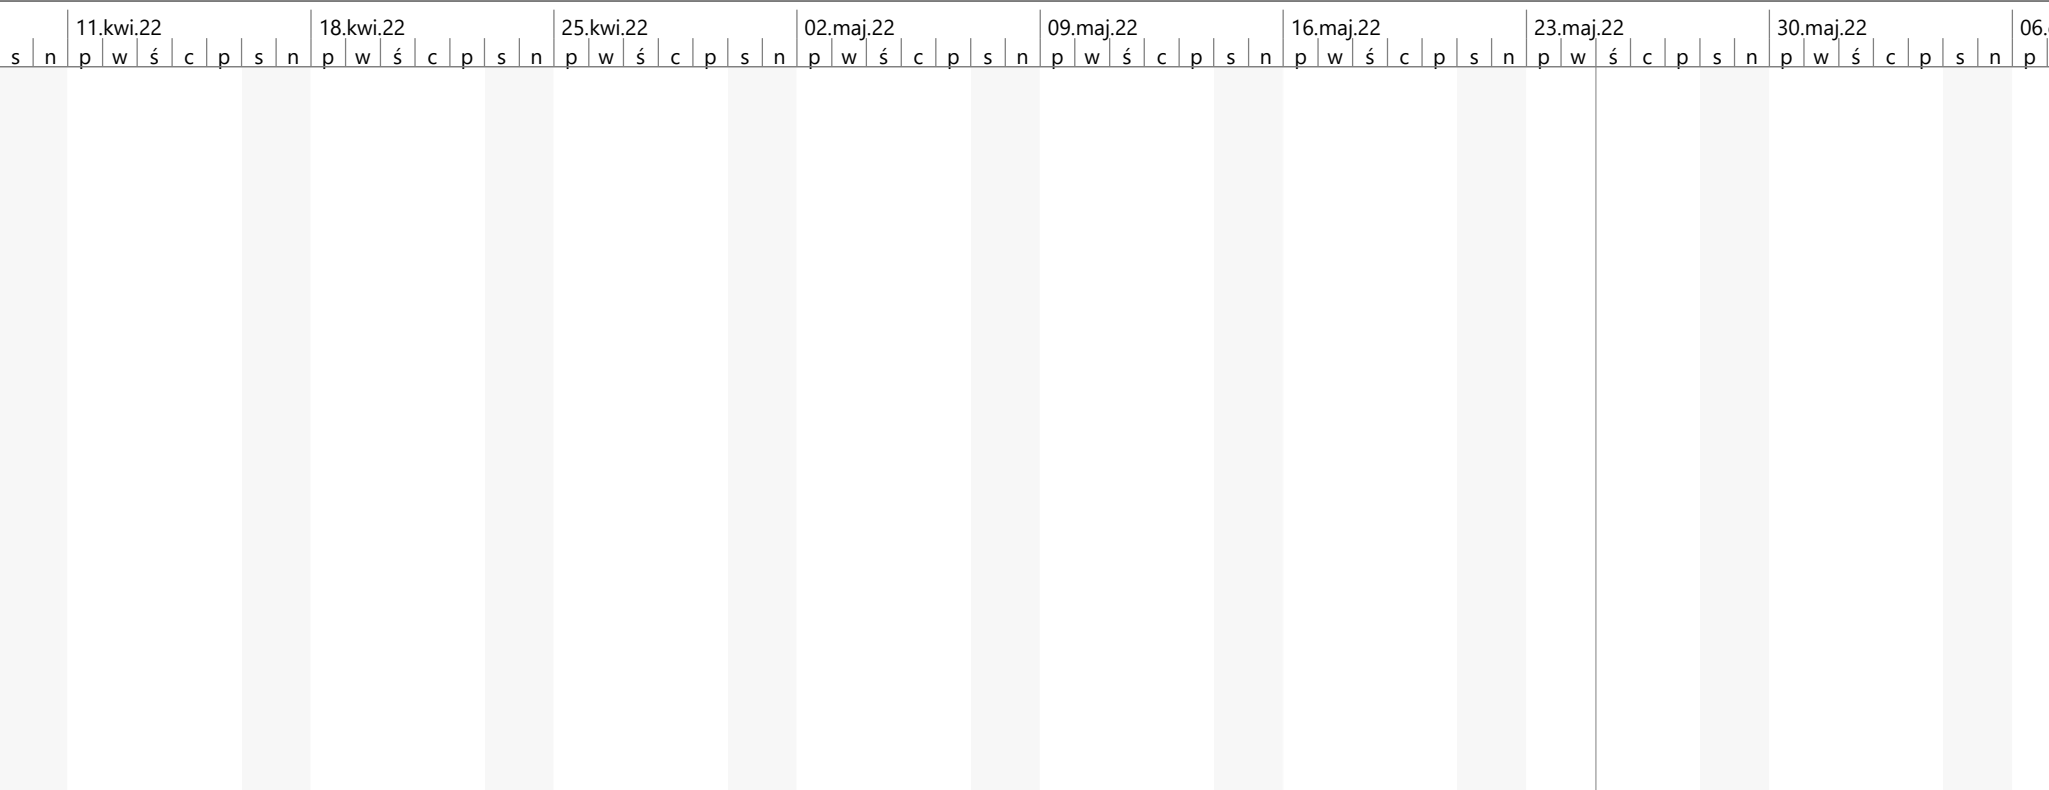


Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

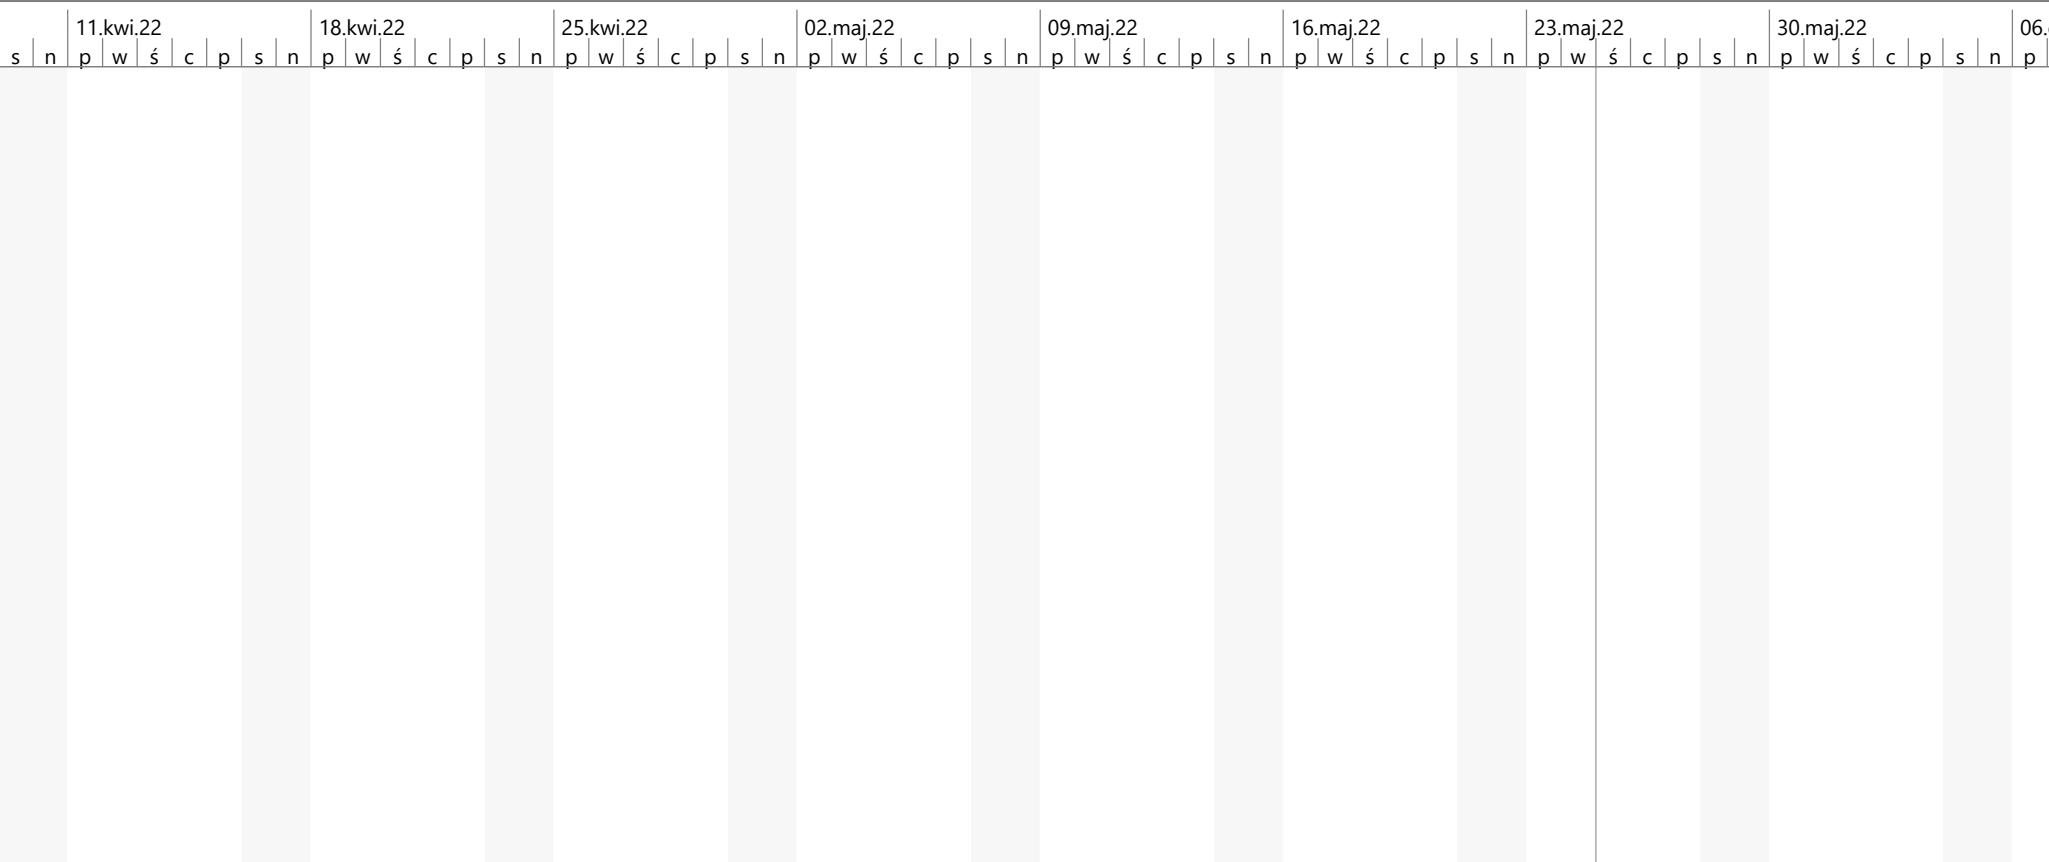






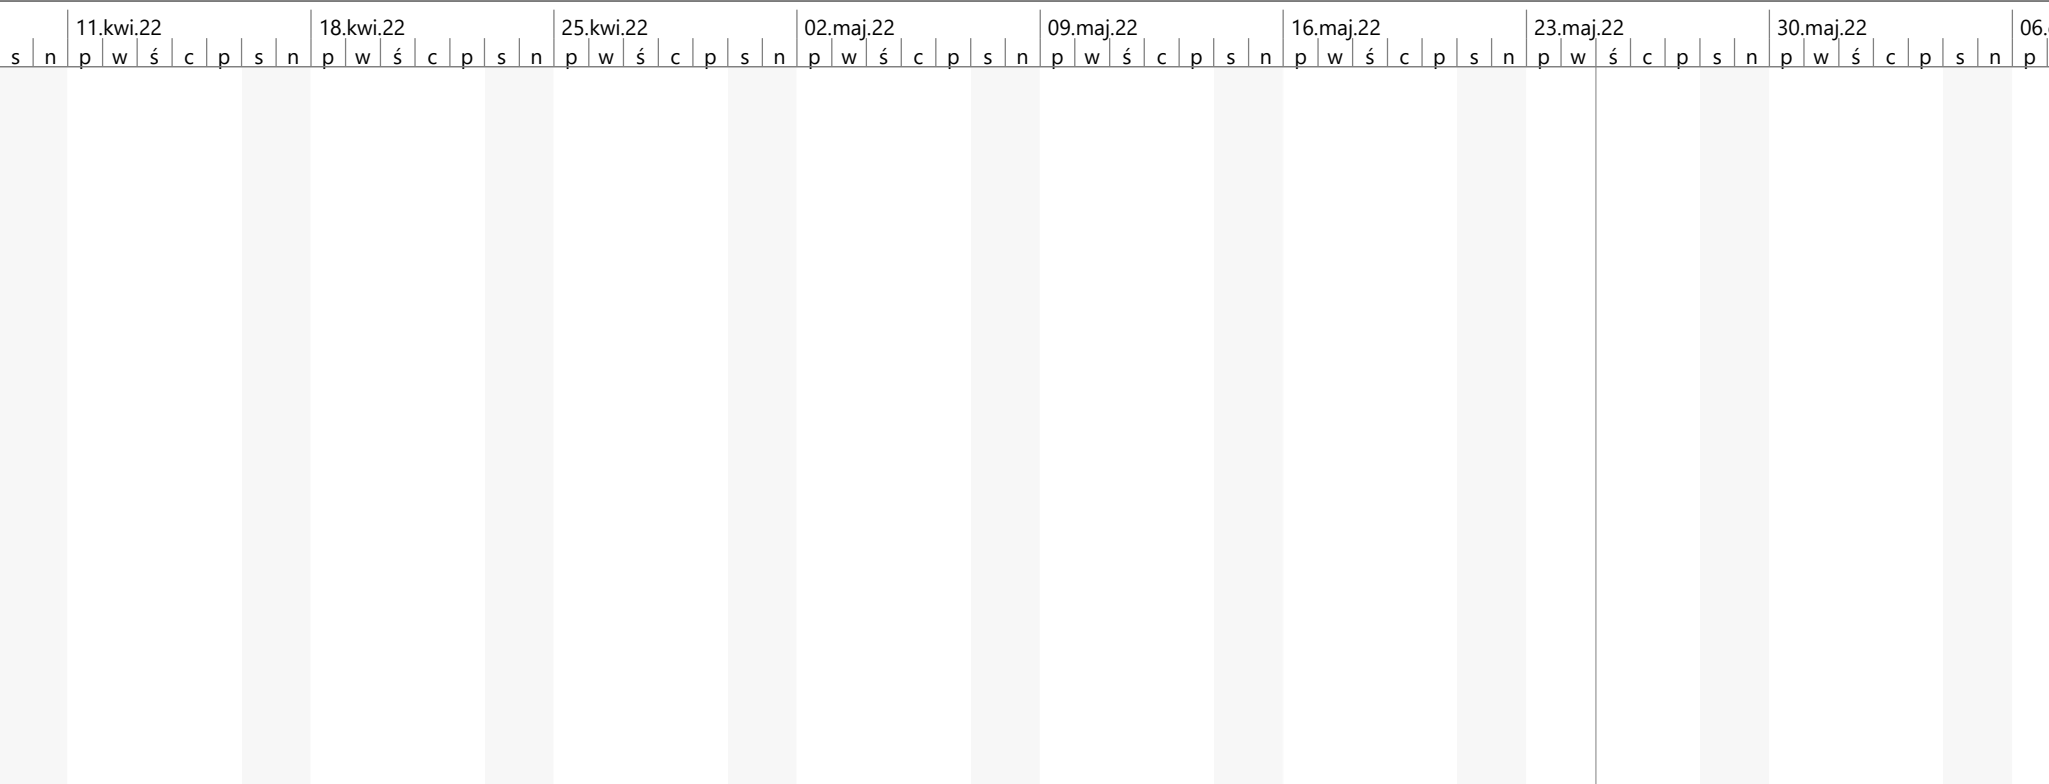



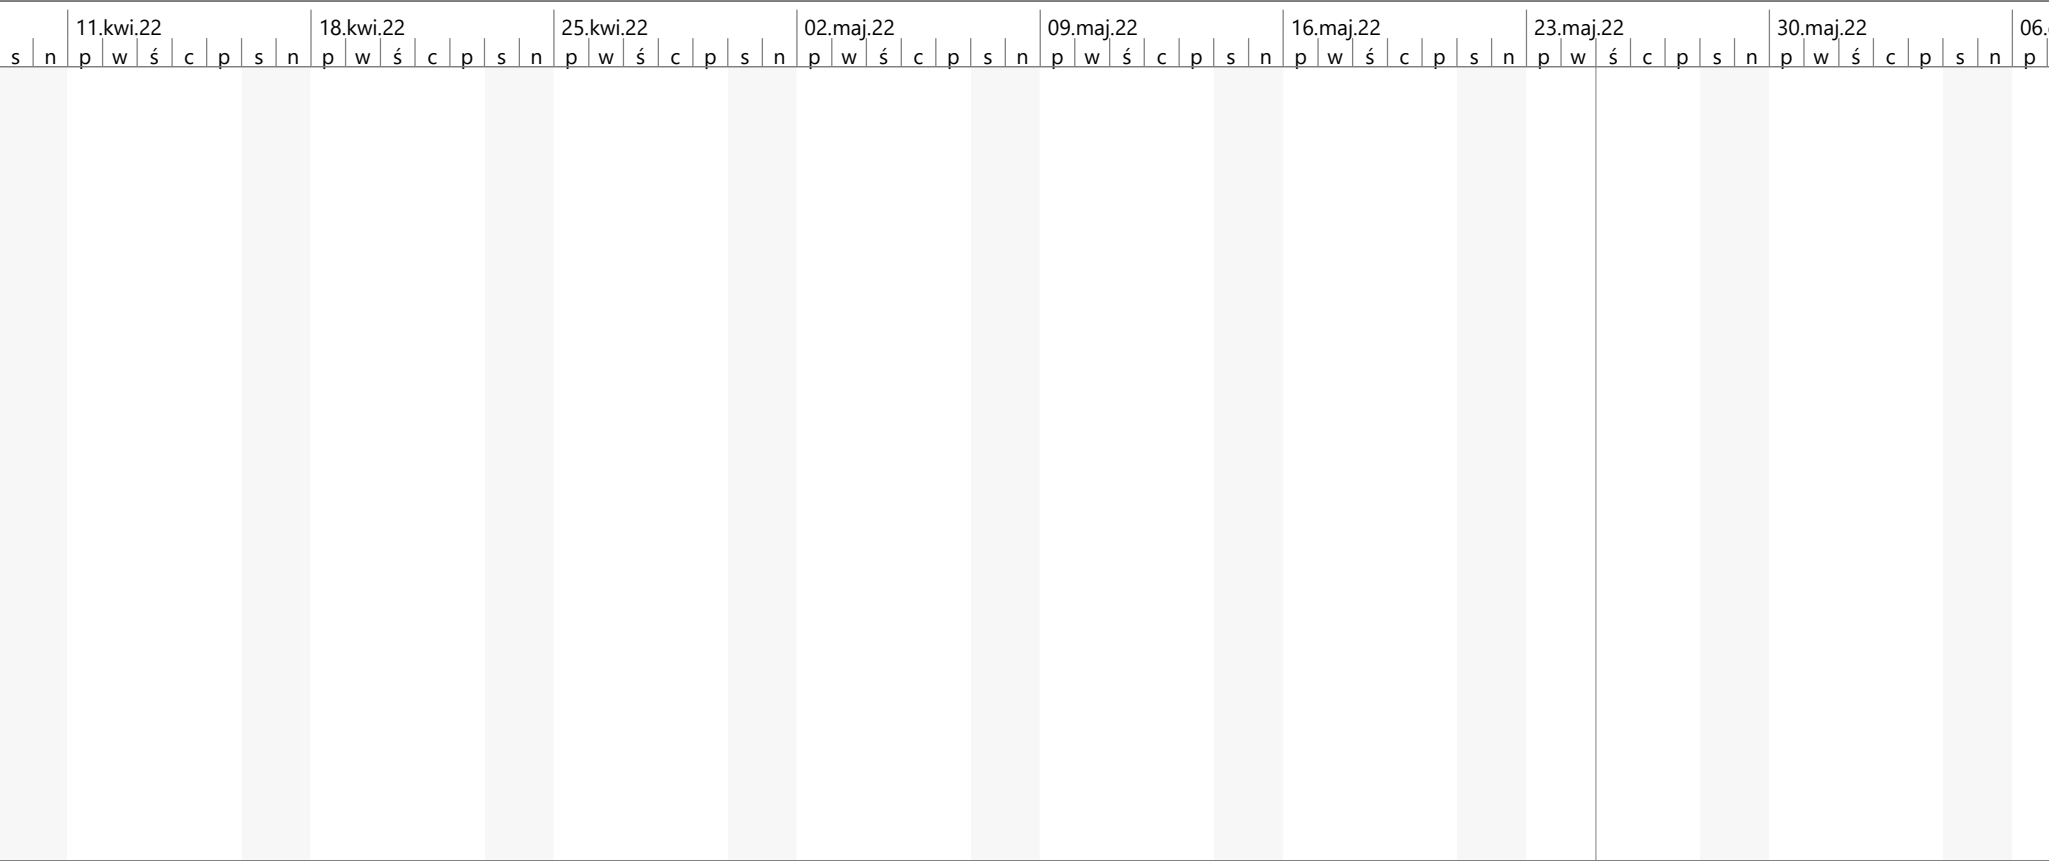










Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

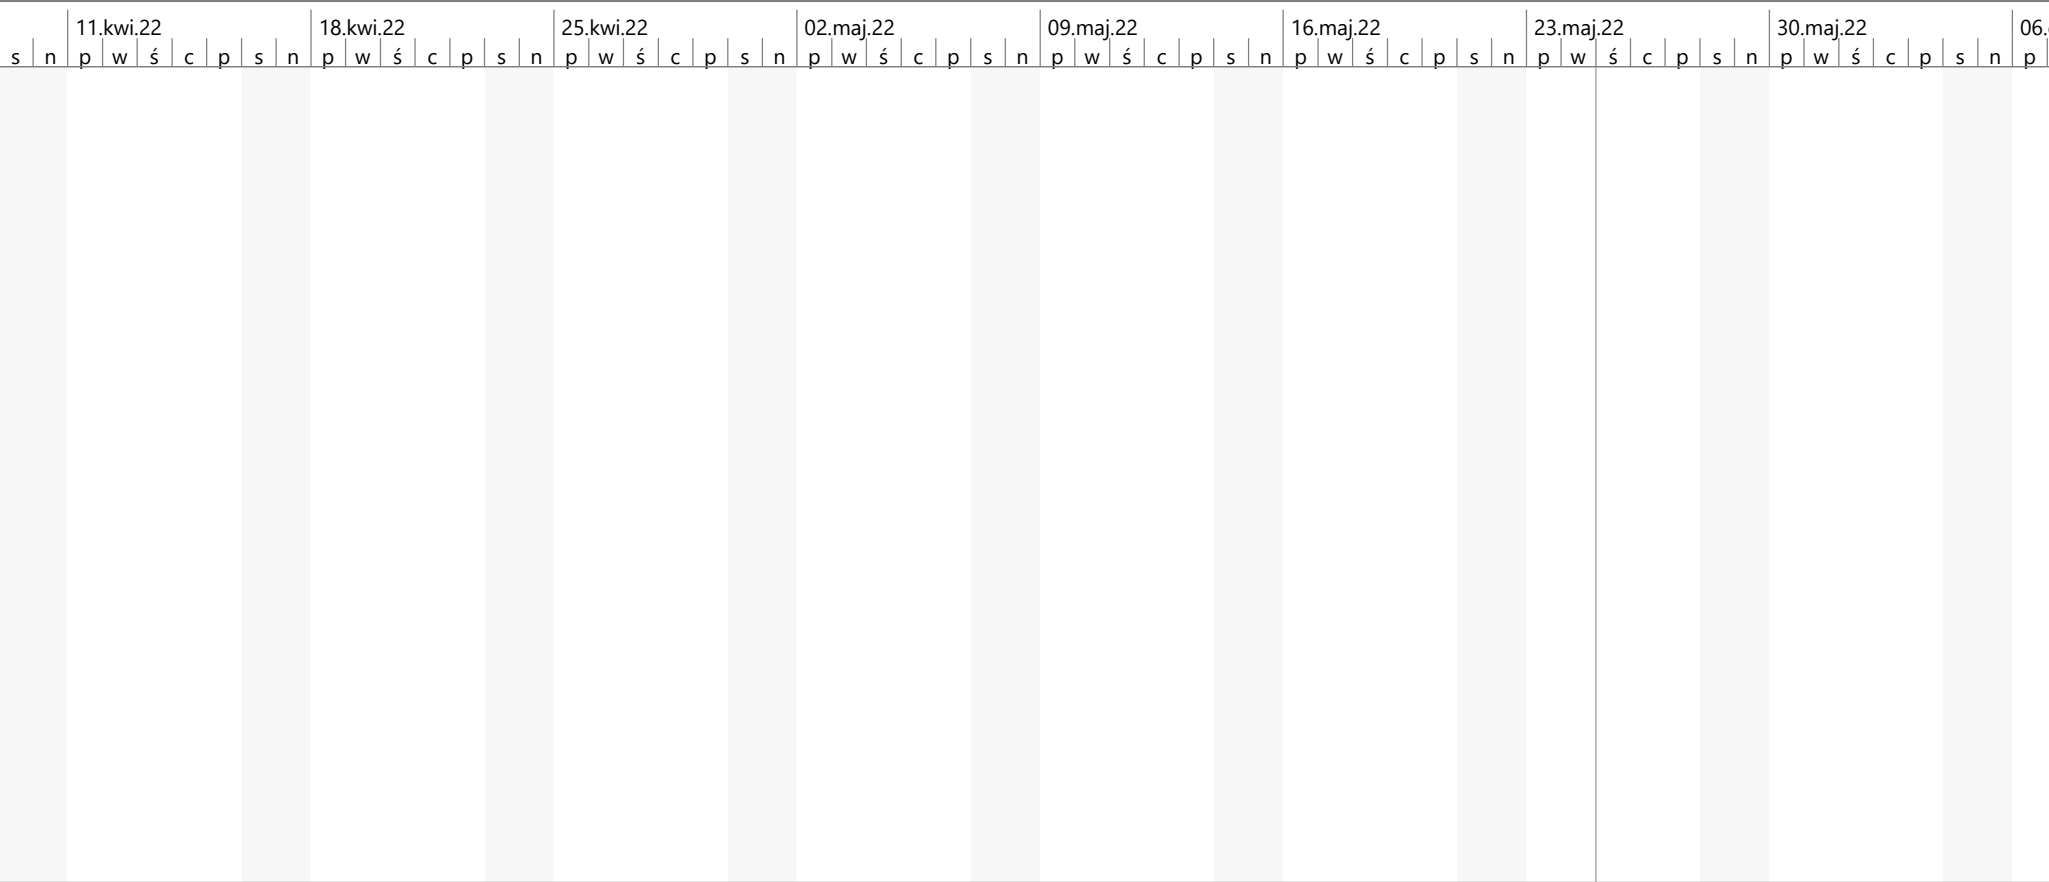

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



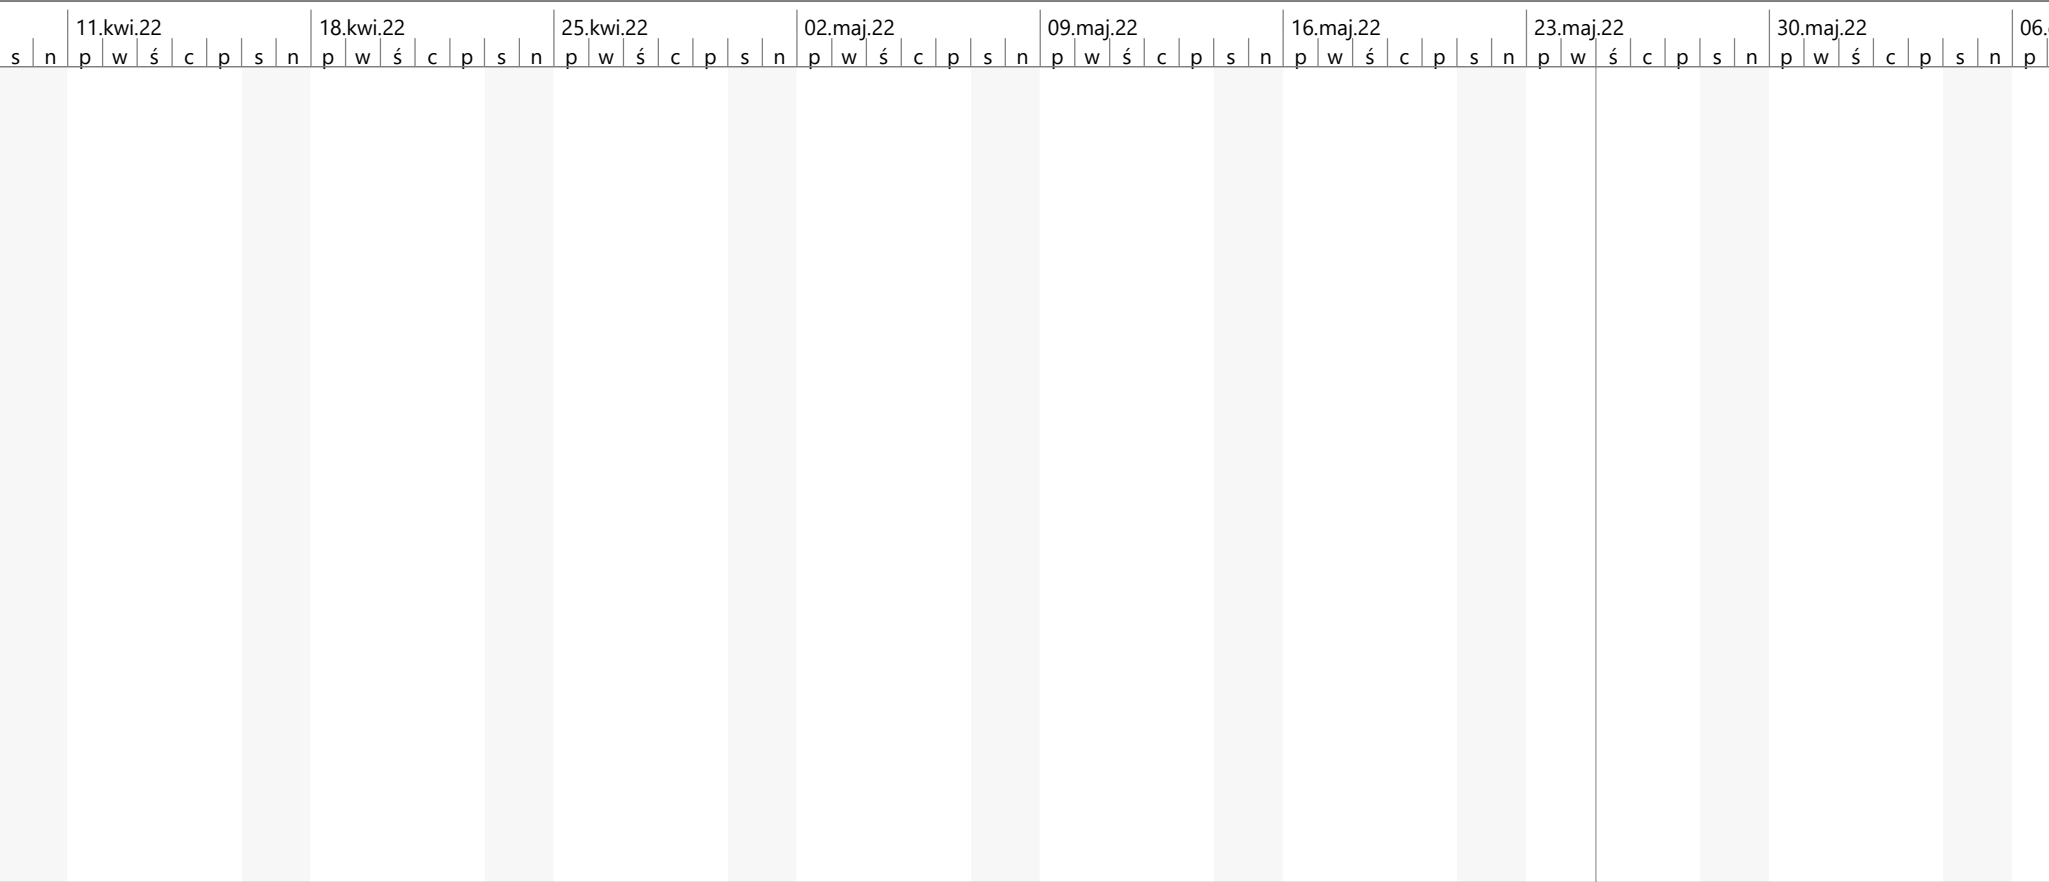

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

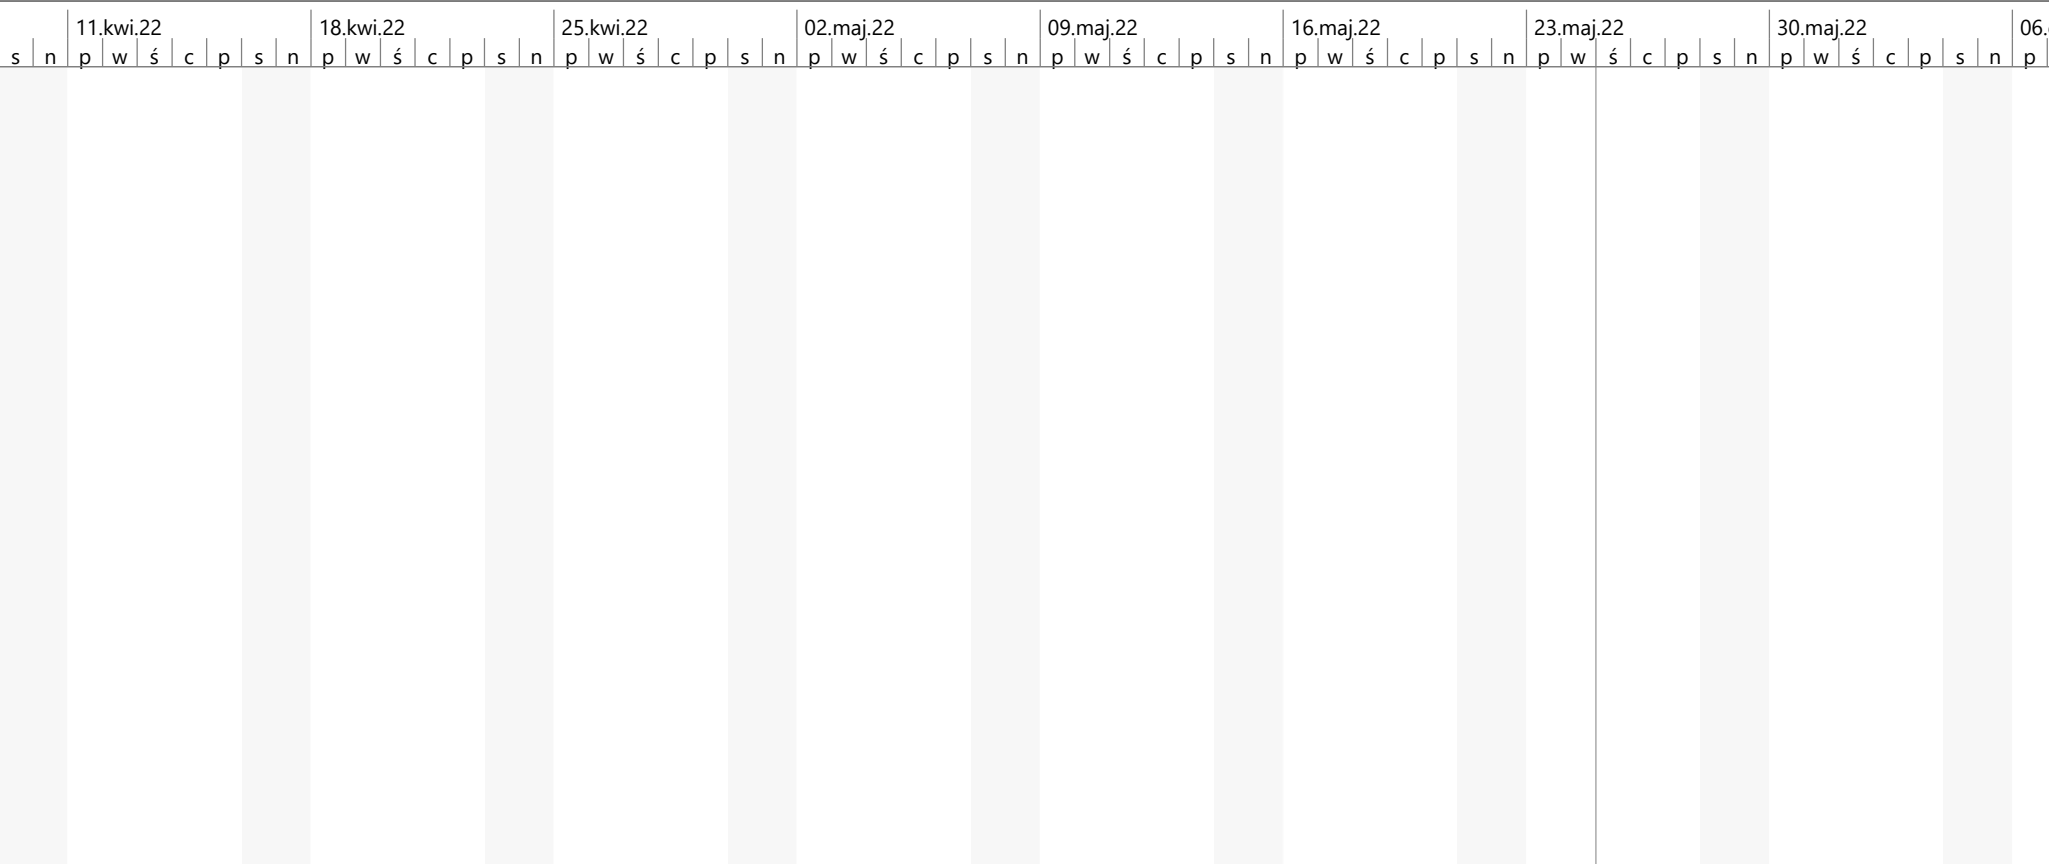

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne

Zewnętrzne punkty kontrolne


Termin ostateczny

Postęp

Ręczne (postęp)


Strona 418



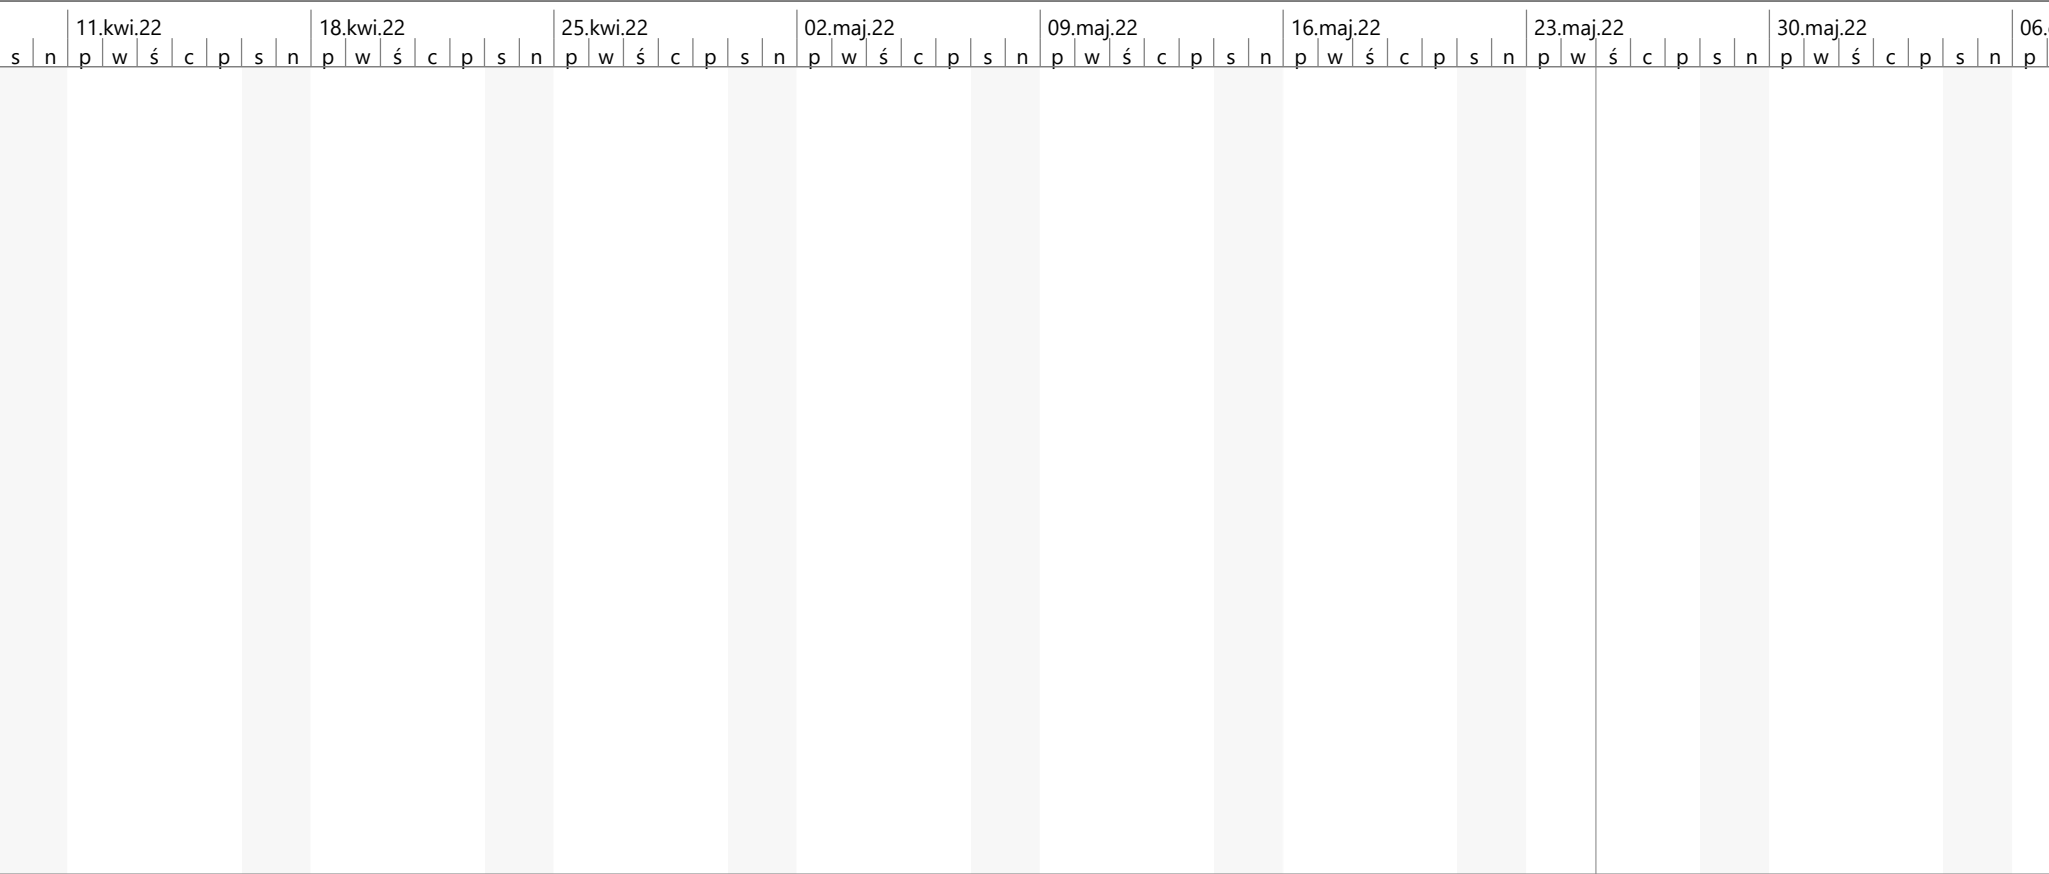


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

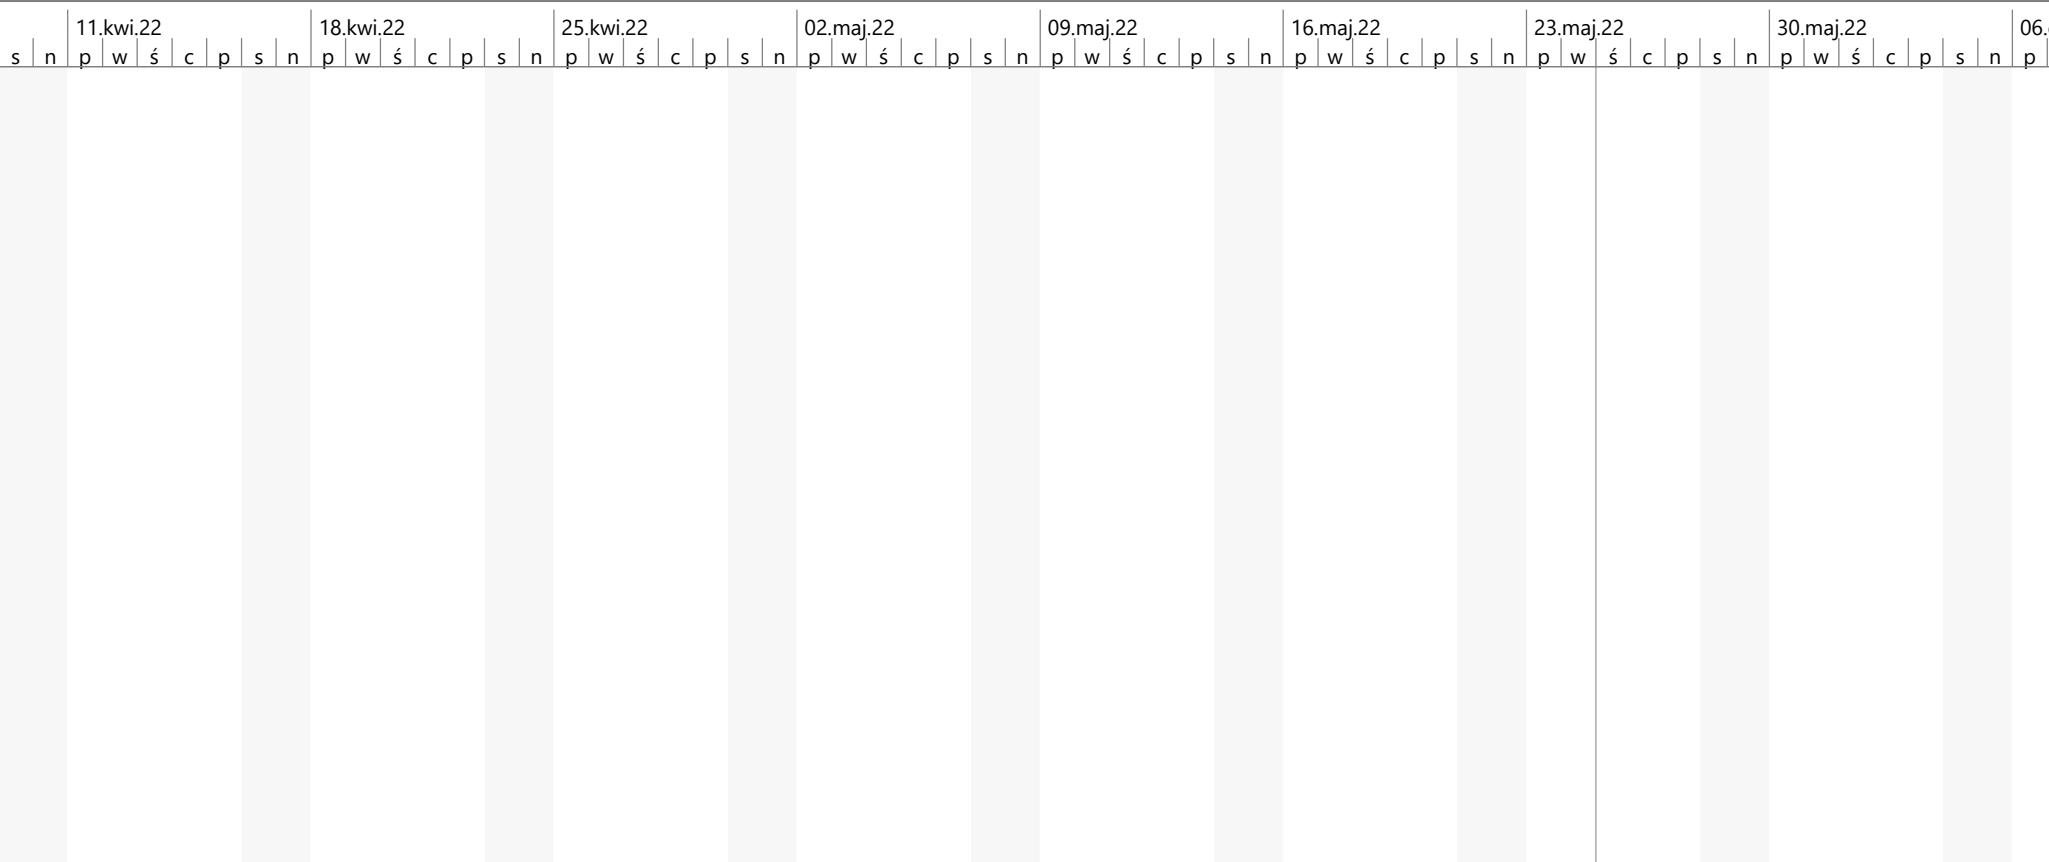


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

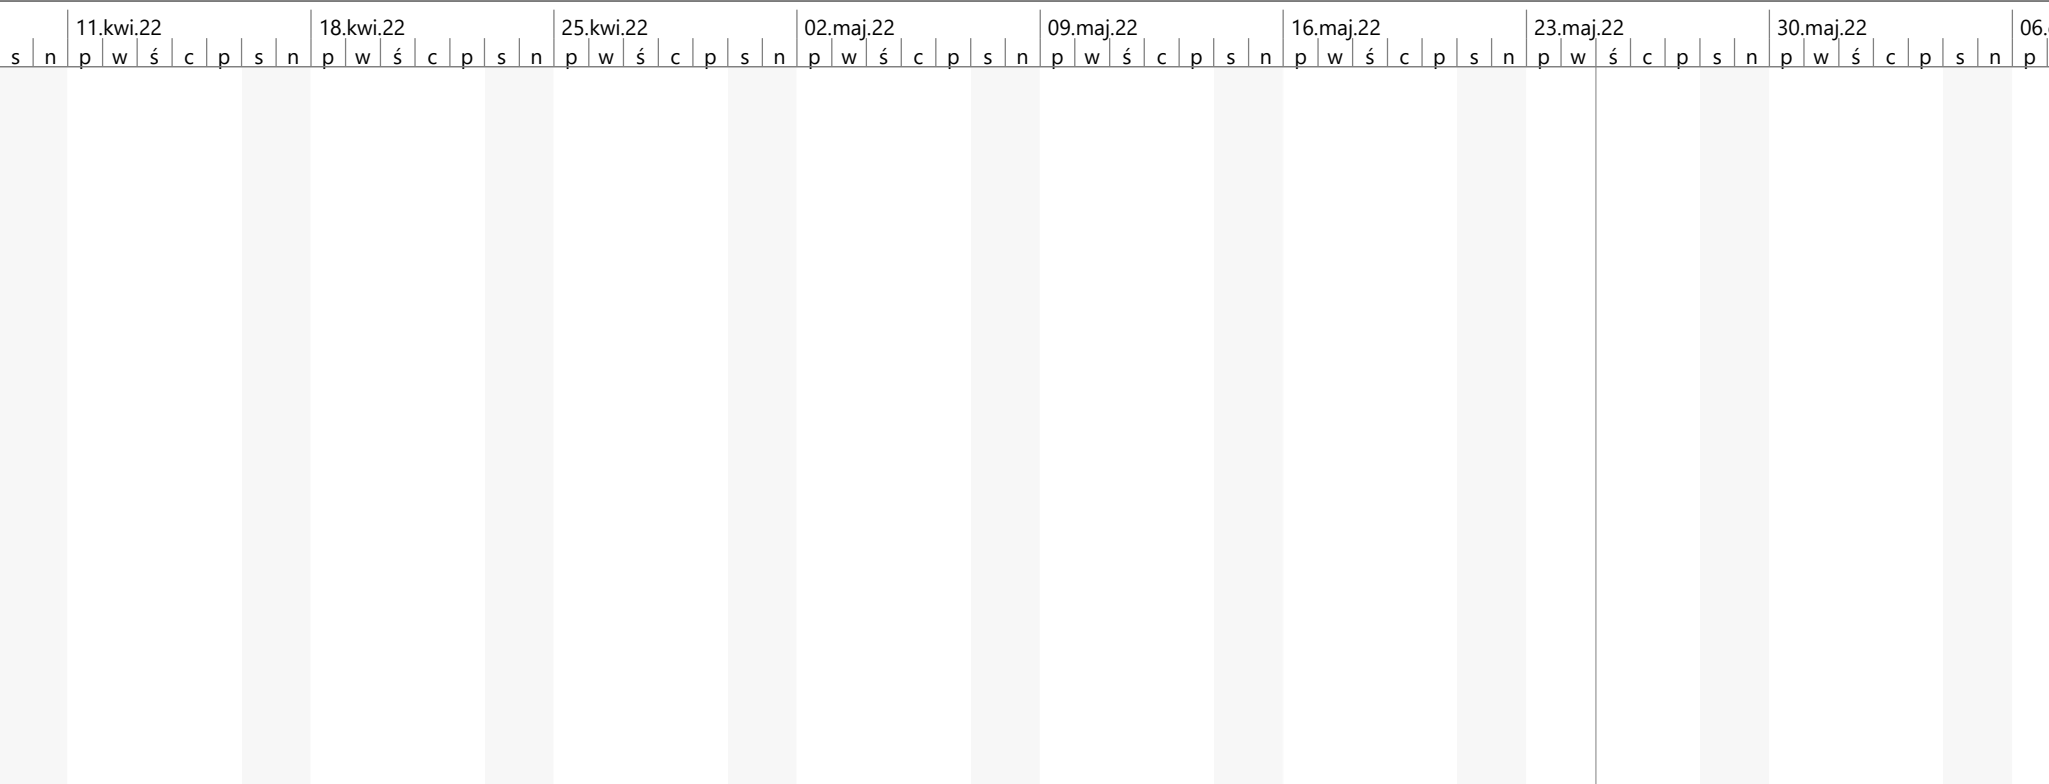


Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

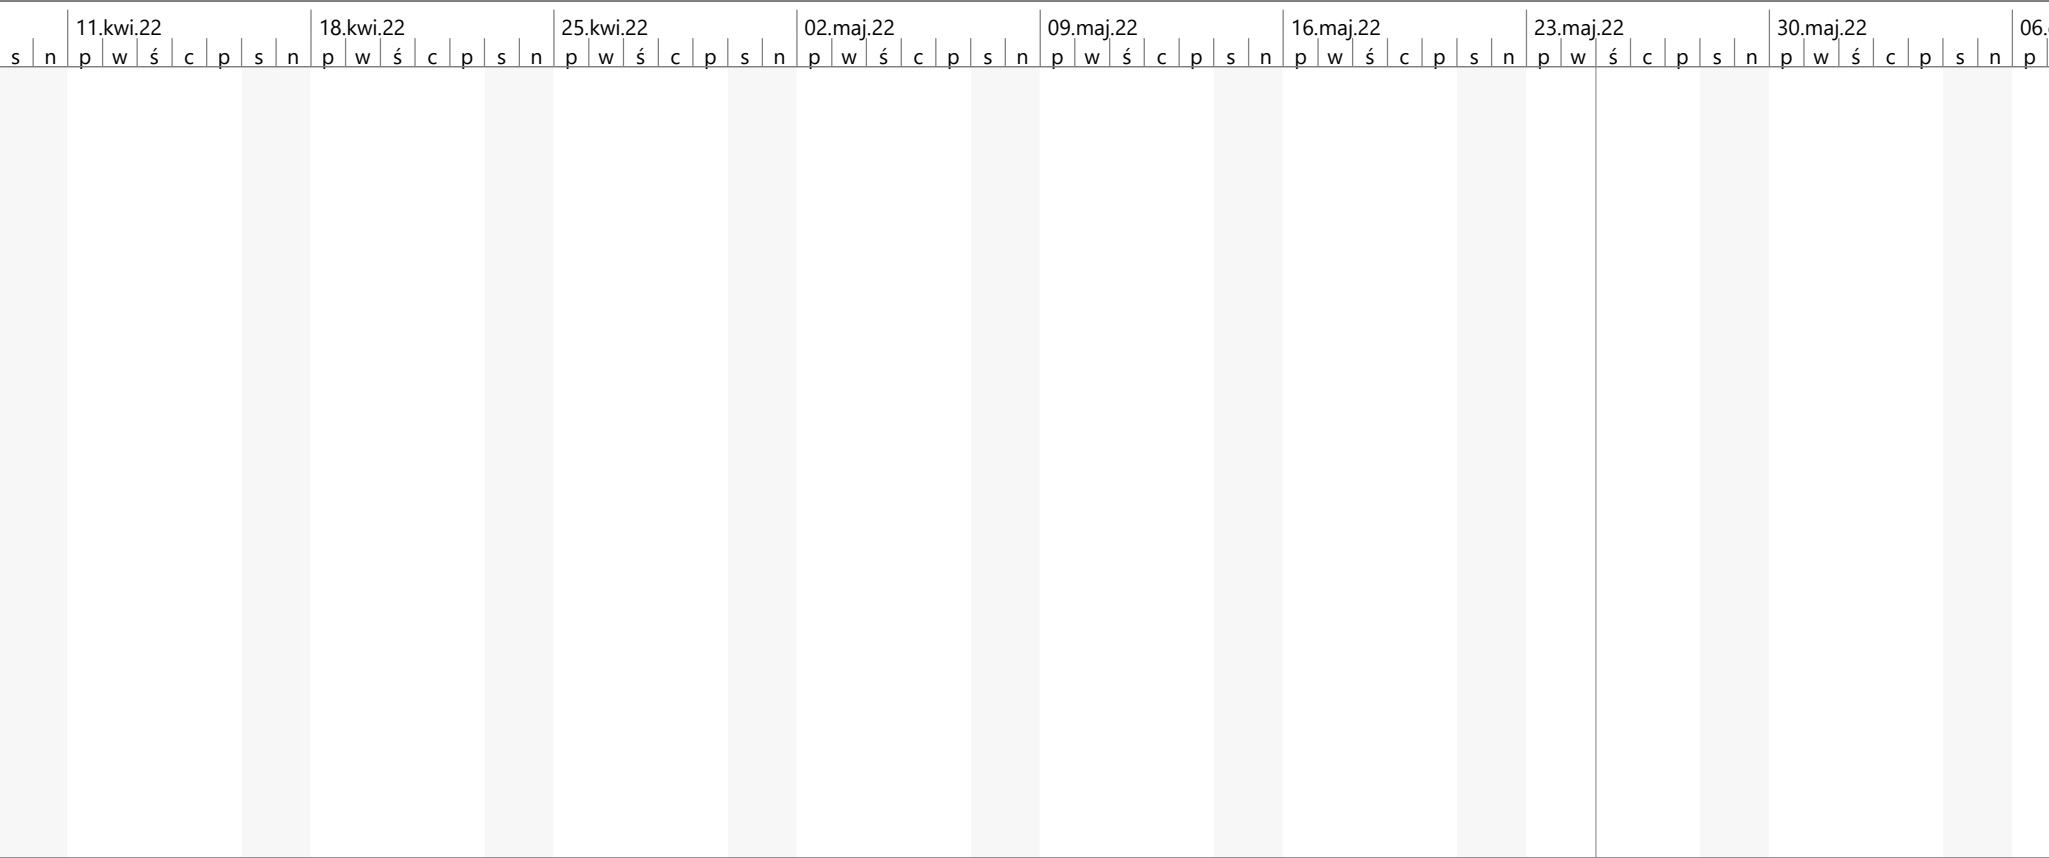

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

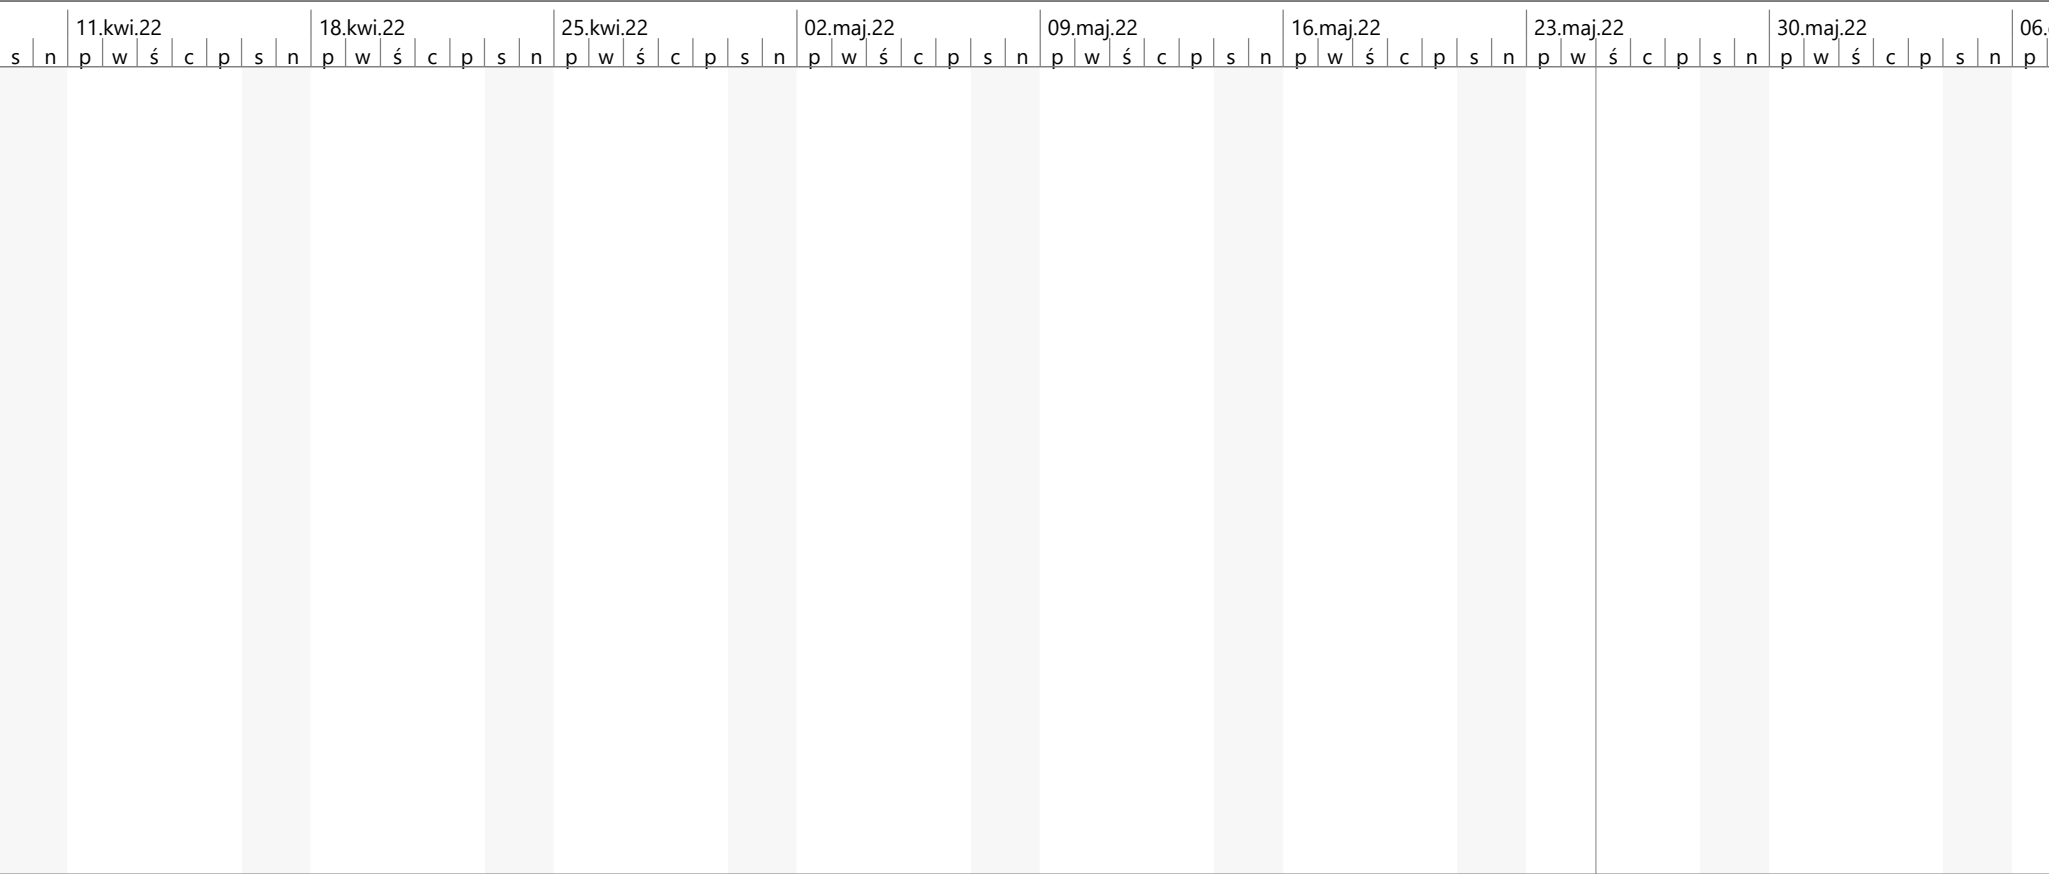

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



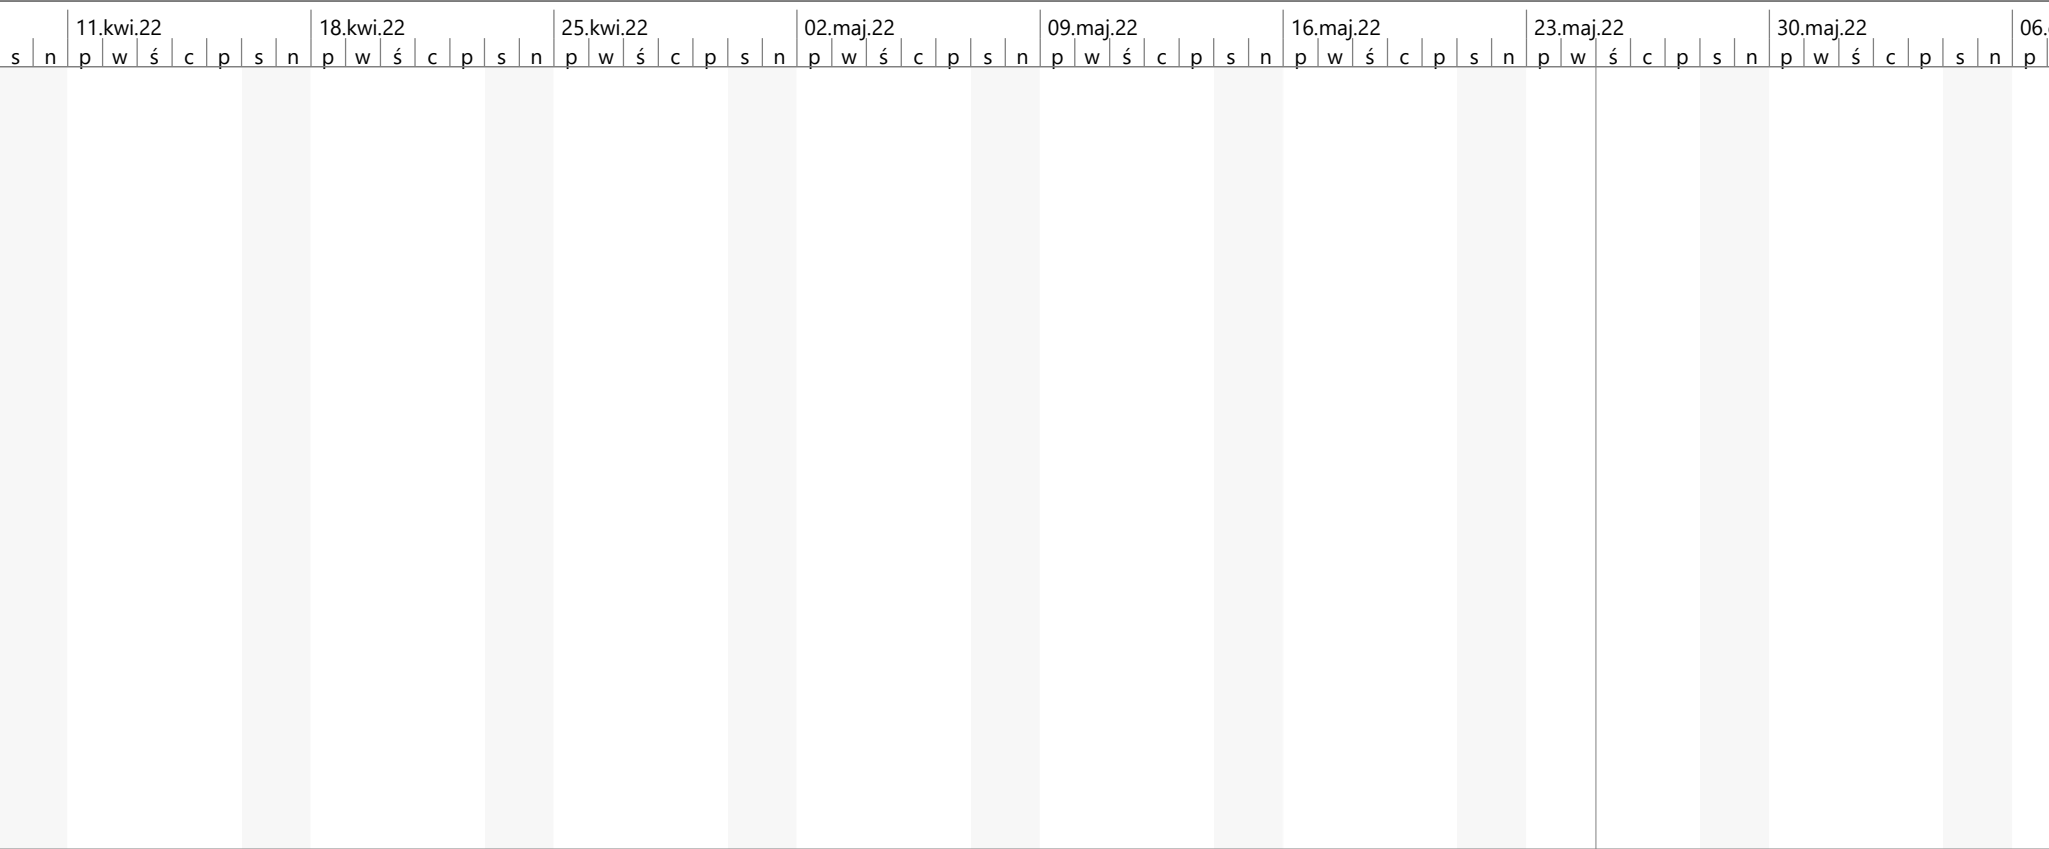


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

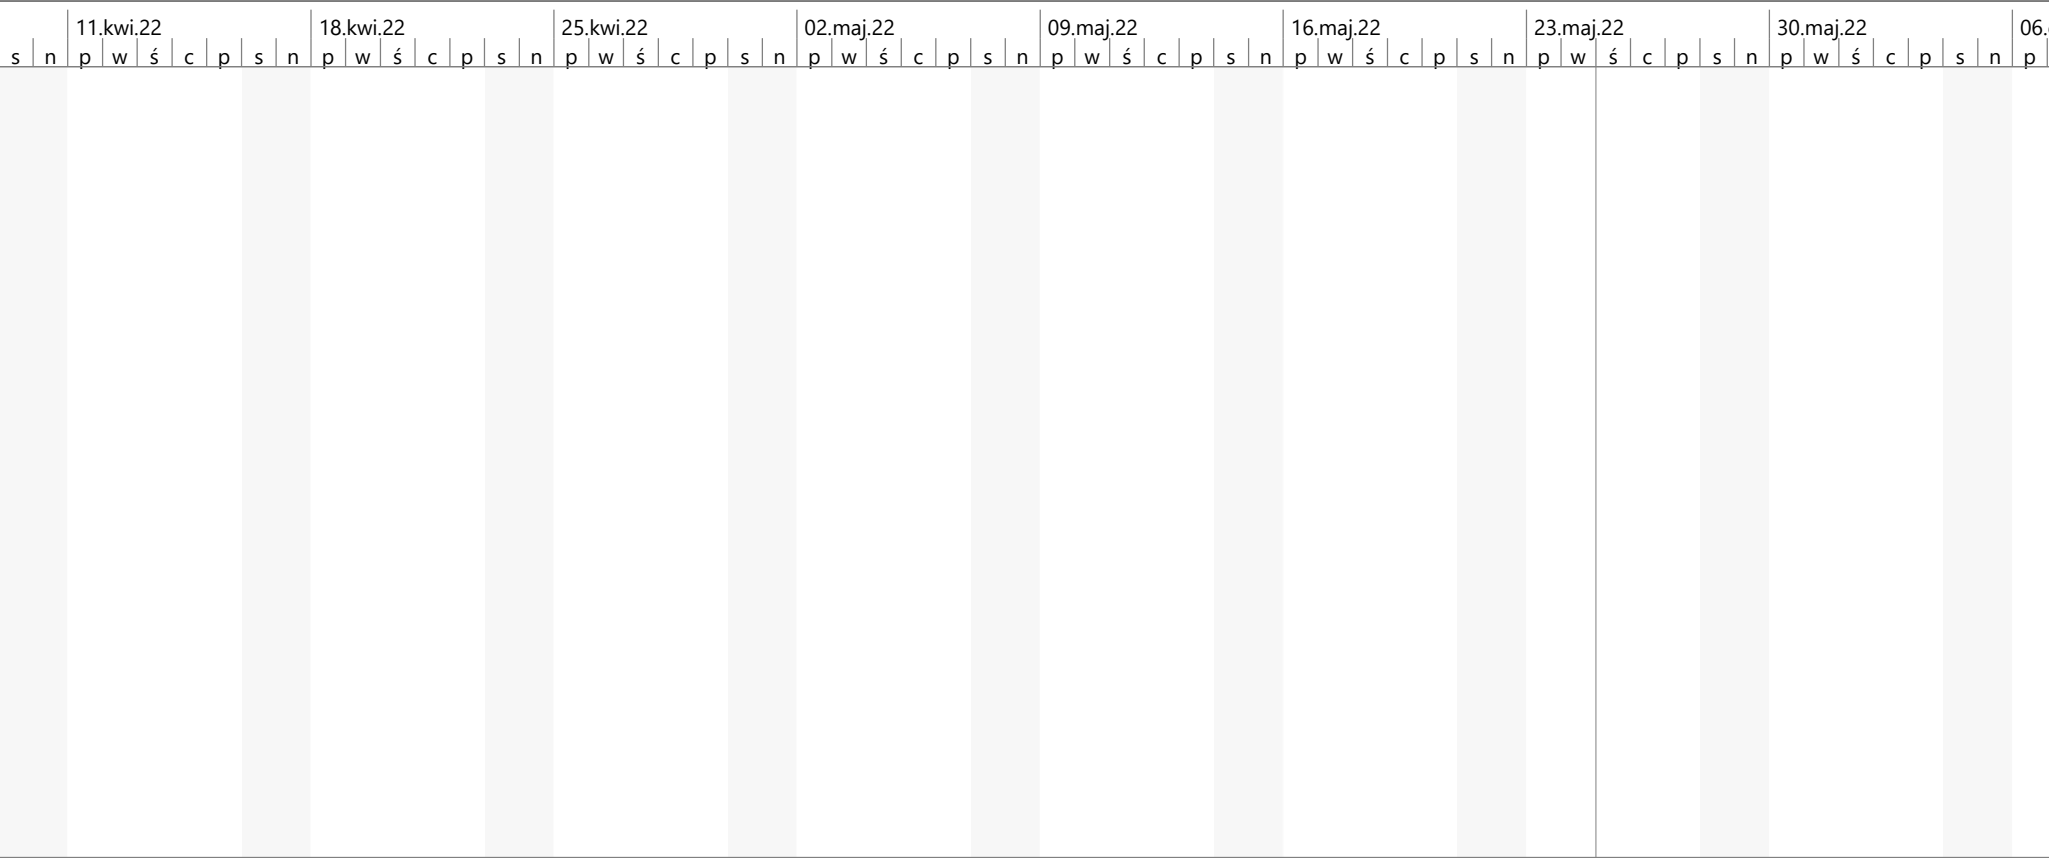


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

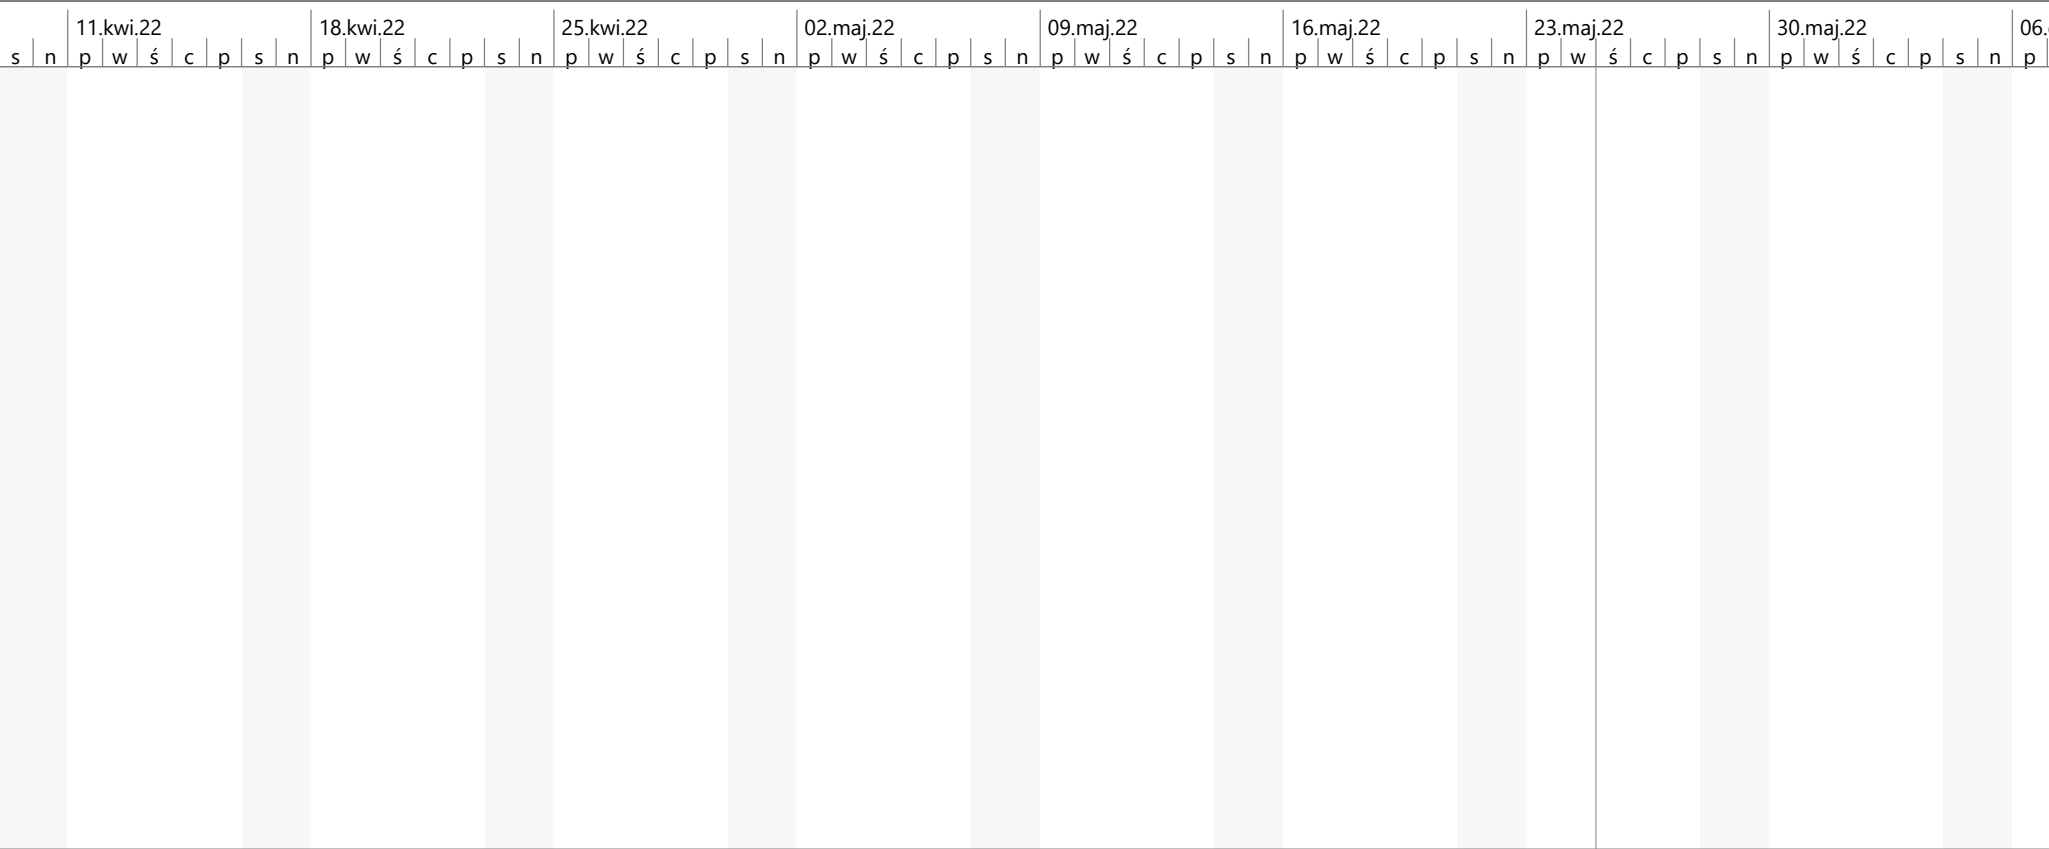

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

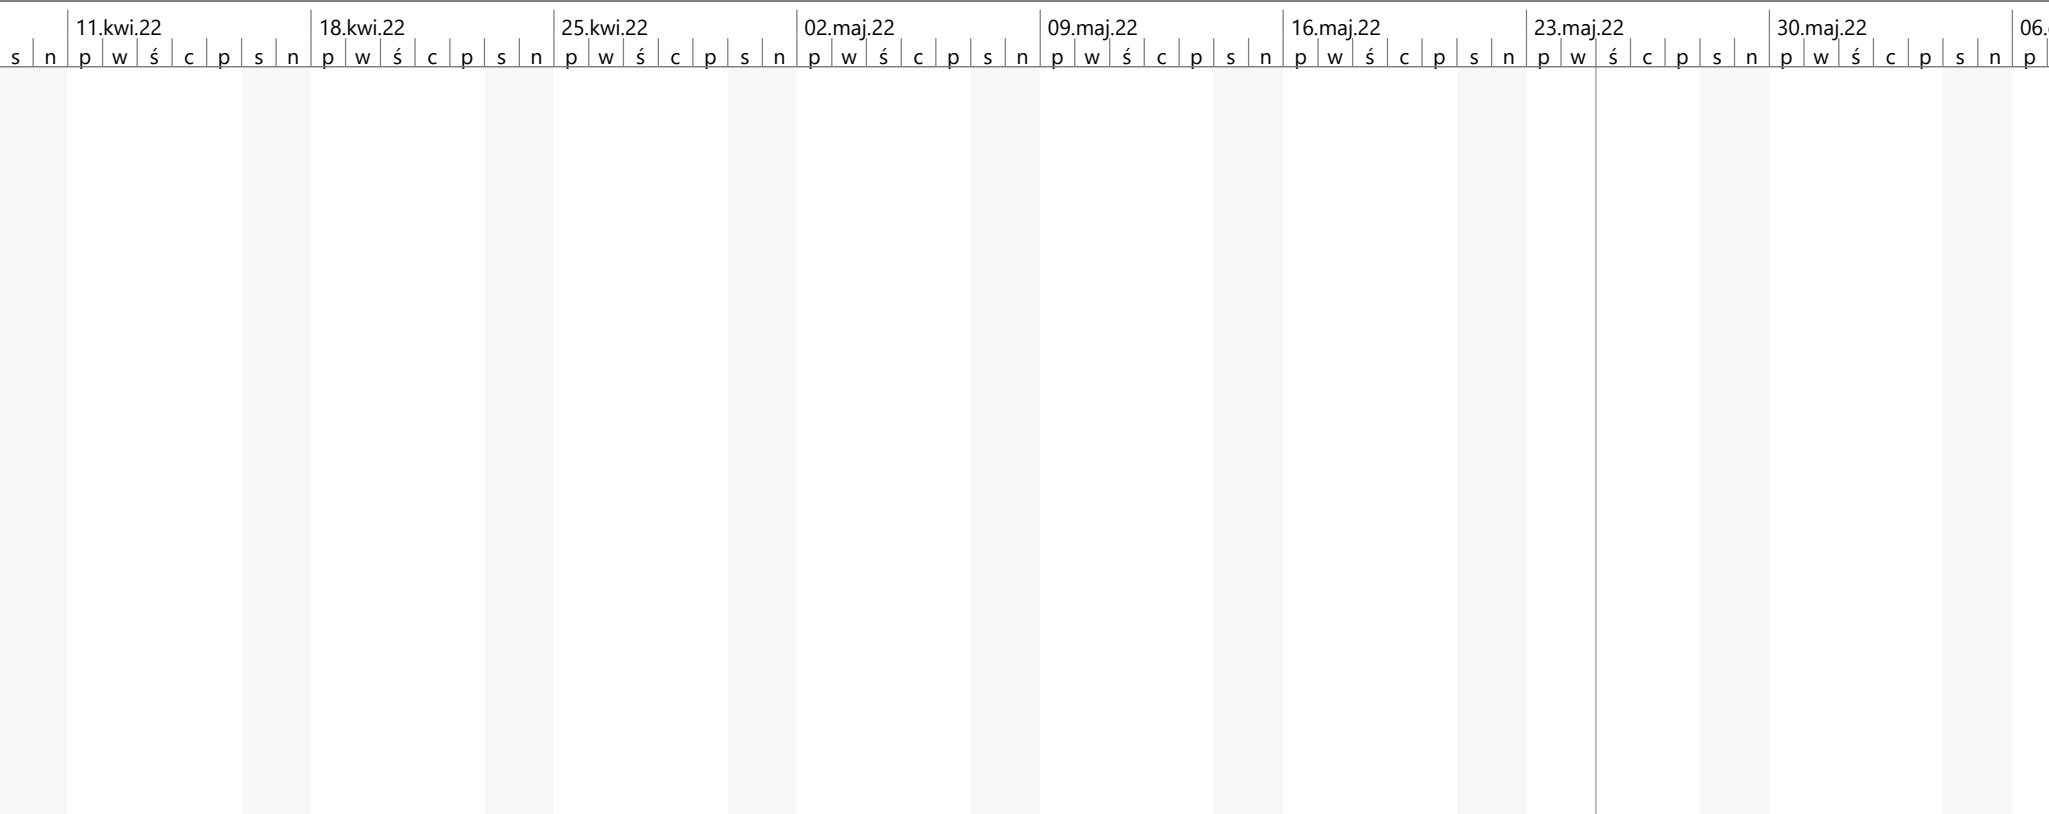

Projekt: Projekt1


Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

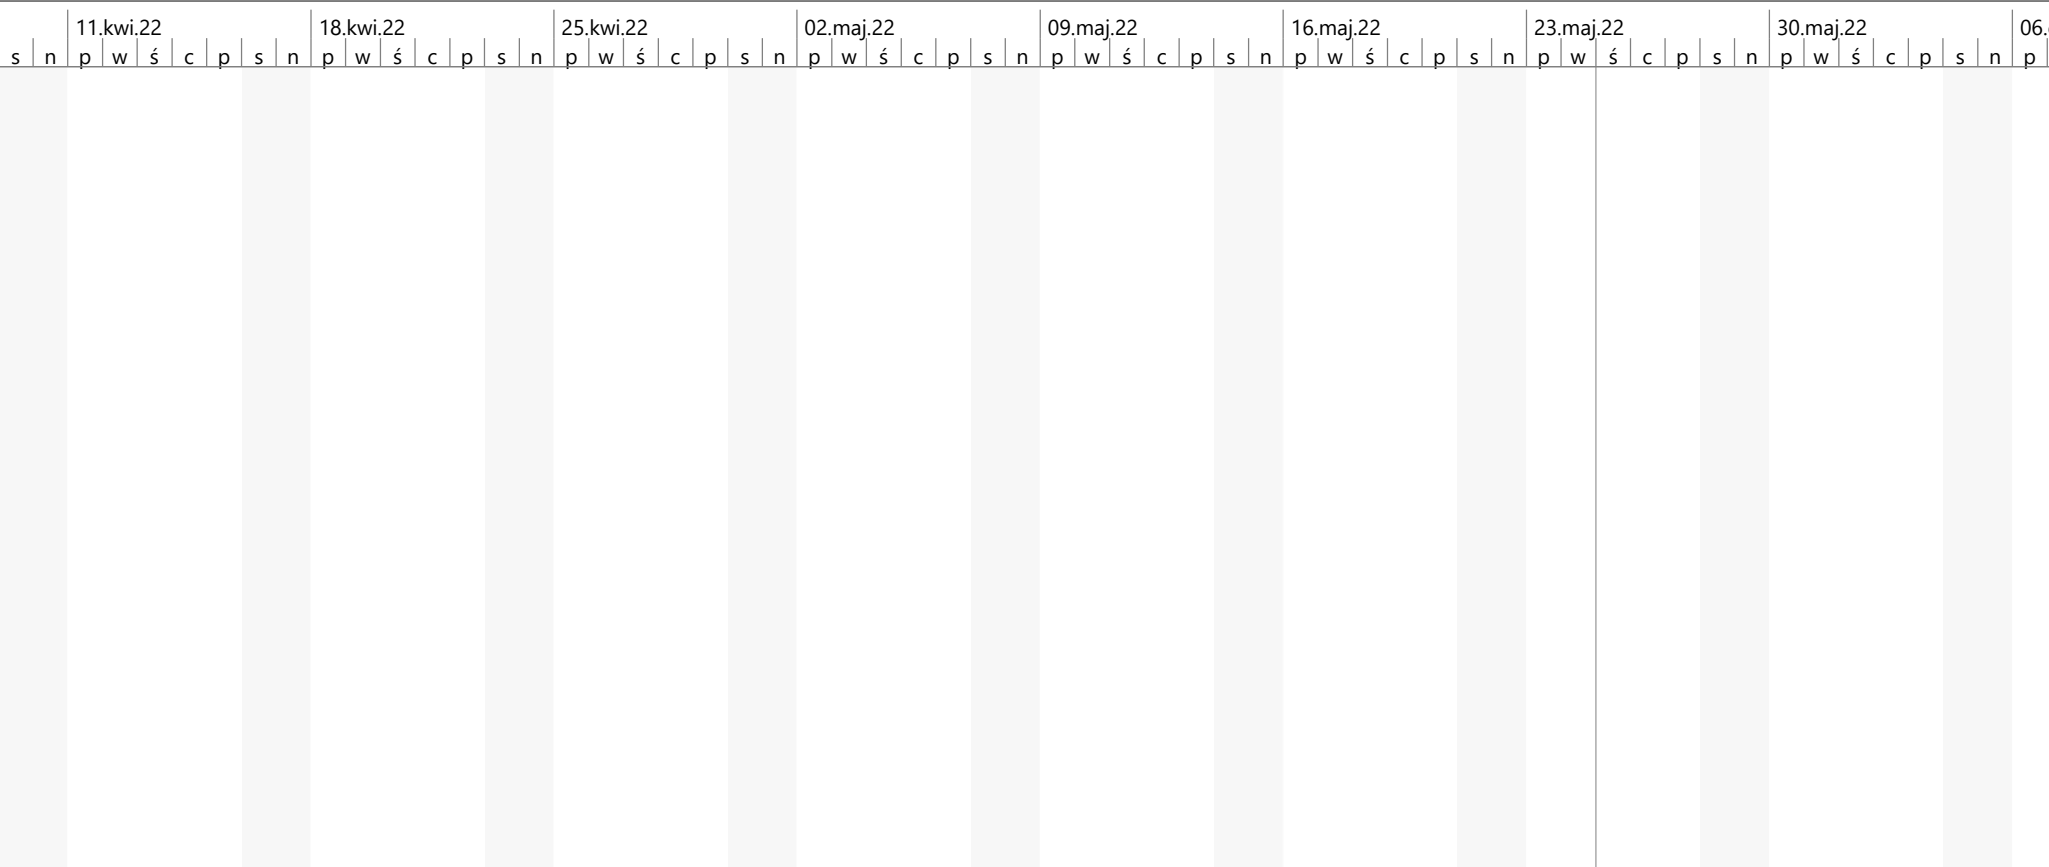


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

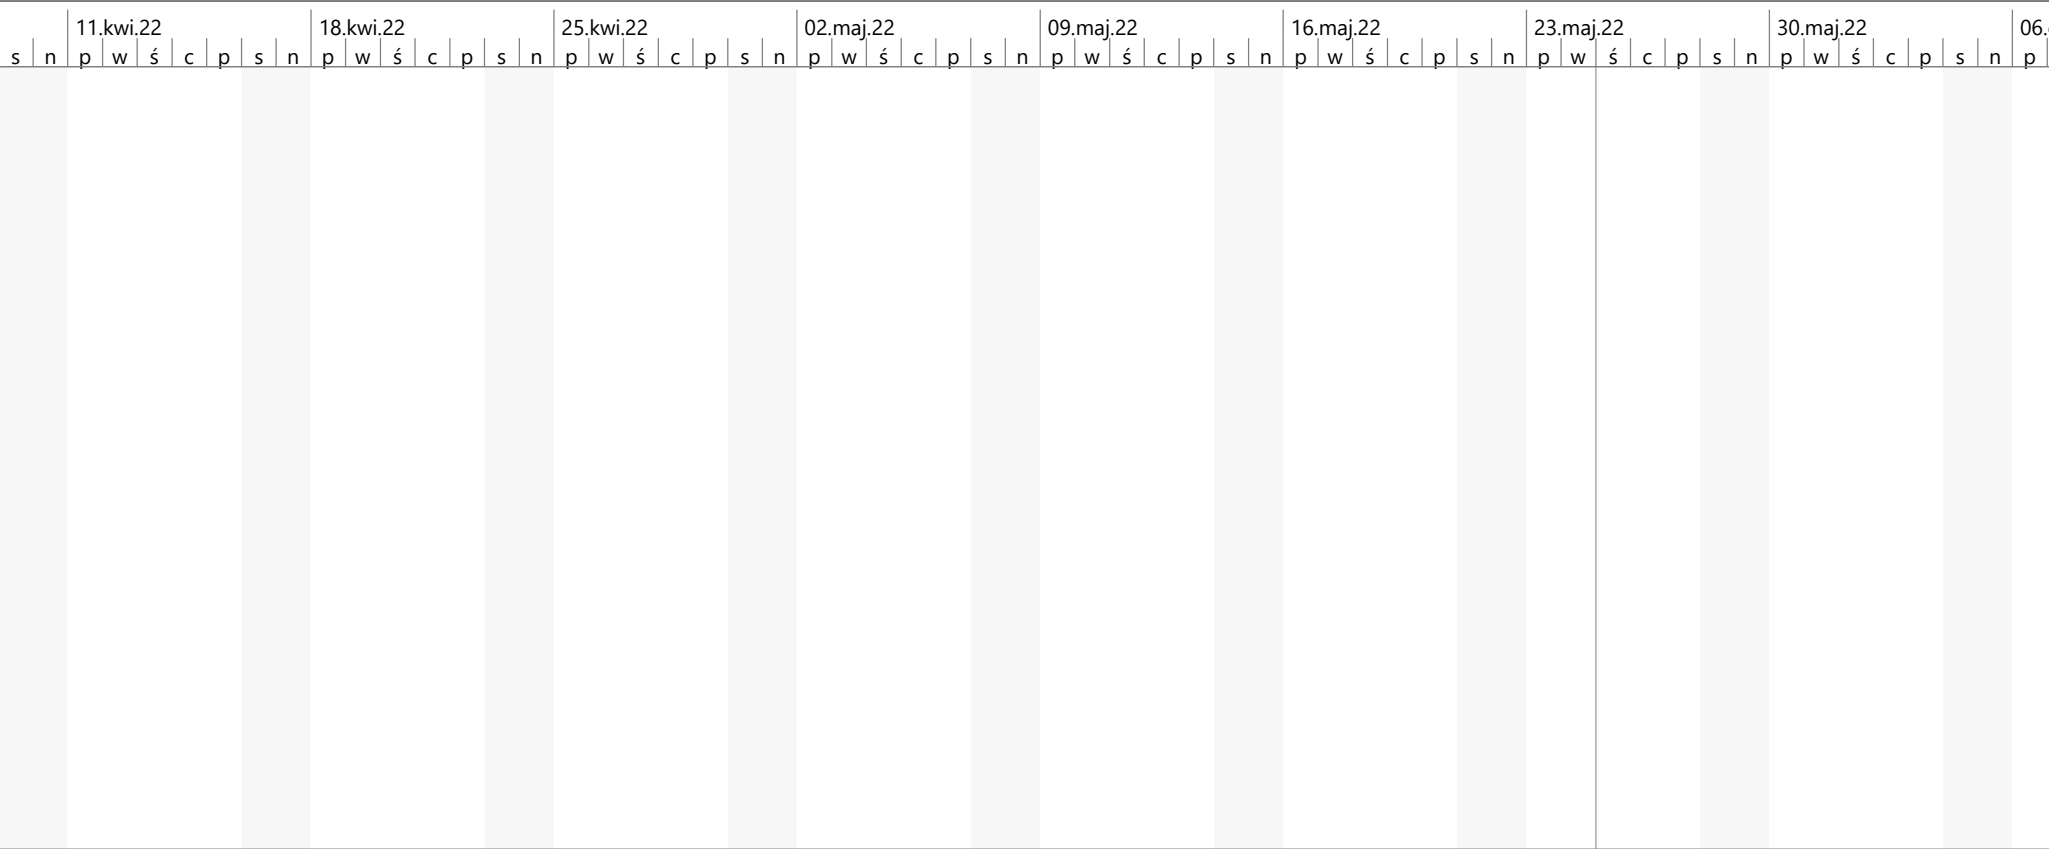

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



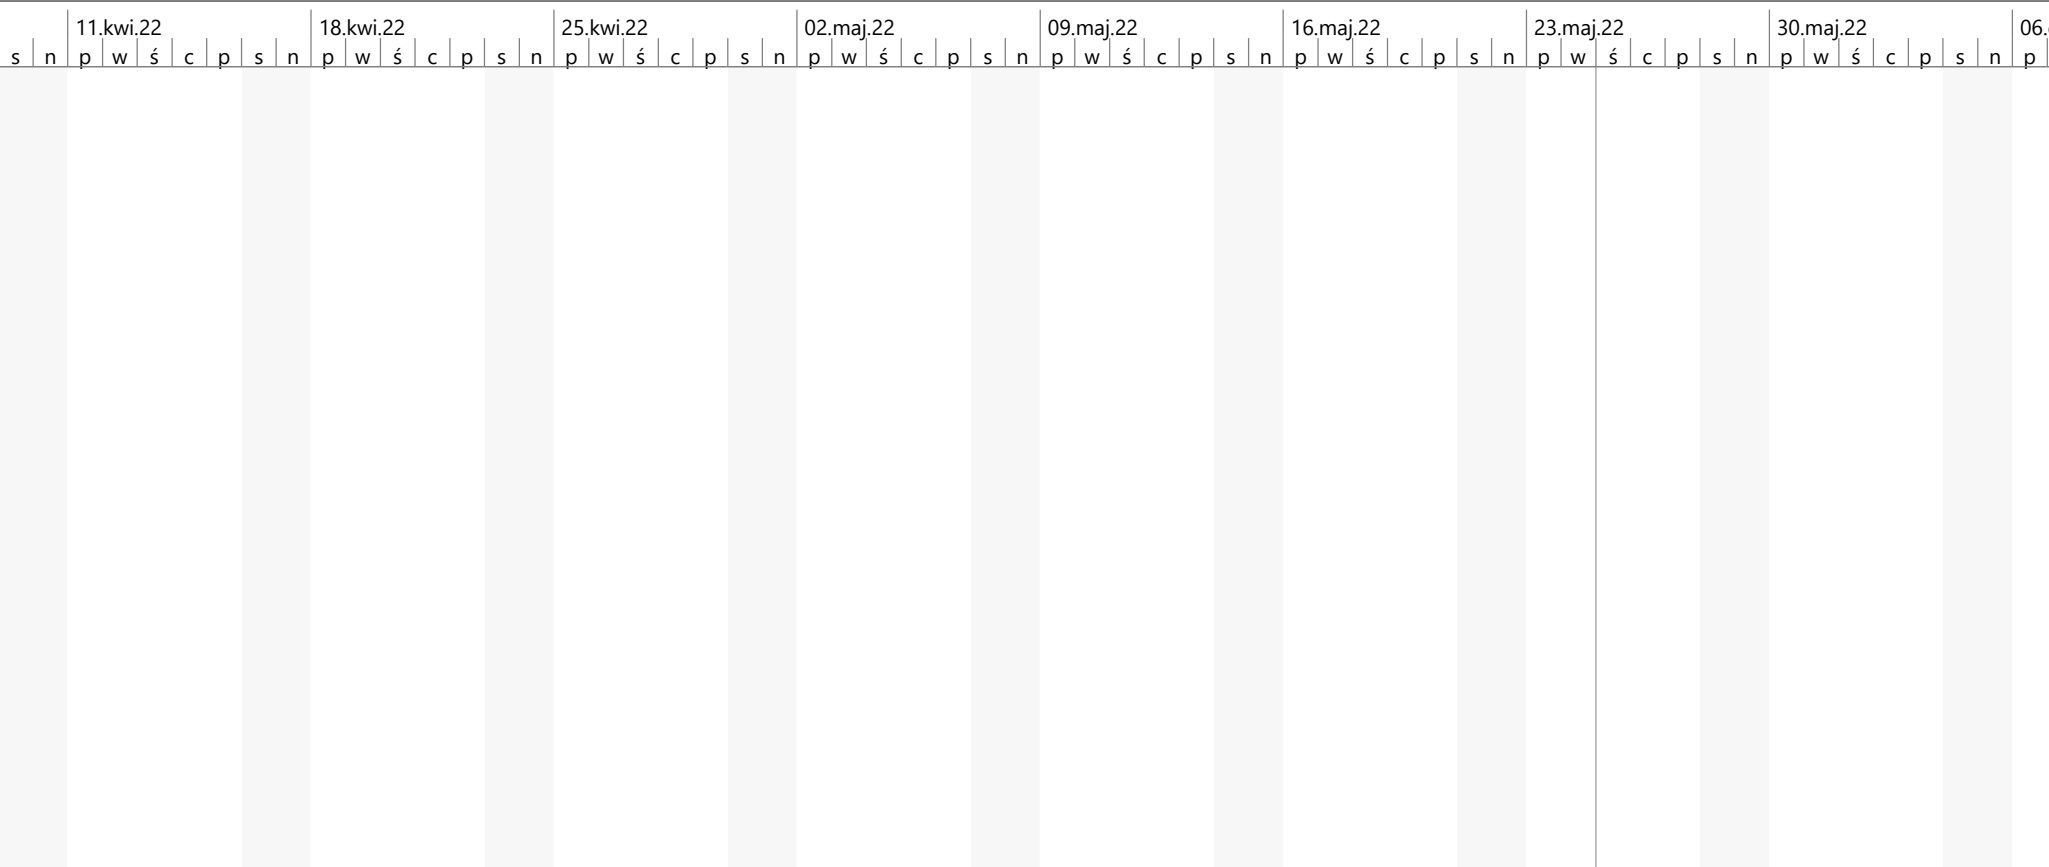



Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



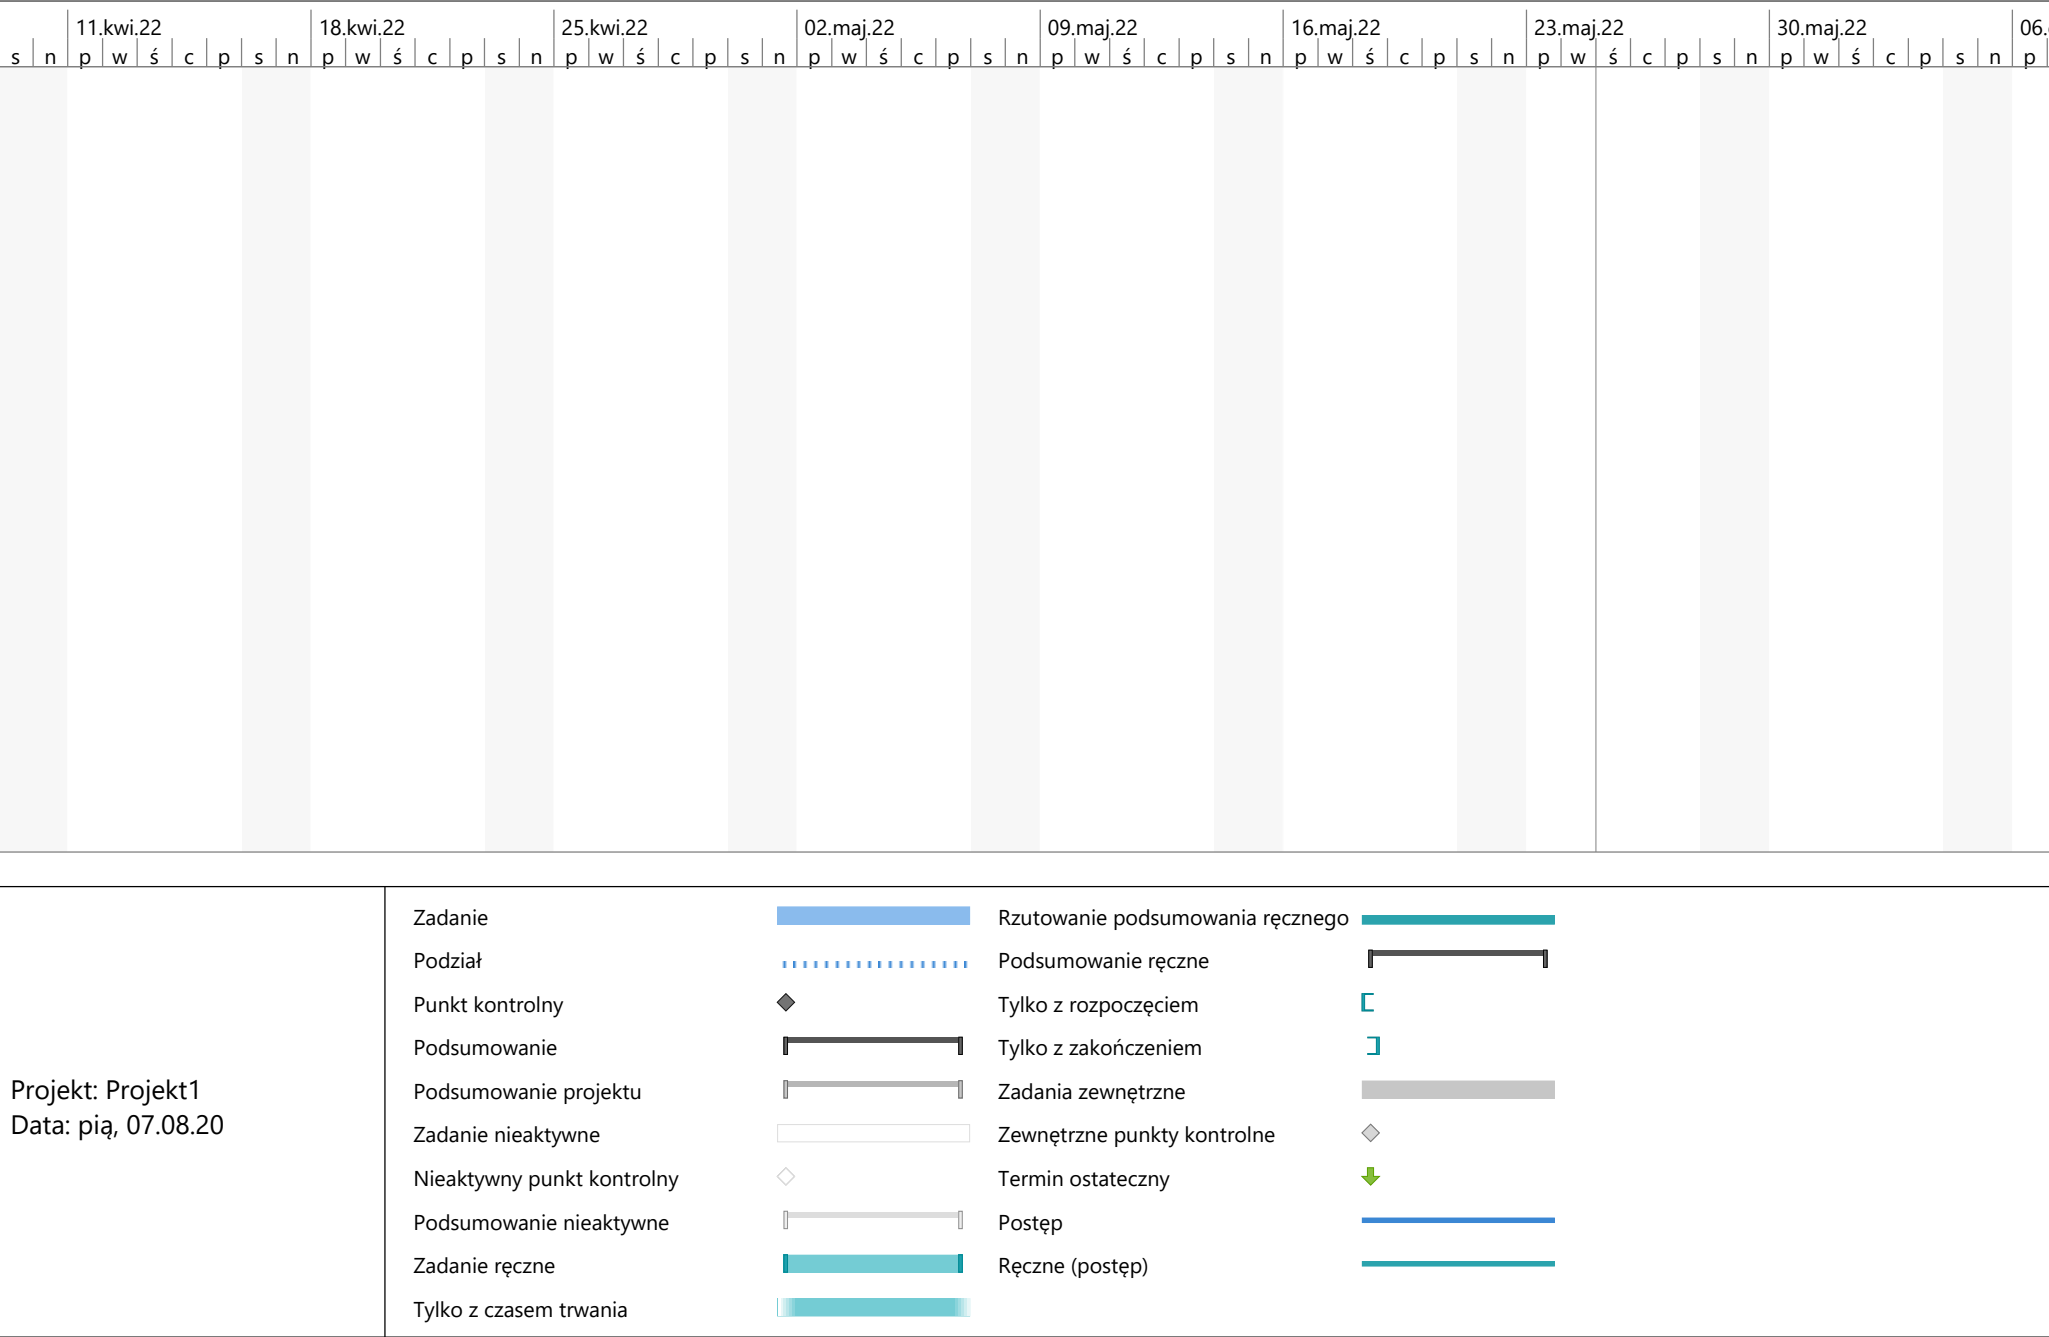

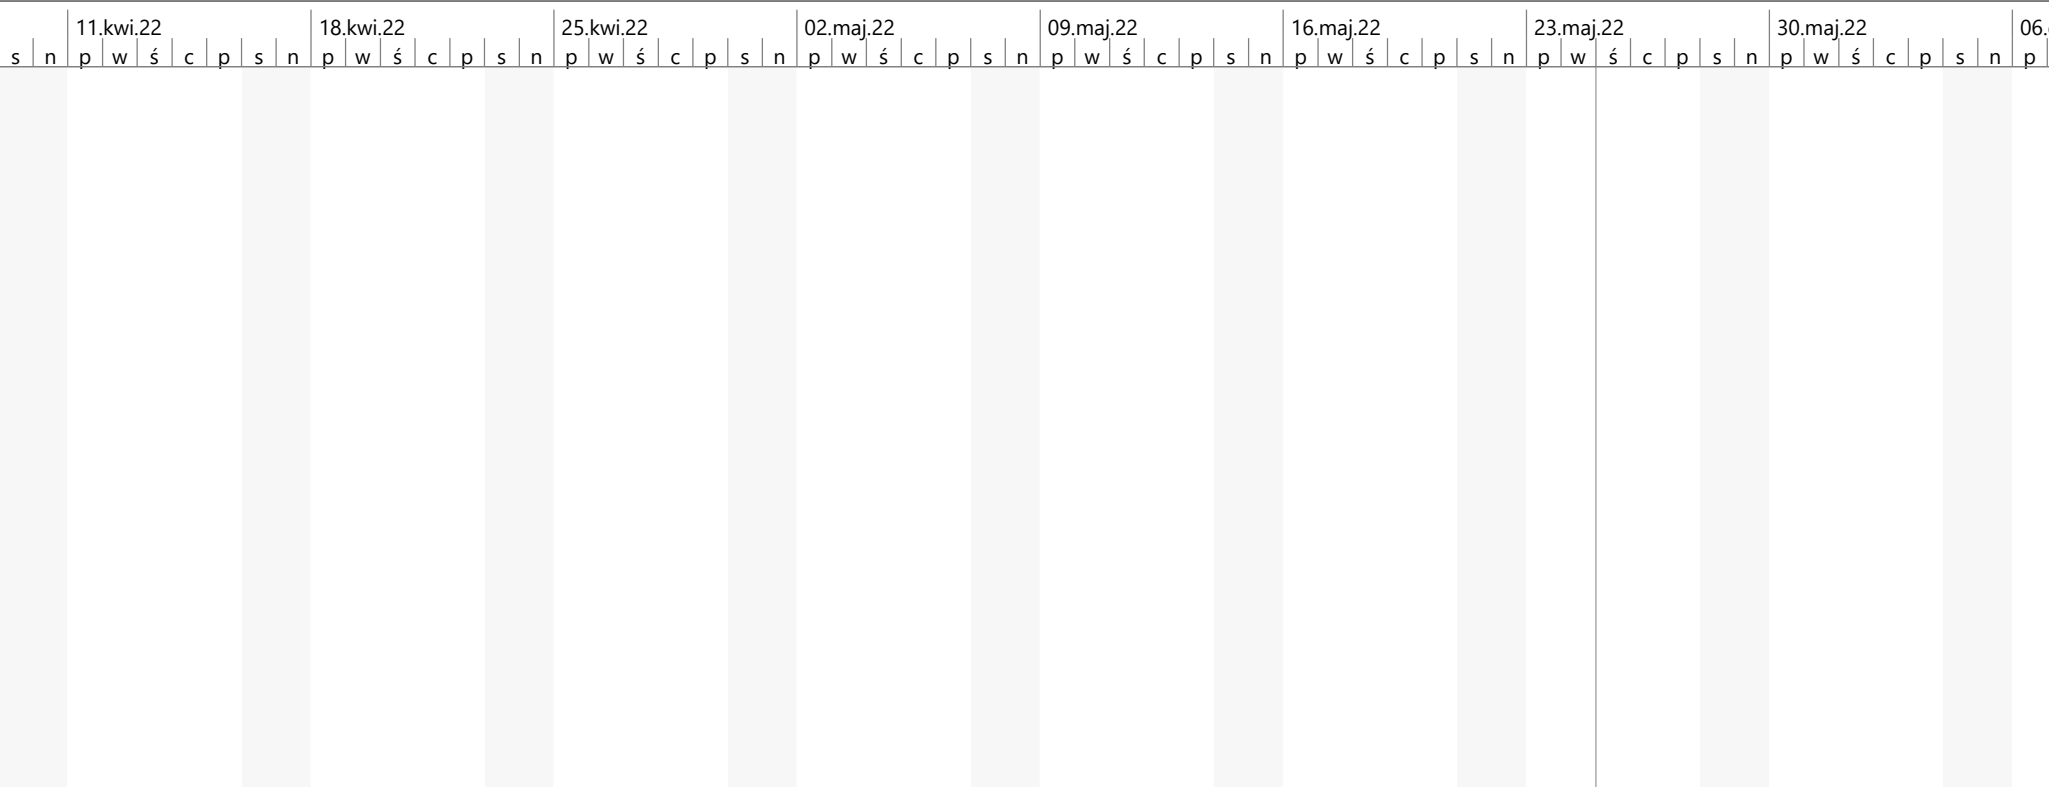

Projekt: Projekt1

Data: pią, 07.08.20

Zadanie

Podział

Punkt kontrolny

Podsumowanie

Podsumowanie projektu

Zadanie nieaktywne

Nieaktywny punkt kontrolny

Podsumowanie nieaktywne

Zadanie ręczne

Tylko z czasem trwania

◆

◇

Rzutowanie podsumowania ręcznego

Podsumowanie ręczne

Tylko z rozpoczęciem

Tylko z zakończeniem

Zadania zewnętrzne


Zewnętrzne punkty kontrolne

Termin ostateczny


Postęp





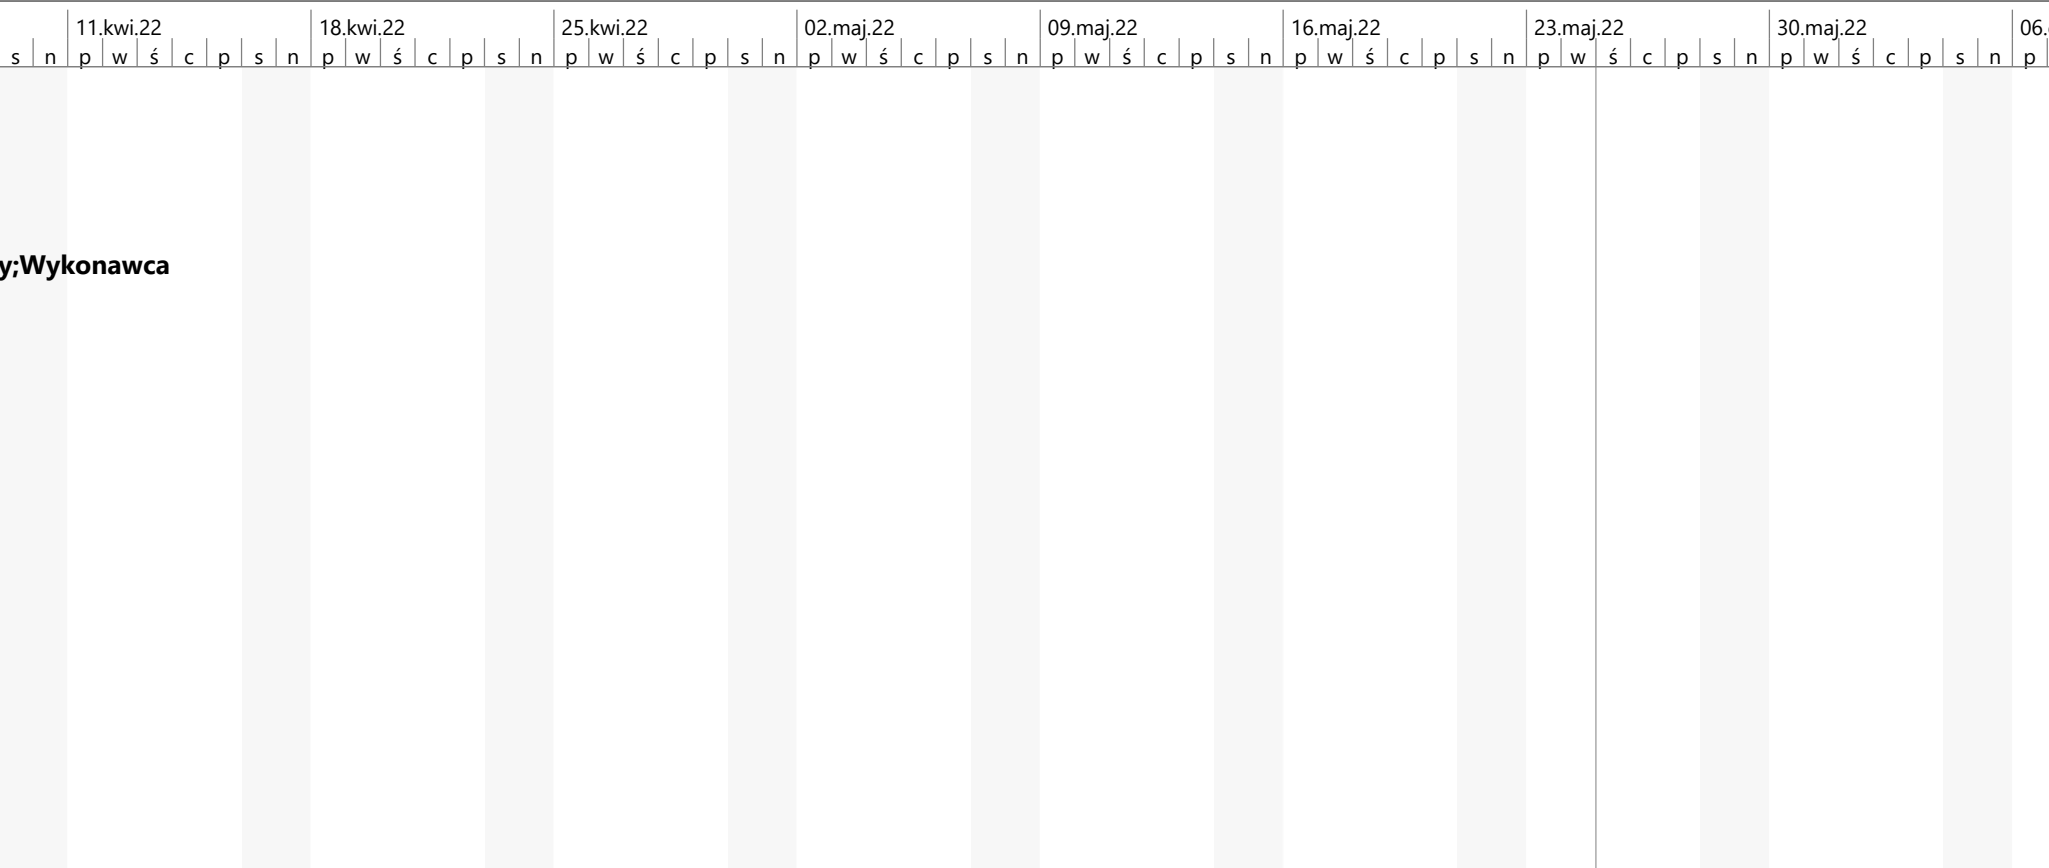



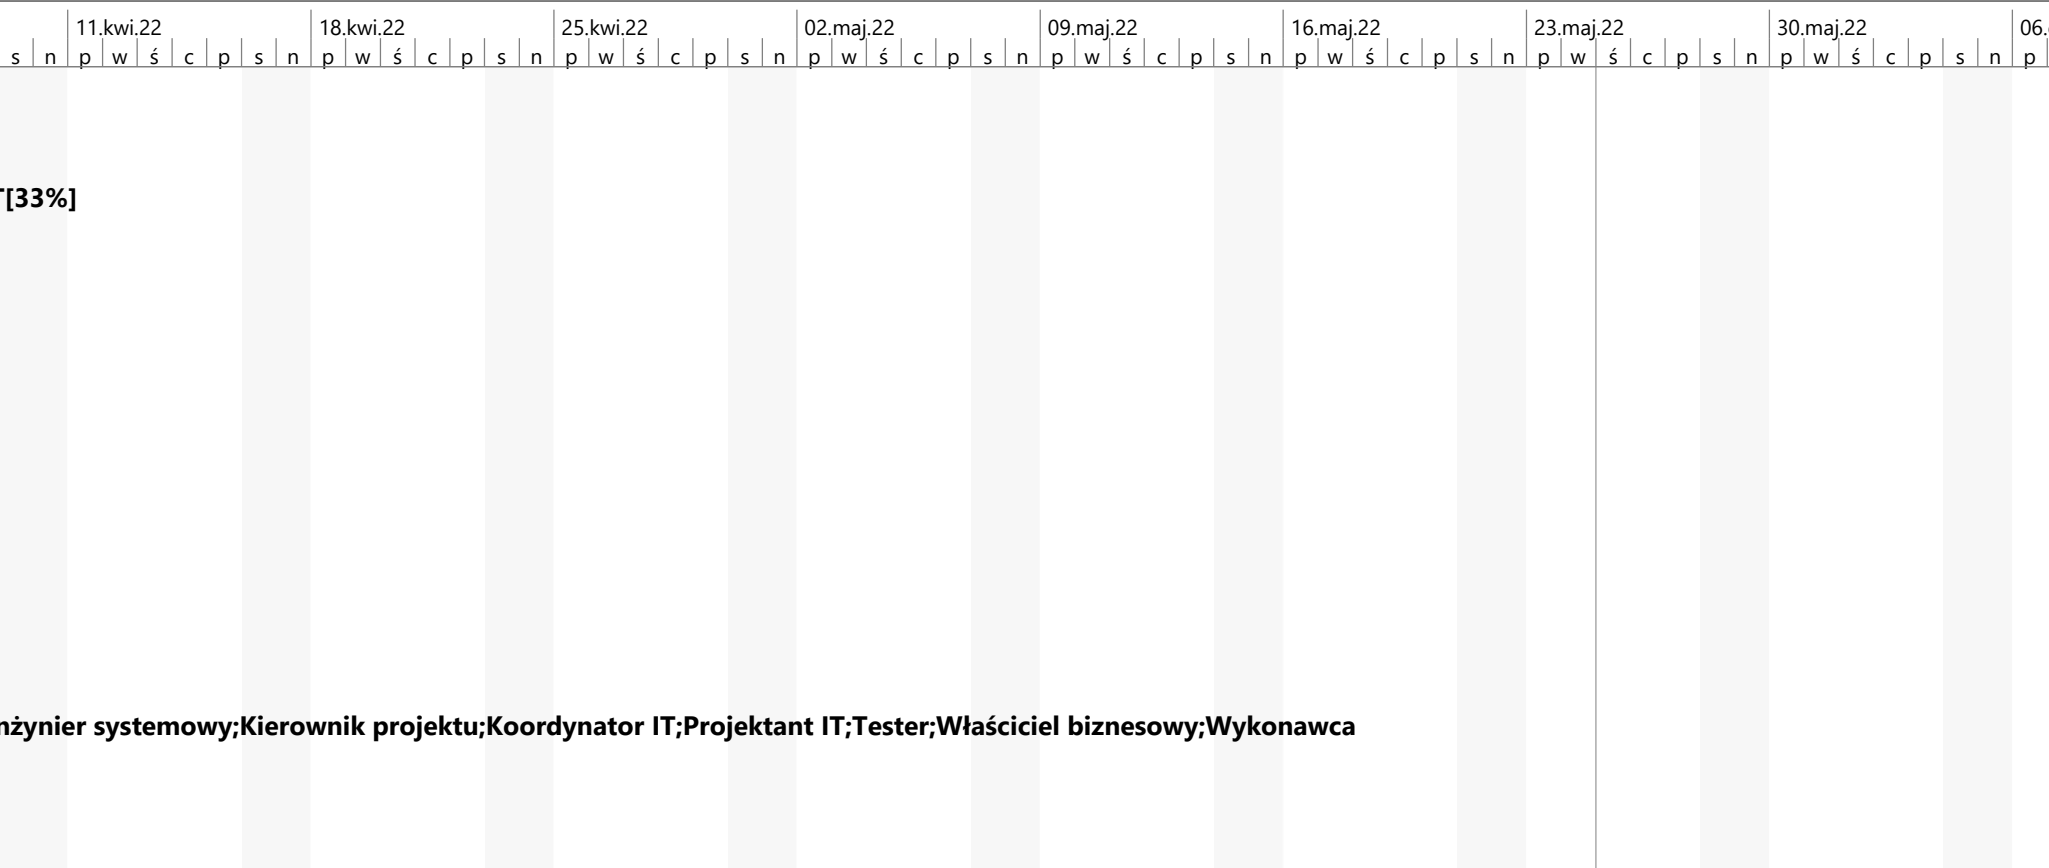










Ręczne (postęp)


Strona 434



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

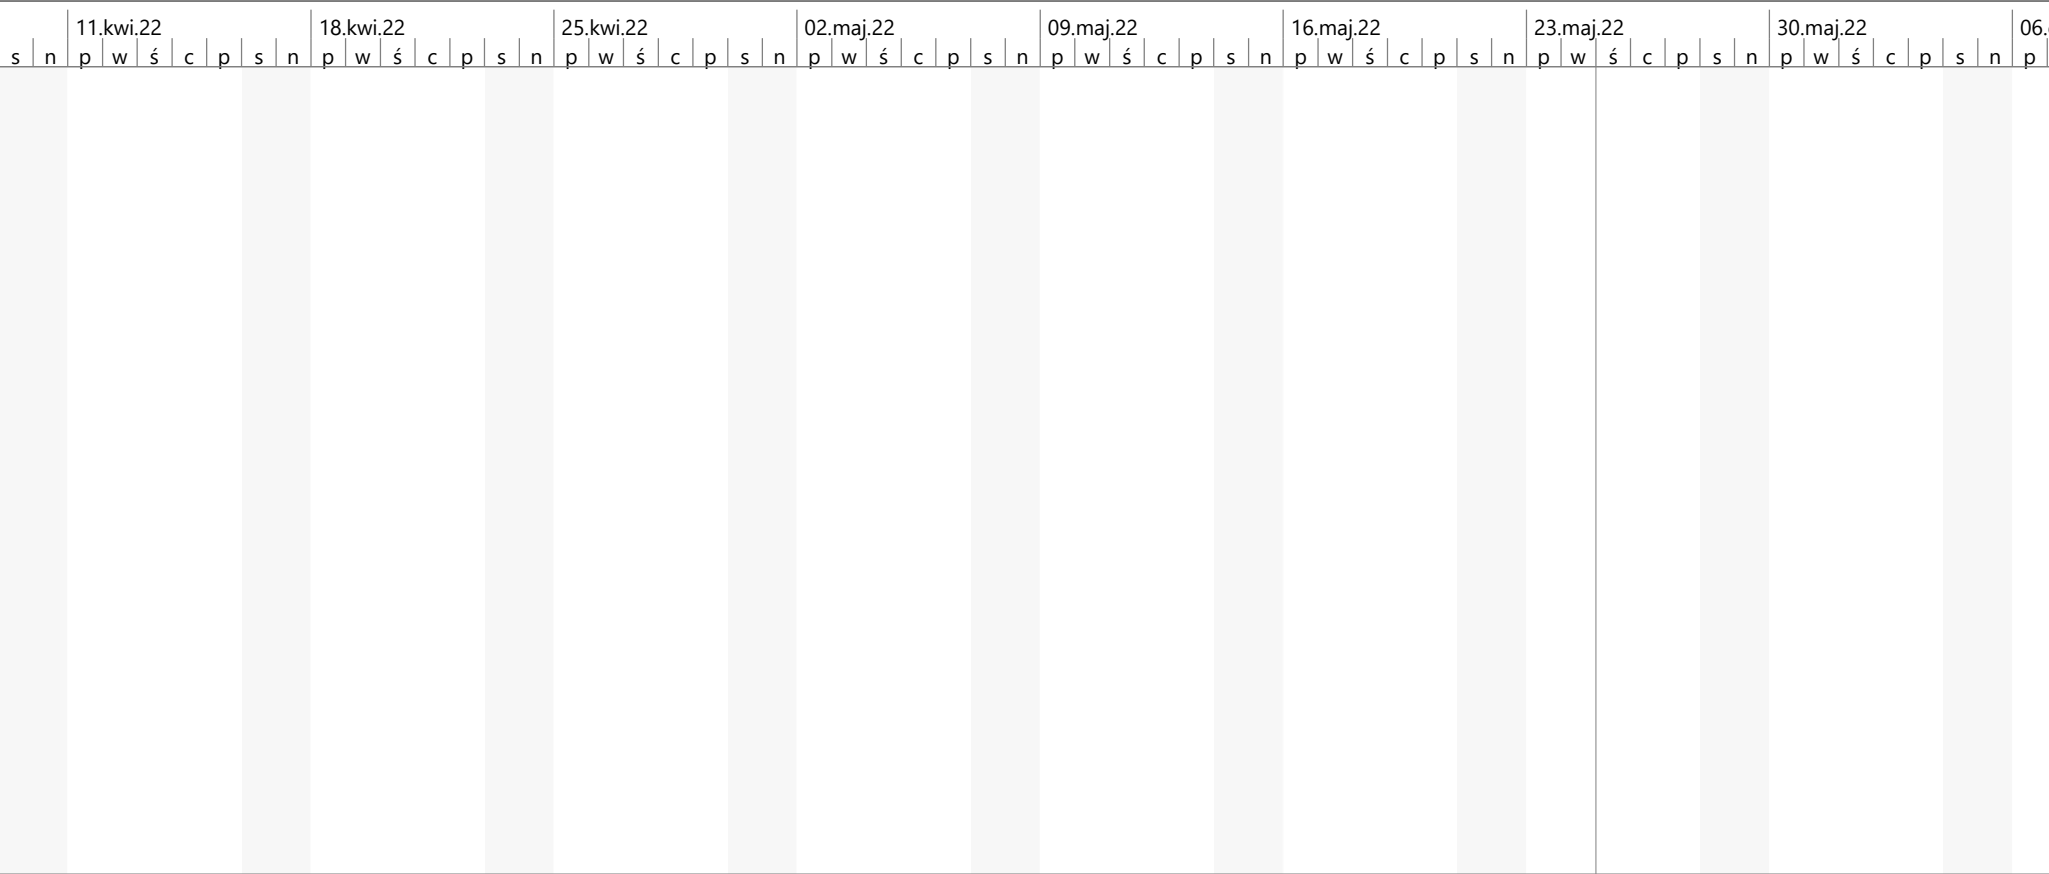


Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20



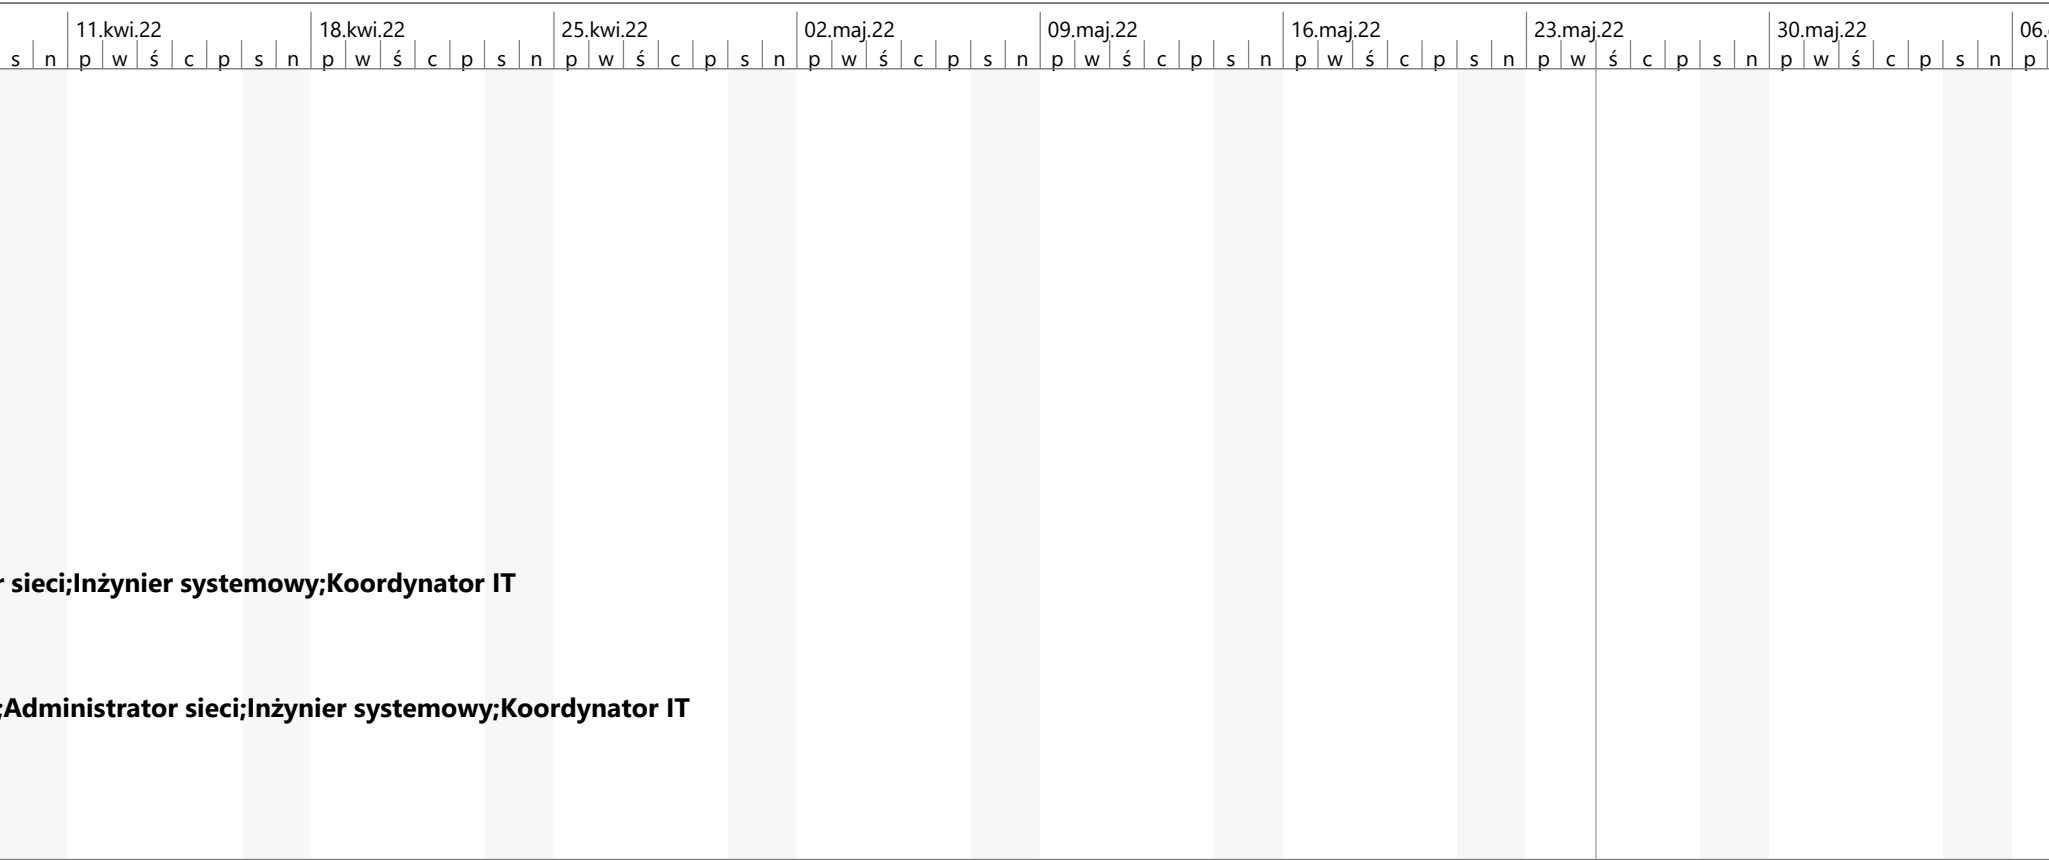



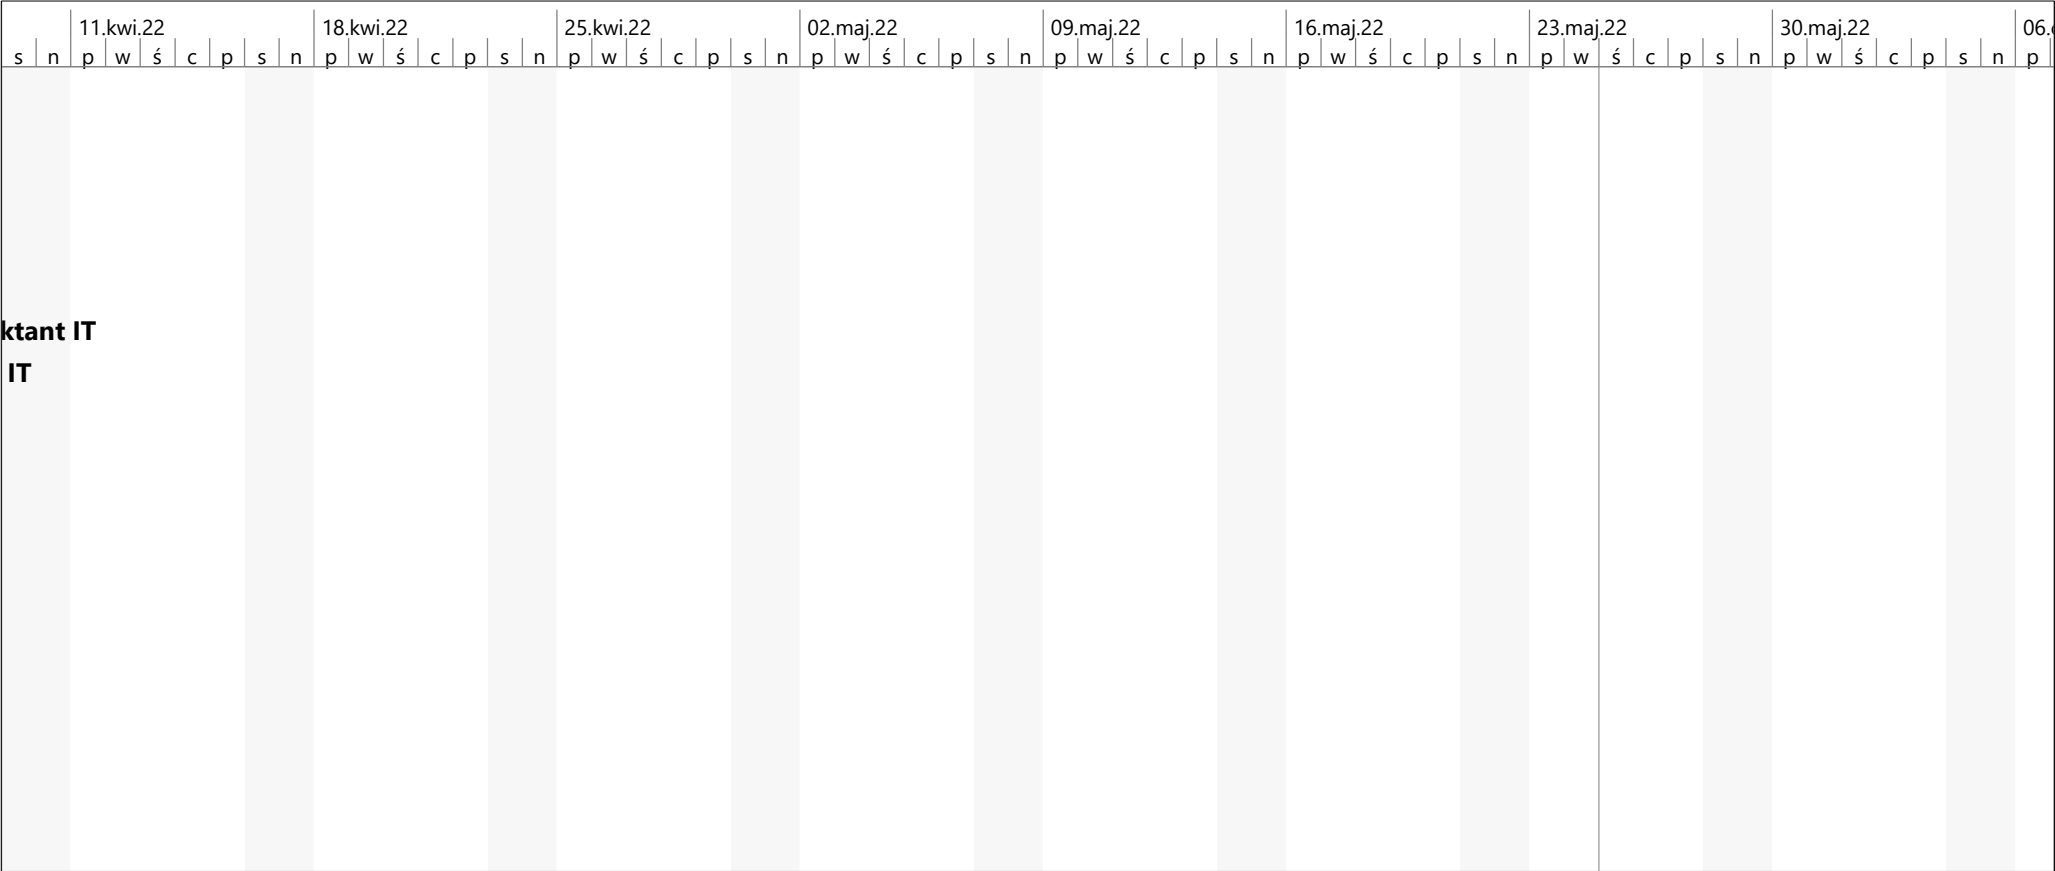












Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			



Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			




ktant IT  
IT

Projekt: Projekt1 Data: pią, 07.08.20	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

[illegible]



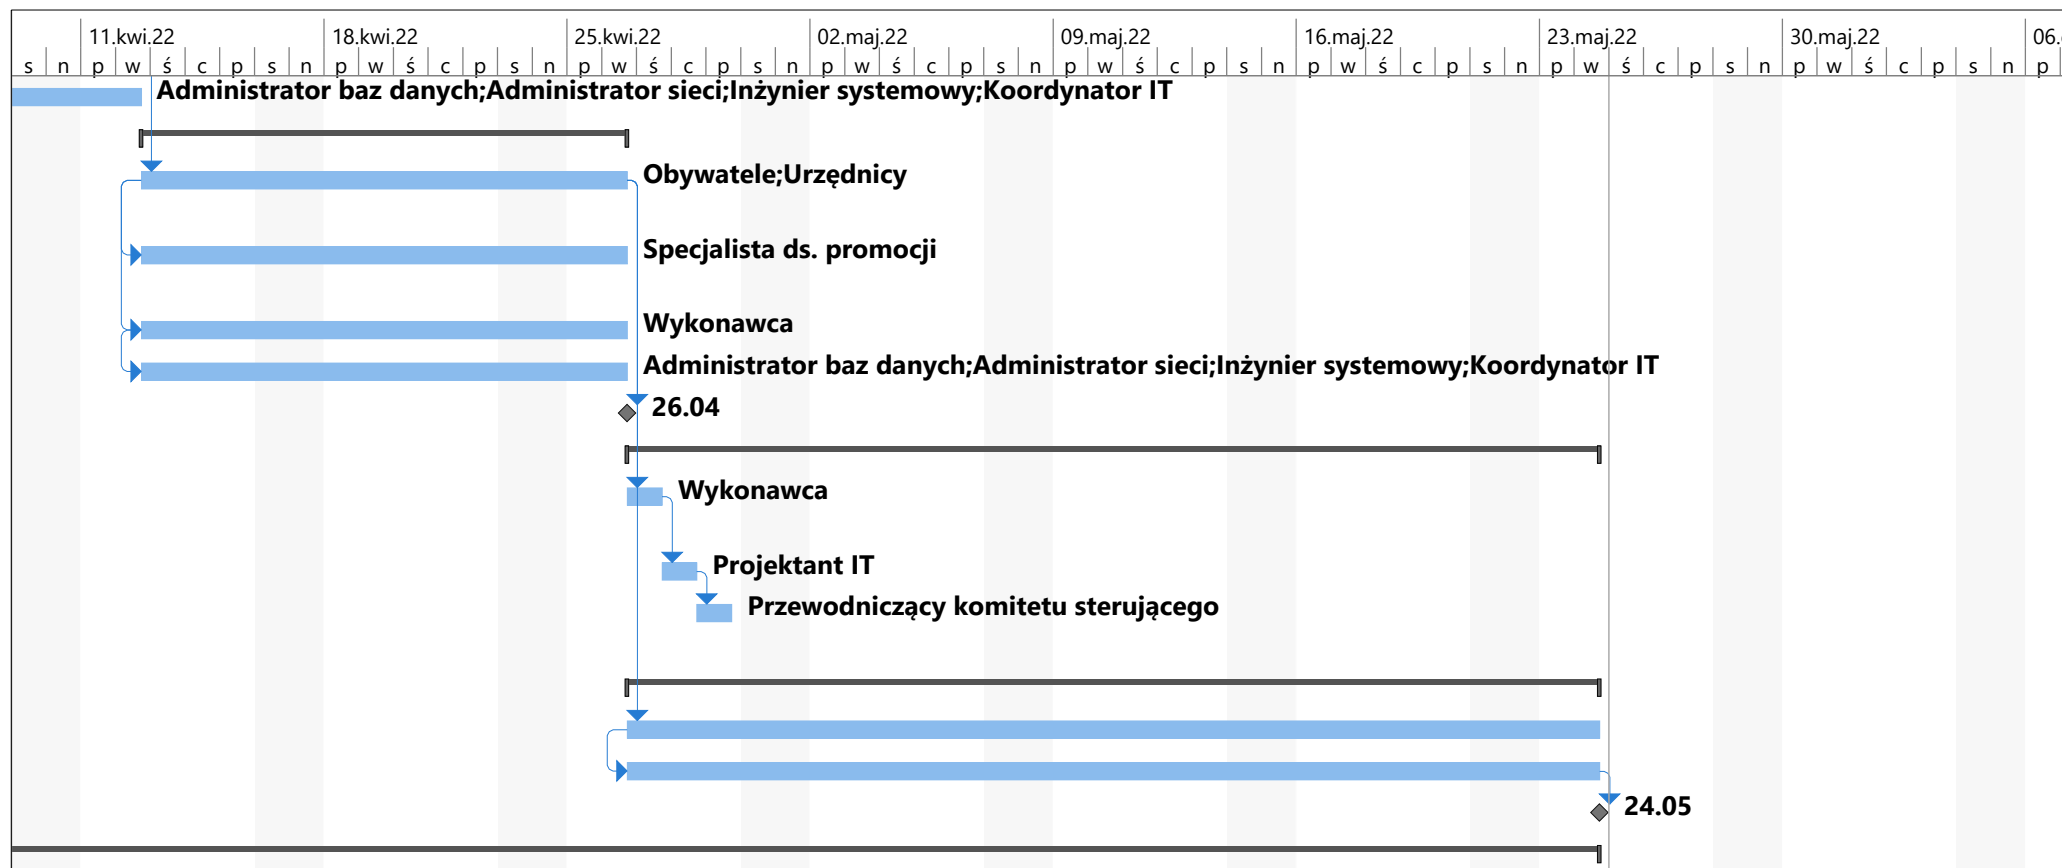

Projekt: Projekt1  
Data: pią, 07.08.20

Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

<div>Projekt: Projekt1</div> <div>Data: pią, 07.08.20</div>	Zadanie	<div></div>	Rzutowanie podsumowania ręcznego	<div></div>
	Podział	<div></div>	Podsumowanie ręczne	<div></div>
	Punkt kontrolny	<div></div>	Tylko z rozpoczęciem	<div></div>
	Podsumowanie	<div></div>	Tylko z zakończeniem	<div></div>
	Podsumowanie projektu	<div></div>	Zadania zewnętrzne	<div></div>
	Zadanie nieaktywne	<div></div>	Zewnętrzne punkty kontrolne	<div></div>
	Nieaktywny punkt kontrolny	<div></div>	Termin ostateczny	<div></div>
	Podsumowanie nieaktywne	<div></div>	Postęp	<div></div>
	Zadanie ręczne	<div></div>	Ręczne (postęp)	<div></div>
	Tylko z czasem trwania	<div></div>		
