Id.	Kalendarz zadania	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Poprzednik
0	**Brak**		**3A.2/3 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3**	**485 dn**	**wto, 07.09.21**	**pon, 07.08.23**	
1	Brak		<Nowy punkt kontrolny>	0 dn	wto, 07.09.21	wto, 07.09.21	
2	Kalendarz projektu M3		Podpisanie Umowy	0 dn	pią, 11.02.22	pią, 11.02.22	
3	Kalendarz projektu M3		Przekazanie terenu budowy	0 dn	pon, 01.08.22	pon, 01.08.22	2
4	Kalendarz projektu M3		**1. Koszty ogólne**	**257 dn**	**pon, 01.08.22**	**pon, 07.08.23**	
5	Kalendarz projektu M3		Koszty ogólne budowy	257 dn	pon, 01.08.22	pon, 07.08.23	3
6	Kalendarz projektu M3		**2. Przygotowanie terenu pod budowę**	**230 dn**	**czw, 01.09.22**	**pon, 31.07.23**	
7	Kalendarz projektu M3		Usunięcie drzew i krzewów, nasadzenia, ogrodzenia	82 dn	czw, 01.09.22	pon, 31.07.23	3
8	Kalendarz projektu M3		Roboty rozbiórkowe	145 dn	pon, 03.10.22	pon, 31.07.23	7RR+20 d
9	Kalendarz projektu M3		**3. Roboty budowlane**	**208 dn**	**pon, 03.10.22**	**pon, 31.07.23**	
10	Kalendarz projektu M3		Budowa korpusu Zapory Czołowej	124 dn	pon, 03.10.22	pią, 30.06.23	7RR+20 d
11	Kalendarz projektu M3		Pobór gruntu z Czaszy Zbiornika na rozbudowę Zapory	124 dn	pon, 03.10.22	pią, 30.06.23	7RR+20 d
12	Kalendarz projektu M3		Rekultywacja Czaszy Zbiornika	146 dn	pon, 03.10.22	pon, 31.07.23	7RR+20 d
13	Kalendarz projektu M3		Koryto w czaszy zbiornika	124 dn	pon, 03.10.22	pią, 30.06.23	7RR+20 d
14	Kalendarz projektu M3		Rowy opaskowe	124 dn	pon, 03.10.22	pią, 30.06.23	7RR+20 d
15	Kalendarz projektu M3		Schody skarpowe	84 dn	śro, 01.03.23	pią, 30.06.23	10RR+100
16	Kalendarz projektu M3		Urządzenia przelewowo - upustowe - konstrukcja	166 dn	pon, 03.10.22	śro, 31.05.23	10RR
17	Kalendarz projektu M3		Urządzenia przelewowo - upustowe - koryto dopływowe i odpływowe	166 dn	pon, 03.10.22	śro, 31.05.23	16RR
18	Kalendarz projektu M3		Urządzenia przelewowo - upustowe - kontenery, ogrodzenie	166 dn	pon, 03.10.22	śro, 31.05.23	10RR
19	Kalendarz projektu M3		Urządzenia przelewowo - upustowe - aparatura kontrolno-pomiarowa	166 dn	pon, 03.10.22	śro, 31.05.23	10RR
20	Kalendarz projektu M3		Przebudowa rowu R1 w km 2+955	21 dn	czw, 01.06.23	pią, 30.06.23	17
21	Kalendarz projektu M3		Przebudowa rowu R2 w km 3+118	21 dn	czw, 01.06.23	pią, 30.06.23	29RR+20
22	Kalendarz projektu M3		Przebudowa rowu R3 w km 3+249	105 dn	śro, 01.03.23	pon, 31.07.23	13RR
23	Kalendarz projektu M3		Rozbudowa rowu R4 w km 3+266	105 dn	śro, 01.03.23	pon, 31.07.23	13RR
24	Kalendarz projektu M3		Rozbudowa rowu R5 w km 3+367	105 dn	śro, 01.03.23	pon, 31.07.23	13RR;29R
25	Kalendarz projektu M3		Budowa rowu R6 w km 3+022	105 dn	śro, 01.03.23	pon, 31.07.23	17RR;29R
26	Kalendarz projektu M3		Budowa rowu R7	105 dn	śro, 01.03.23	pon, 31.07.23	25RR
27	Kalendarz projektu M3		**4. Roboty instalacyjne**	**105 dn**	**śro, 01.03.23**	**pon, 31.07.23**	
28	Kalendarz projektu M3		Projektowane linie elektroenergetyczne i teletechniczne	63 dn	wto, 02.05.23	pon, 31.07.23	10ZR-42 dn;13ZR-4
29	Kalendarz projektu M3		Projektowana kanalizacja deszczowa	105 dn	śro, 01.03.23	pon, 31.07.23	37RR+100
30	Kalendarz projektu M3		Przebudowa i budowa wylotów z rurociągów	63 dn	wto, 02.05.23	pon, 31.07.23	29ZR-64 d
31	Kalendarz projektu M3		**5. Zagospodarowanie terenu**	**208 dn**	**pon, 03.10.22**	**pon, 31.07.23**	
32	Kalendarz projektu M3		Drogi eksploatacyjne na koronie zapory oraz na nasypie zabezpieczającym osuwisko wraz z placami do zawracania	63 dn	wto, 02.05.23	pon, 31.07.23	10ZZ
33	Kalendarz projektu M3		Zjazd z drogi wewnętrznej na działce 141/2 i 126/9	63 dn	wto, 02.05.23	pon, 31.07.23	32ZZ;10ZZ
34	Kalendarz projektu M3		Połączenie rozbudowywanego zjazdu z drogą gminną nr 560819K	63 dn	wto, 02.05.23	pon, 31.07.23	24RR
35	Kalendarz projektu M3		Budowa przepustu P1 pod rozbudowywanym zjazdem	63 dn	wto, 02.05.23	pon, 31.07.23	34RR
36	Kalendarz projektu M3		Zjazdy do zbiornika	63 dn	wto, 02.05.23	pon, 31.07.23	12ZR-64 d
37	Kalendarz projektu M3		Stalowe ścianki szczelne przy parkingu osiedla	127 dn	pon, 03.10.22	czw, 15.06.23	7RR;8RR
38	Kalendarz projektu M3		Stalowe ścianki szczelne na prawym brzegu koryta	127 dn	pon, 03.10.22	czw, 15.06.23	7RR;8RR
39	Kalendarz projektu M3		Pomost oraz rampa	42 dn	czw, 01.06.23	pon, 31.07.23	37ZR-10 d
40	Kalendarz projektu M3		Termin zakończenia prac	0 dn	pon, 07.08.23	pon, 07.08.23	4ZZ;6ZZ;9

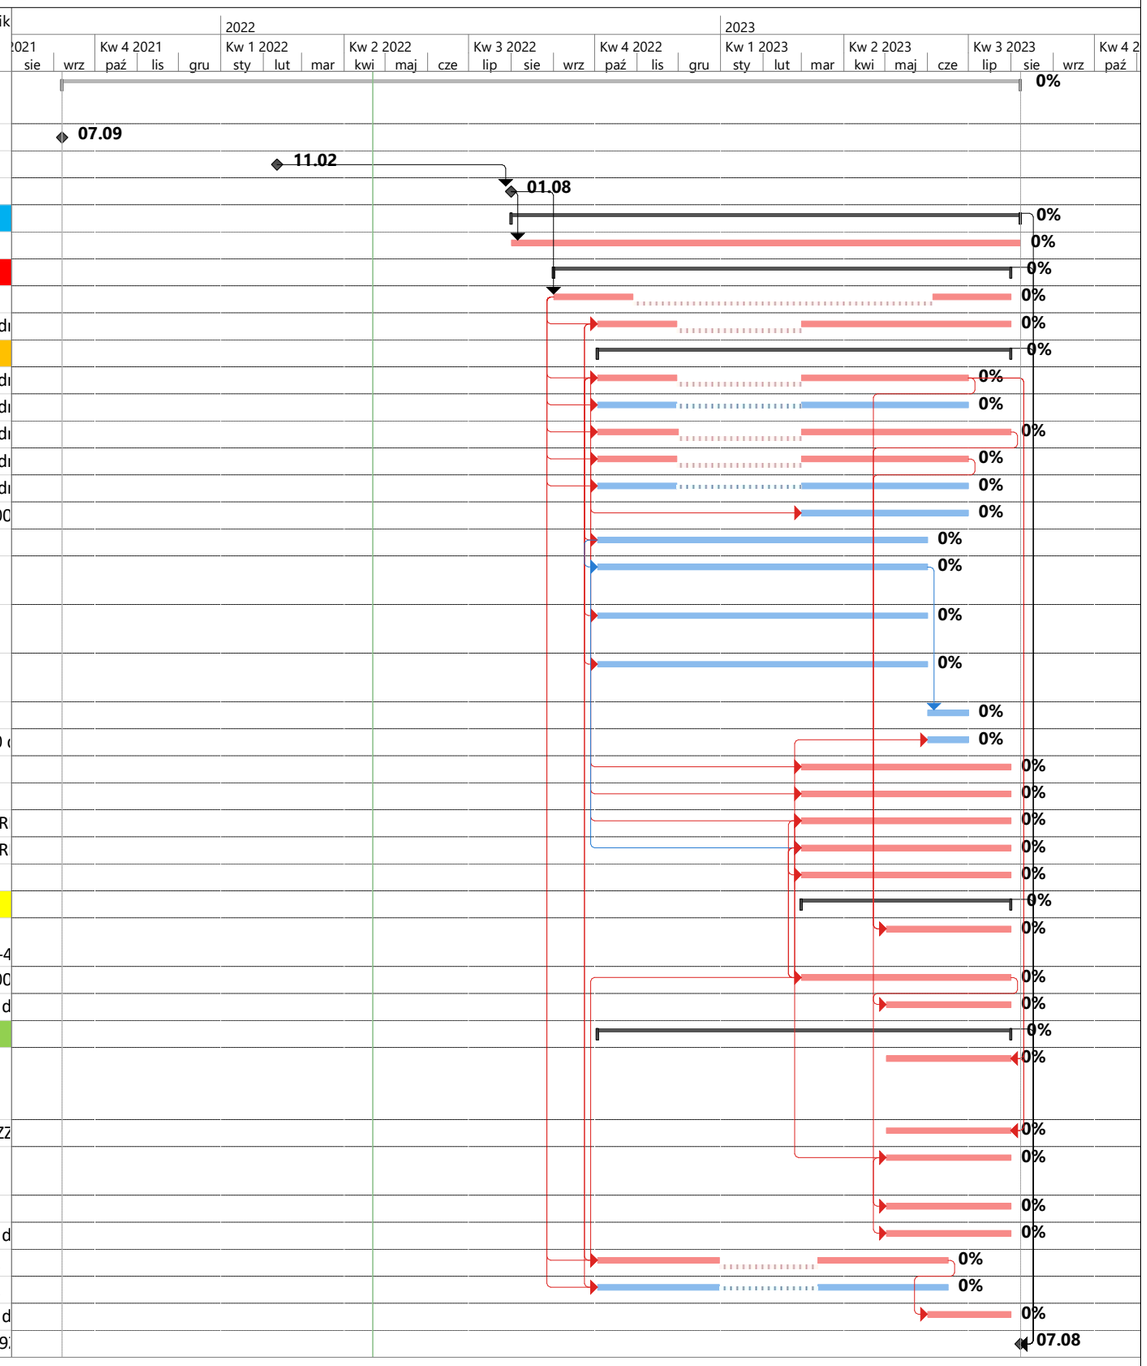

Punkt kontrolny według planu bazowego	Tylko z zakończeniem	Kamień milowy	Zadanie nieaktywne
Podsumowanie według planu bazowego	Tylko z czasem trwania	Postęp sumaryczny	Nieaktywny punkt kontrolny
Zadanie	Poprzednik sterujący w ścieżce — zadanie punktu kon	Podsumowanie	Podsumowanie nieaktywne
Podział	Krytyczne	Podsumowanie ręczne	Termin ostateczny
Postęp zadania	Podział krytyczny	Podsumowanie projektu	Plan bazowy
Zadanie ręczne	Następnik sterowany w ścieżce — zadanie punktu kont	Zadania zewnętrzne	
Tylko z rozpoczęciem	Podział według planu bazowego	Zewnętrzne punkty kontrolne	
